

栾川山水文苑室外灯光小品采购与安装合同  
结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件
1	栾川山水文苑室外灯光小品采购与安装合同结算审批表	1份1页	第1页	原件
2	资料存档目录	1份1页	第2页	原件
3	结算协议书	1份1页	第3页	原件
4	结算汇总表	1份1页	第4页	原件
5	结算明细表	1份5页	第5页	原件
6	结算申请单	1份1页	第6页	原件
7	结算通知书	1份1页	第7页	原件
8	授权委托书	1份1页	第8页	原件
9	结算资料核对确认单	1份1页	第9页	原件
10	竣工验收单	1份1页	第10页	复印件
11	财务往来对账单	1份1页	第11页	原件
12	栾川山水文苑室外灯光小品采购与安装合同审批表	1份10页	第12-21页	复印件
造价师： 		日期： 2024.11.11		

## 栾川山水文苑室外灯光小品采购与安装合同结算汇总表

合同编号: LCS1-YX-068


合同金额: 63000元

合同名称: 栾川山水文苑室外灯光小品采购与安装合同

甲方: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方: 洛阳宏润照明工程有限公司


序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算总造价	0	0	0	59460.00
1.1	合同价	0	0	0	63000.00
1.2	变更	0	0	0	
1.3	合同外增加	0	0	0	1500
1.4	扣款	0	0	0	5040.00
1.5	优惠取整				
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	……	0		0	0
2.2	……	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	59,460.00元		
		(大写)	伍万玖仟肆佰陆拾元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	59,460.00元		
		(大写)	伍万玖仟肆佰陆拾元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	59,460.00元		
		(大写)	伍万玖仟肆佰陆拾元整		

甲方代表: 






乙方代表: 

日期: 2021.11.11

日期: 2021.11.11



### 栾川山水文苑室外灯光小品采购与安装合同结算明细

栾川山水文苑室外灯光小品采购清单								备注	
序号	物品名称	品牌	材质	数量	单 价 (元)	总价(元)	示意图片	备注	
1	玫瑰花海	广东/星奇艺	花朵直径9CM, 高60cm。花材质: 绢布; 塑料杆; LED灯珠; 含稳压器。	4500	3.6	16200		采购, 覆盖面积150m², 每平方米建议插30支	验收合格
2	发光秋千	广东/星奇艺	秋千直径1.2-1.5米, PE材质; 铁艺支架(含充电设备)	2	3000	6000		采购, 防水, 满足正常成年人体重承受重量	验收合格
3	发光跷跷板	广东/星奇艺	长2.8mPE材质+铁艺	3	3500	10500		采购, 防水, 满足正常成年人体重承受重量	验收合格
4	踩踩跑	广东/星奇艺	单个直径50cm, 厚度6厘米	50	350	17500		采购, 防水, 含地台	验收合格
5	天使之翼	/	4.2m*2.2m	1	5200	5200		采购, 防水	验收合格
6	材料合计					55400			
7	电线	西安/正浩		3	580	1740			
8	LED电源	常州/正联		4	150	600			
9	辅料	浙江/德力西		1	1150	1150			
10	安装费			10	350	3500			
11	税金1%					623.9			
12	小计					63000			
13	工期延期	8天	按合同约定 每天扣除1%			5040			
14	花的颜色更换					1500		协商确定	增加稀料 喷涂白色 花改为粉
15	最终结算金额					59460			

甲方代表:



乙方代表:




日期:

2021.11.11

日期:

2021.11.11



# 结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《栾川山水文苑室外灯光小品采购与安装合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 ¥63000:00 元；合同执行过程中发生签证 / 份，增（减）造价为 / 元；合同执行过程中发生变更 / 份，增（减）造价为 / 元。

合同减造价合计为 / 元，申报合同结算造价为 63000:00 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2021 年 11 月 8 日），我司已收到贵公司支付的工程款共计：

0 元（大写：零元）。

（结算明细详见附件）



结算工作联系人：张国兵

手机号码：13803794632

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

## 结算通知书

洛阳宏润照明工程有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：LCS1-YX-068 的《栾川山水文苑室外灯光小品采购与安装合同》，目前贵司已完成开\_\_\_\_\_合同内容\_\_\_\_\_，我司同意贵司开始结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

### 一、结算申报程序：

- 1、要求贵公司在 2021 年 12 月 25 日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在 2021 年 12 月 28 日之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；
- 2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《结算申请报告》于 2021 年 12 月 25 日前提交我司工程部门签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
- 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

- 1、结算通知书 2、结算申请报告 3、验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明(未使用水电)7、合同复印件 8、合作方报送的结算资料

施工单位签收人签字：

营销总签发：

刘辉 11.8

项目总签发：

王磊 2021.11.8

# 授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人 张国兵 系 洛阳宏润照明工程有限公司 的法定代表人，现以本公司的名义办理 栾川山水文苑室外灯光小品采购与安装 工程的结算事宜。本人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

附：法定代表人身份证明（正反面）



公司：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）



### 结算资料核对确认单

项目名称	栾川山水文苑室外灯光小品采购与安装		核对时间	2021.11.8
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	营销物料/活动验收单	2份2页	原件	
2	授权委托书	1份1页	原件	
3	往来账目明细	1份1页	原件	
4	合同复印件	1份17页	原件	
5	结算申请报告	1份1页	原件	
6	结算通知书	1份1页	复印件	
	.....			
相关部门签字栏	合作单位： (签字盖章)	项目营销策划部： (签字盖章)	成本部门： (签字盖章)	
				

注：

- 1、本确认单在合作方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目营销策划部和合作单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

营销物料/活动验收单

2021年 月 日

合同名称	LCS1-YX-068 栾川山水文苑室外灯光小品采购与安装合同		
单位名称	洛阳宏润照明工程有限公司		
开始日期	2021年7月16日	结束日期	2021年8月7日

合同项：

- 1、玫瑰花花海：广东/星奇艺 花朵直径9CM，高60cm。花材质：绢布；塑料杆；LED灯珠；含稳压器。4500支
- 2、发光秋千：广东/星奇艺 秋千直径1.2-1.5米，PE材质；铁艺支架（含充电设备）2套
- 3、发光跷跷板：广东/星奇艺 长2.8mPE材质+铁艺3套
- 4、踩踩跑：广东/星奇艺 单个直径50cm，厚度6厘米 50套 含地台
- 5、天使之翼：4.2m\*2.2m 亚克力材质+铁艺架子+帕灯1套

新增项：

玫瑰花 2250支 改颜色


扣项：

实际施工安装时间：2021年7月16日—2021年8月7日，共计23天

合同第五条：【**交货及安装、验收**】乙方在本合同签订后15个日历天内完成产品安装调试工作。乙方负责安装施工现场的安全管理工作，乙方应加强对施工过程和施工人员的安全管理，出现安全事故乙方承担全部责任。

第十条：【若乙方未能按本合同约定工期完工，视为乙方违约，每逾期一天，按本合同暂定总价款的1%向甲方支付违约金。

甲方有权直接在甲方应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可以继续向乙方追偿】

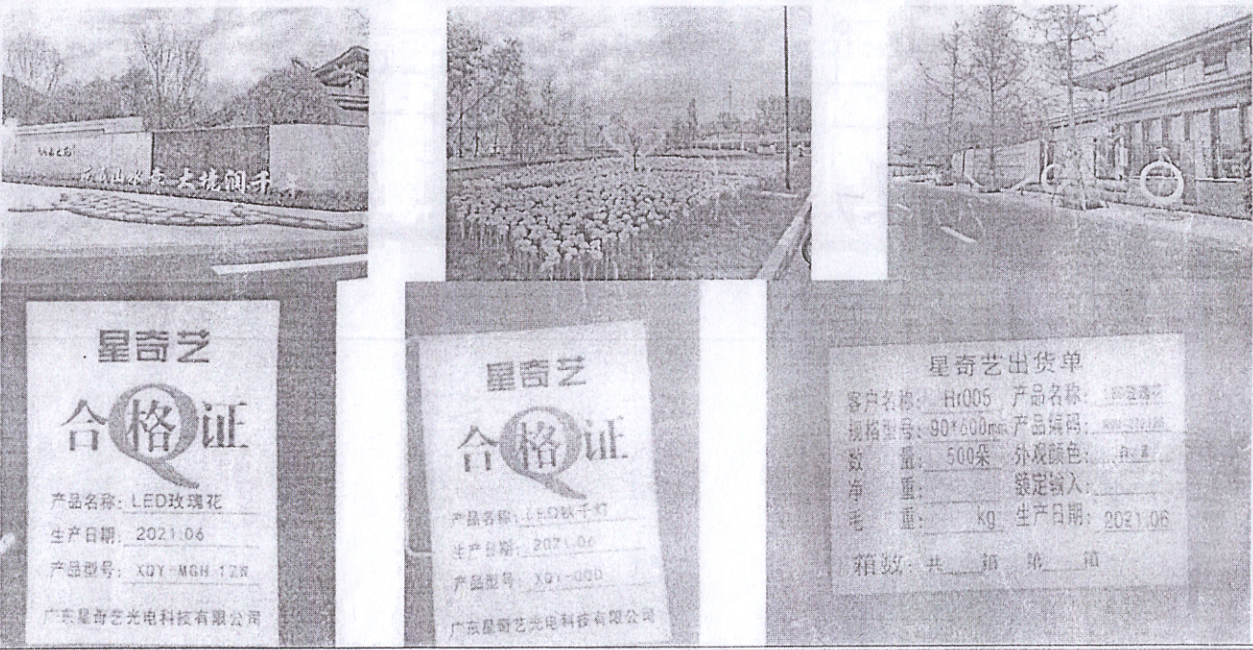

## 往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑室外灯光小品采购与安装工程  
 合同编号：LCSI—YX—068

日期	请款金额 (元)	财务实付款 金额 (元)	实际已开发票 金额 (元)	开票税率	备注
2021年11月8日		0	63000	1%	
小计					

甲方财务：  
未收到此发票

王吉鹏 2021.11.22  
 已在账销

乙方财务：  
  
 (单位盖章)
