

## 山水文苑项目变压器增容工程施工合同结算汇总表

合同编号：SSWY.01-QQ-046

合同金额：255000元

合同名称：山水文苑项目变压器增容工程施工合同

甲方：洛阳莘子园置业有限公司

乙方：河南凯华电力工程有限公司洛阳分公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算总造价	0	0	0	255000.00
1.1	合同价	0	0	0	255000.00
1.2	未施工项扣减	0	0	0	0.00
1.3	签证	0	0	0	0.00
1.4	设计变更	0	0	0	0.00
1.5	协商优惠金额				0.00
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	.....	0		0	0
2.2	.....	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	255,000.00元		
		(大写)	贰拾伍万伍仟元整		
四	应扣甲供材合计	0元			
4.1	甲供材料一	0元			
4.2	甲供材料二	0元			
五	应扣水电费合计	0元			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	255,000.00元		
		(大写)	贰拾伍万伍仟元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	255,000.00元		
		(大写)	贰拾伍万伍仟元整		

甲方代表：



乙方代表：



日期：

2021.12.27

日期：

2021.12.27

# 宜阳山水文苑项目变压器增容工程施工合同

## 结算通知书

河南凯华电力工程有限公司洛阳分公司:

我公司与贵公司签订的《宜阳山水文苑项目变压器增容工程施工合同》工程施工合同, 合同编号 SSWY.01-QQ-046。目前该工程已且具备结算条件, 现通知贵公司开始结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行, 现将结算的相关程序和时间要求作以下说明:

### 一、结算申报程序:

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认, 需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认;

2、要求贵公司在 2021 年 11 月 10 日之前派相关人员与我公司成本部门 赵京阁 接洽结算资料的核对工作, 完成之后在《结算资料核对确认表》上签字确认;

3、结算资料核对完成之后, 请贵公司尽快编制结算, 以 A4 纸打印、装订成册, 完成后将完整的结算资料、签字确认的《结算资料核对确认表》和填写完整并经签字确认的《结算申请报告》于 2021 年 11 月 10 日提交我公司成本部门的赵京阁签收。

4、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

5、双方核对结算时, 若发现因合作方上报结算资料出现违背合同约定的, 必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算, 不接受资料调整。

6、双方核对结算时, 若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况, 贵司承诺不要求增补资料, 视为优惠。


附:《结算资料清单》

- 1、结算通知书 2、结算申请报告 3、授权委托书 4、往来账明细 5、合同复印件 6、合作方报送的结算资料

合作方签收人签字:

张子昊

宜阳山水文苑项目部:


 静奇真  
 年 月 日  
 李仲厚

# 结算申请报告

洛阳莘子园置业有限公司：

兹有我司与贵司签订的《山水文苑项目变压器增容工程施工合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 255,000.00 元；合同执行过程中发生签证 0 份，增（减）造价为 0 元；合同执行过程中发生变更 0 份，增（减）造价为 0 元。申报合同结算造价为 255,000.00 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前(2021 年      月      日)，我司已收到贵司支付的工程款共计 178,500.00 元（大写：壹拾柒万捌仟伍佰元整）。

（结算明细见附件）



公司（盖章）

年 月 日

结算工作联系人：

手机号码：

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。


### 授权委托书

致：洛阳莘子园置业有限公司


本人刘金斌系河南凯华电力工程有限公司洛阳分公司的法定代表人，现委托张江昊为我方代理人，并以本公司的名义办理山水文苑项目变压器增容工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）

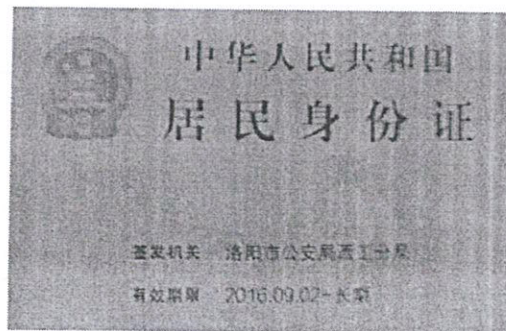

附：委托人身份证明（正反面）



公司：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）刘金斌

委托代理人：（签字）张江昊

### 工程往来账目明细

合同名称：山水文苑项目变压器增容工程施工合同

合同编号：SSWW.01-QQ-046

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2021.1	178500	178500	178500	9%	
2021.10	63750	0	76500	9%	
小计		0	0	0	

甲方财务： *杜均*

乙方财务：


(单位盖章)



# 证 明


河南凯华电力工程有限公司洛阳分公司承建山水文苑变压器增容项目，由于工期较短我公司在施工中用电是自备的发电机，因用水量很小，使用离施工场地较劲的降水井中的水，故施工中的用水用电与总包方没有任何牵连，特此证明。

张磊  
工程部部长  
2021.12.3



河南凯华电力工程有限公司洛阳分公司

2021年12月3日



# 单项工程验收单 (分包)

年 月 日

合同名称 山水文苑项目变压器增容工程施工合同

施工单位 河南凯华电力工程有限公司洛阳分公司

建设单位 洛阳莘子园置业有限公司

工程开工日期 2020年11月12日 工程竣工日期 2020年12月21日

工程内容: 1、YJLV22 10KV3\*95 电缆穿 DE110 波纹管敷设, 线路敷设。20 公分厚混凝土约需破除 5 米, 穿套钢管 SC100 过路。2、S13-630KVA 箱式变压器设备采购及安装, 包含高压进线柜、高压计量 CT 柜、变压器室、低压进线柜、低压出线柜 630A 两路 和 400A 四路、壳体等。3、变压器基础, 变压器护栏。

验收结论:

合同内容已完成, 检验合格, 已通电。

工程评价结果: 在评价结果后打 √

1 工期: A: 超计划天数 B: 未超计划

2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合

质量: A: 优良 B: 合格  C: 不合格

3 安全: A: 未出事故  B: 出现轻微事故 C: 出现中、特重大事故

4 现场: A: 整洁、无浪费  B: 一般 C: 差

施工单位验收人员签字或盖章

*刘金列*

监理单位验收人员签字或盖章

建设单位参建各方验收人员签字或盖章

工程部

设计部

成本部

*范云平*

*林有均*

*张辉*

2021.10.26

2021.10.26

验收单位



### 客户受电工程竣工检验意见单

户号		申请编号	
户名	洛阳莱子园置业有限公司		
用电地址	洛阳宜阳县香鹿镇香庄村		
联系人	白保民	联系电话	15290501186

(档案标识二维码)

资料检验	检验结果
------	------

现场检验意见 (可附页):

现场检验合格具备送电条件



检验人

刘朝峰. 刘鑫. 赵振楚

检验日期

2020年12月21日

客户签收:

年 月 日

### 工程结算资料核对确认表

项目名称	山水文苑项目变压器增容工程施工合同		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1份共1页	原件	
2	结算申请报告	1份共1页	原件	
3	授权委托书	1份共1页	原件	
4	工程往来账目明细	1份共1页	原件	
5	水电费结算证明	1份共1页	原件	
6	工程验收单	1份共1页	原件	
7	山水文苑项目变压器增容工程施工合同 (含合同审批表)	1份共21页	复印件	
相关部门签字栏	施工单位：  (签字盖章) 	项目工程部：  (签字盖章) 	成本部门：  (签字盖章)   2021.12.1	

注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。
