

宜阳山水文苑零星工程合同2022年1-4月结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	宜阳山水文苑年度零星工程合同结算审批表	1份1页	第1页	原件	
2	资料存档目录	1份3页	第2-1至2-3页	原件	
3	结算价汇总表	1份1页	第3页	签字版	
4	结算价明细汇总表	1份3页	第4-6页	签字版	
5	2022年1-4月份扣款明细汇总表	1份1页	第7页	原件	
6	宜阳山水文苑工作联系单（编号：340）	1份1页	第8页	复印件	主送单位：中国建筑第七工程局有限公司
7	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单（编号：SSWY017）	1份1页	第9页	复印件	
8	宜阳山水文苑一期交房派发零星工程验收确定单（编号：SSWY017）	1份1页	第10页	复印件	
9	工程量确认单	1份1页	第11页	复印件	
10	现场工程照片	1份1页	第12页	复印件	
11	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单（编号：SSWY018）	1份1页	第13页	复印件	
12	宜阳山水文苑一期交房派发零星工程验收确定单（编号：SSWY018）	1份1页	第14页	复印件	
13	现场勘查记录	1份1页	第15页	复印件	
14	现场工程照片	1份1页	第16页	复印件	
15	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单（编号：SSWY019）	1份1页	第17页	复印件	
16	宜阳山水文苑一期交房派发零星工程验收确定单（编号：SSWY019）	1份1页	第18页	复印件	
17	现场勘查记录	1份1页	第19页	复印件	
18	现场工程照片	1份1页	第20页	复印件	
19	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单（编号：SSWY020）	1份1页	第21页	复印件	
20	宜阳山水文苑一期交房派发零星工程验收确定单（编号：SSWY020）	1份1页	第22页	复印件	
21	现场勘查记录	1份1页	第23页	复印件	

宜阳山水文苑零星工程合同2022年1-4月结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
22	供应商约谈记录	1份1页	第24页	复印件	
23	现场工程照片	1份1页	第25页	复印件	
24	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单（编号：SSWY021）	1份1页	第26页	复印件	
25	宜阳山水文苑一期交房派发零星工程验收确定单（编号：SSWY021）	1份1页	第27页	复印件	
26	供应商约谈记录	1份1页	第28页	复印件	
27	现场工程照片	1份1页	第29页	复印件	
28	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单（编号：SSWY022）	1份1页	第30页	复印件	
29	宜阳山水文苑一期交房派发零星工程验收确定单（编号：SSWY022）	1份1页	第31页	复印件	
30	工程量确认单	1份1页	第32页	复印件	
31	供应商约谈记录	1份1页	第33页	复印件	
32	现场工程照片	1份4页	第34-36页	复印件	
33	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单（编号：SSWY023）	1份1页	第37页	复印件	
34	宜阳山水文苑一期交房派发零星工程验收确定单（编号：SSWY023）	1份1页	第38页	复印件	
35	供应商约谈记录	1份1页	第39页	复印件	
36	现场工程照片	1份1页	第40页	复印件	
37	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单（编号：SSWY024）	1份1页	第41页	复印件	
38	宜阳山水文苑一期交房派发零星工程验收确定单（编号：SSWY024）	1份1页	第42页	复印件	
39	现场勘查记录	1份1页	第43页	复印件	
40	现场工程照片	1份2页	第44-45页	复印件	

宜阳山水文苑零星工程合同2022年1-4月结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
41	宜阳山水文苑工作联系单（编号：358）	1份2页	第46-47页	复印件	主送单位：中国建筑第七工程局有限公司
42	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单（编号：SSWY026）	1份1页	第48页	复印件	
43	宜阳山水文苑一期交房派发零星工程验收确定单（编号：SSWY026）	1份1页	第49页	复印件	
44	现场勘查记录	1份3页	第50-52页	复印件	
45	现场工程照片	1份3页	第53-55页	复印件	
46	宜阳山水文苑工作联系单（编号：363）	1份1页	第56页	复印件	主送单位：由中国建筑第七工程局有限公司、上海文宇建设集团有限公司、郑州诺金装饰工程有限公司、河南玖恒建设工程有限公司、恒言园林工程有限公司洛阳分公司、虏克电梯有限公司、洛阳坤宏建设集团有限公司
47	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单（编号：SSWY027）	1份1页	第57页	复印件	
48	宜阳山水文苑一期交房派发零星工程验收确定单（编号：SSWY027）	1份1页	第58页	复印件	
49	供应商约谈记录	1份1页	第59页	复印件	
50	人工机械使用统计表	1份3页	第60-62页	复印件	
51	现场工程照片（人工照片）	1份10页	第63-72页	复印件	
52	第三方施工人员签到表	1份34页	第73-106页	复印件	
53	现场工程照片（机械照片）	1份39页	第107-145页	复印件	
54	施工单位报送清单价格	1份2页	第146-147页	复印件	
造价师：		日期：			

宜阳山水文苑零星工程合同2022年1-4月结算汇总表

合同编号：SSWY.01-JA-086 合同金额： 95万元（暂定）

合同名称：宜阳山水文苑年度零星工程合同

甲 方：洛阳莘子园置业有限公司

乙 方：河南腾翔建筑工程有限公司

序号	项目名称	土建（元）	安装（元）	合计（元）	总计（元）
一	结算总造价	0	0	0	352816.76
1.1	图纸内结算值（合同内）	0	0		
1.2	变更	0	0	0	
1.3	派发单	0	0		352816.76
1.4	罚款单	0	0	0	
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	……	0		0	0
2.2	……	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	352,816.76元		
		(大写)	叁拾伍万贰仟捌佰壹拾陆元柒角陆分		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	352,816.76元		
		(大写)	叁拾伍万贰仟捌佰壹拾陆元柒角陆分		
七	工程最终发票金额	(小写)	352,816.76元		
		(大写)	叁拾伍万贰仟捌佰壹拾陆元柒角陆分		

甲方代表：洛阳莘子园置业有限公司 同峰收

乙方代表：张磊

日期：2022.4.29

日期：2022.4.29

注：此汇总表以总包结算为例，其它结算根据实际情况参照填写；结算总造价：表示施工总产值，包括甲供、水电费、税金等。

宜阳山水文苑零星工程2022年1-4月结算工程明细汇总表

序号	项目名称	内容、部位	规格	单位	工程量	单价	金额(元)	备注
1	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号:SSWY017)	水暖井混凝土地坪开孔	120mm厚砼墙、板开孔φ110	个	10.00	51.58	515.76	按合同约定价双方协商,详见工程任务派发单第 页,费用由中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008合同扣除100%承担
2	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号:SSWY018)	东大门新建围挡	新建围挡2m高	m	35.00	171.90	6016.50	按合同约定价,详见工程任务派发单第 页,费用由公司承担
3	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号:SSWY019)	东大门围挡铺设草皮	铺设草皮	m ²	404.28	13.00	5255.58	按认质认价,详见工程任务派发单第 页,费用由公司承担
4	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号:SSWY020)	南大门部分草皮更换	铺设草皮	m ²	71.30	13.00	926.90	按认质认价,详见工程任务派发单第 页,费用由公司承担
5	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号:SSWY021)	6#9#10#13#主楼电井母线楼地板预留洞扩大	主楼电井母线楼地板预留洞扩大	个	140.00	127.00	17780.00	按合同约定价双方协商,详见工程任务派发单第 页,费用由公司承担
6	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号:SSWY022)	地库排烟机房C20素混凝土基础	C20素混凝土基础	m ³	13.20	1150.00	15180.00	按认质认价,详见工程任务派发单第 页,费用由公司承担
7	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号:SSWY023)	滨河北路龙卡板+户外画面,覆膜	龙卡板+户外画面,覆膜	m ²	30.96	45.00	1393.20	按认质认价,详见工程任务派发单第 页,费用由公司承担
8	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号:SSWY024)	南大门旧围挡拆除,新建围挡	拆除围挡	m	31.00	19.50	604.50	按合同约定价,详见工程任务派发单第 页,费用由公司承担
			新建围挡2m高	m	27.50	179.10	4925.25	
			铺设草皮	m ²	55.00	13.00	715.00	按认质认价,详见工程任务派发单第 页,费用由公司承担
9	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号:SSWY026)	混凝土地坪破除	100厚地坪破除	m ²	371.55	68.80	25562.64	按合同约定价双方协商,详见工程任务派发单第 页,费用由中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008合同扣除100%承担
			200厚地坪破除	m ²	1389.87	137.60	191246.11	按合同约定价,详见工程任务派发单第 页,费用由中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008合同扣除100%承担
			300厚地坪破除	m ²	17.05	206.40	3519.12	按合同约定价双方协商,详见工程任务派发单第 页,费用由中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008合同扣除100%承担

宜阳山水文苑零星工程2022年1-4月结算工程明细汇总表

序号	项目名称	内容、部位	规格	单位	工程量	单价	金额（元）	备注
10	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号:SSWY027)	垃圾清运	人工清理垃圾	工日	162	100.00	16200.00	按合同约定价，详见工程任务派发单第 页，费用由中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008合同扣除45%承担、上海文字建设集团有限公司SSWY.01-JA-076合同扣除10%承担、郑州诺金装饰工程有限公司SSWY.01-JA-075合同扣除8%承担、河南玖恒建设工程有限公司SSWY.01-JA-065合同扣除23%承担、恒言园林工程有限公司洛阳分公司SSWY.01-JP-089合同扣除2%承担、虎克电梯有限公司SSWY.01-JA-044合同扣除1%承担、洛阳坤宏建设集团有限公司SSWY.01-JA-077合同扣除11%承担
			60钩机	台班	4.00	986.55	3946.20	
			240钩机	台班	6.00	2500.00	15000.00	
			垃圾外运10m3车	车	133.00	330.00	43890.00	
			洒水车	车	1.00	140.00	140.00	

宜阳山水文苑零星工程2022年1-4月结算工程明细汇总表

序号	项目名称	内容、部位	规格	单位	工程量	单价	金额（元）	备注
11	2022年1-4月份扣款合计（元）						300019.83	
12	2022年1-4月份地产承担合计（元）						52796.93	
13	2022年1-4月份合计（元）						352816.76	

单位名称： 洛阳李国置业有限公司

单位名称： 河南腾翔建筑工程有限公司

甲方代表： 同祥临

乙方代表： 张亮

签字日期： 2022.4.29

签字日期： 2022.4.29

2022年1-4月份扣款明细汇总表

序号	单位名称	合计金额 (元)	扣款相关工作 联系单	扣款相关派发单	扣款内容概述	备注
1	中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008合同扣除100%	515.76	工作联系单 (编号: 340)	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号: SSWY017)	水暖井混凝土地坪开孔	SSWY.01-JA-008
2	中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008合同扣除100%承担	220327.87	工作联系单 (编号: 358)	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号: SSWY026)	混凝土地坪破除	SSWY.01-JA-008
3	中国建筑第七工程局有限公司SSWY.01-JA-008合同扣除45%承担	35629.29	工作联系单 (编号: 363)	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号: SSWY027)	现场清理垃圾	SSWY.01-JA-008
4	上海文宇建设集团有限公司SSWY.01-JA-076合同扣除10%承担	7917.62	工作联系单 (编号: 363)	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号: SSWY027)	现场清理垃圾	SSWY.01-JA-076
5	郑州诺金装饰工程有限公司SSWY.01-JA-075合同扣除8%承担	6334.10	工作联系单 (编号: 363)	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号: SSWY027)	现场清理垃圾	SSWY.01-JA-075
6	河南玖恒建设工程有限公司SSWY.01-JA-065合同扣除23%承担	18210.53	工作联系单 (编号: 363)	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号: SSWY027)	现场清理垃圾	SSWY.01-JA-065
7	恒言园林工程有限公司洛阳分公司SSWY.01-JP-089合同扣除2%承担	1583.52	工作联系单 (编号: 363)	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号: SSWY027)	现场清理垃圾	SSWY.01-JP-089
8	虎克电梯有限公司SSWY.01-JA-044合同扣除1%承担	791.76	工作联系单 (编号: 363)	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号: SSWY027)	现场清理垃圾	SSWY.01-JA-044
9	洛阳坤宏建设集团有限公司SSWY.01-JA-077合同扣除11%承担	8709.38	工作联系单 (编号: 363)	宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单(编号: SSWY027)	现场清理垃圾	SSWY.01-JA-077
10	2022年1-4月份扣款合计(元)			300019.83		

工作联系单

项目名称	中浩德·山水文苑	联系单编号	340
合同名称	中浩德山水文苑总承包合同	合同编号	SSWY.01-JA-008
主送单位	中国建筑第七工程局有限公司		
抄送单位	建基工程咨询有限公司		
事由	关于山水文苑高层水暖井预留洞事宜		

内容：

由你单位承建的山水文苑项目，高层水暖井预留洞不通，造成管道无法安装，现要求你司将此类问题处理完成，12月18日如未完成，我方将安排第三方剔凿，费用扣除！

下无正文



转扣第三方

责任工程师：（签字）

工程经理：（签字）



日期：2021年12月15日

宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单 编号 (SSWY017)

施工任务位置: 10#楼水暖井

派发部门: 河南腾翔建筑工程有限公司

派发时间: 2022. 1. 10

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可
多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同: 中浩德山水文苑总承包合同


派发任务原因: 现场水暖井内预留洞不通, 导致下道工序无法施工。

派发任务描述:


将水暖井内影响施工的混凝土地坪开孔, 直径不小于 110mm, 垃圾清理。

派发任务工期要求: 3 天

派发相关部门(签字):



工程部负责人(签字):



注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料(任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入(技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

宜阳山水文苑 期交房派发零星工程验收确认单 编号 (SSWY017)

派发时间: 2022. 1. 10

完工时间: 2022. 1. 14

派发部门: 工程部

施工任务位置: 主楼

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况: 山水文苑 10#楼西单元已按施工要求完成 10 个上水管混凝土开孔。

相关验收人 (签字):

监理: 刘万进

张亮 范云祥

工程部负责人 (签字):

李伟

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

工程验收单


山水文苑 10#楼西单元已按施工要求完成10个
上水管混凝土开孔. 尺寸符合要求.

开孔尺寸 120 ~ 140 mm. 共 10 个.

王三/许

2022.4.29

十号楼西单元开孔



宜阳山水文苑 期交房派发零星工程验收确认单 编号 (SSWY018)

派发时间: 2022. 1. 15

完工时间: 2022. 1. 18

派发部门: 工程部

施工任务位置: 东大门围挡

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况: 小区东边围挡缺口, 已按要求完成新建围挡施工。

新建围挡: 长度 35 米, 高度 2 米。具体尺寸详见附件。

相关验收人 (签字):

张亮 刘万进 李作丹

工程部负责人 (签字):

李作丹

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

仅草皮

7.5m X 2.9m高

①

仅铺设

草皮 已算(围指) 高2.9m
4m

③

东大门

25.5 X 2.2高

高2.9m
5.5m
已算(围指)

仅草皮 2.75高
37.5m X 2.75高
②

新建
围指

高2m
4m

25.5 X 2m高

高2m
5.5m
16.7

草皮①+②+③合计

河南腾翔建筑工程有限公司 张磊

监理: 刘建

工程: 韩XX

日期: 同报临 2022.3.2

东大门围挡缺口新建



宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单 编号 (SSWY019)

施工任务位置: 东大门

派发部门: 河南腾翔建筑工程有限公司

派发时间: 2022. 1. 20

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可
多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同: /

派发任务原因: 东大门围挡需要全部加设草皮

派发任务描述:

新建围挡上安装草皮, 材料要求同南侧围墙。

派发任务工期要求: 3天

派发相关部门(签字):

工程部负责人(签字):

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料(任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入(技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

宜阳山水文苑 期交房派发零星工程验收确认单 编号 (SSWY019)

派发时间: 2022.1.20

完工时间: 2022.1.23

派发部门: 工程部

施工任务位置: 东边围挡

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况: 小区东边围挡草皮铺设已经按要求完成施工。

草皮铺设: 草皮高度 2.9 米, 共计 $(75+4+5.5) = 84.5$ 米;

草皮高度 2.2 米, 共计 25.5 米;

草皮高度 2.75 米, 共计 37.5 米。

总长度 147.5 米。具体尺寸详见附件。

相关验收人 (签字):

刘进 张亮 韩伟

工程部负责人 (签字):

李伟

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

仅草皮

75m X 2.9m高

①

仅草皮 2.75m高
37.5m X 2.75m高

东大门

仅铺设

草皮 已算(围档) 高2.9m
4m

③

高2.9m 已算(围档)
5.5m

25.5 X 2.2高

新建
围档

高2m
4m

25.5 X 2m高

高2m
5.5m

草皮+围档合计

河南腾翔建筑工程有限公司 张亮

监理: 刘建

工程: 张亮

日期: 同辉临 2022.3.2

东边围挡草皮搭设



宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单 编号 (SSWY020)

施工任务位置: 南大门

派发部门: 河南腾翔建筑工程有限公司

派发时间: 2022. 3. 1

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可
多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同: /

派发任务原因: 南大门部份草皮需更换

派发任务描述:

新建草皮, 材料要求同其它。

派发任务工期要求: 2天

派发相关部门(签字):

工程部负责人(签字):

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料(任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入(技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

宜阳山水文苑 期交房派发零星工程验收确认单 编号 (SSWY020)

派发时间: 2022. 3. 1

完工时间: 2022. 3. 3

派发部门: 工程部

施工任务位置: 南大门围挡换新

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况: 南大门旧草皮换新已按要求完成施工。

新草皮: 长度 31 米, 高度 2.2 米。详情见附图。

相关验收人 (签字):

张元 刘万进



工程部负责人 (签字):




注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

南大门

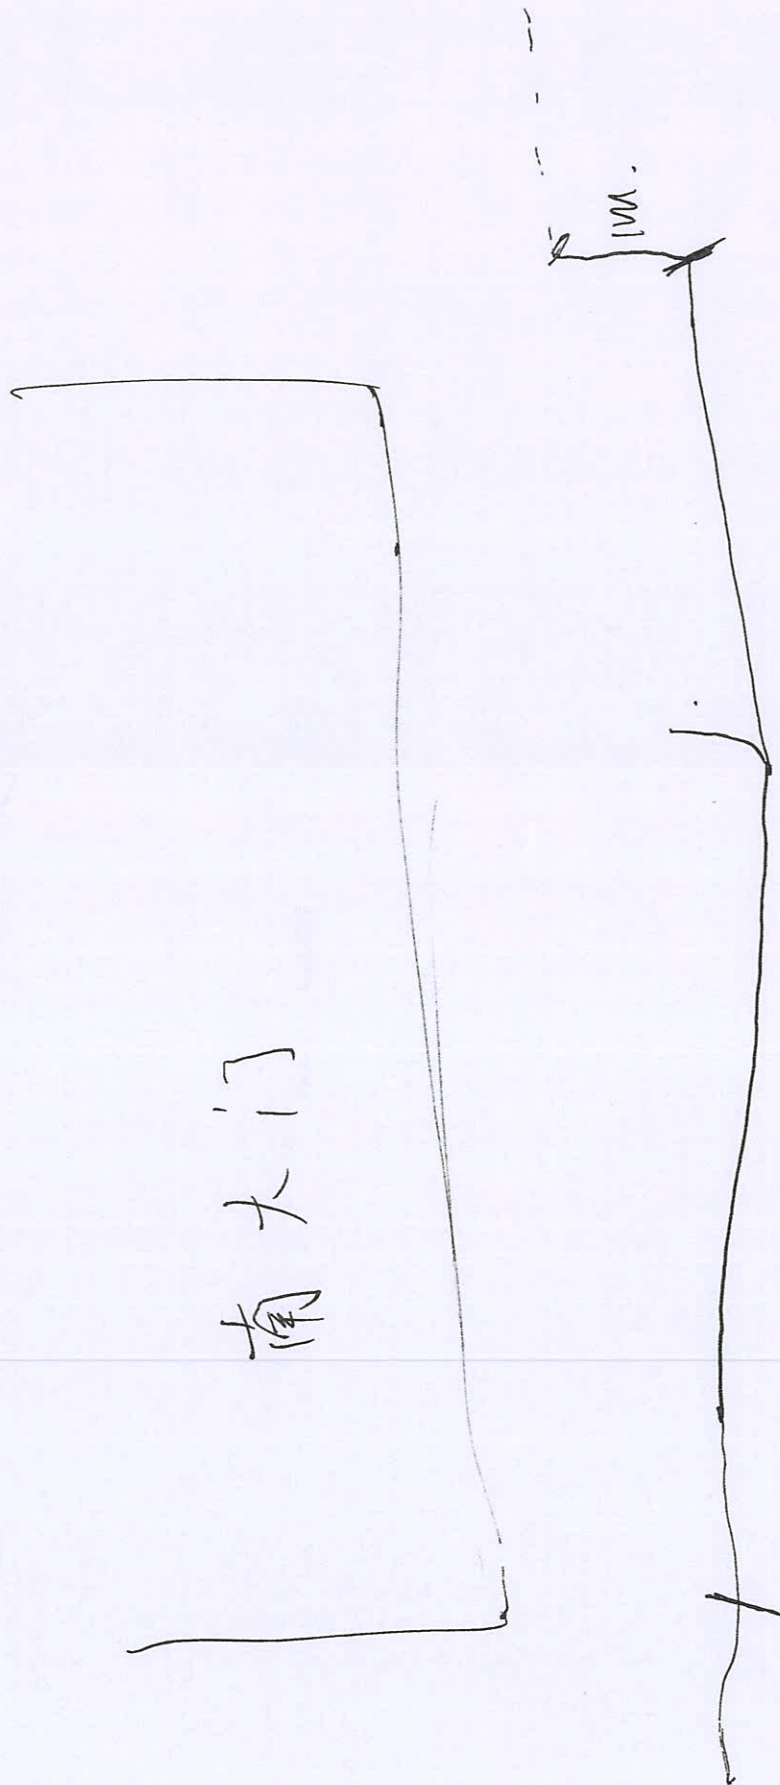

幕皮换新.

施工员: 张亮

监理: 刘石迪

工程: 韩中




成本: 周群怡
2022.3.2.

30M.

高度 2.3米
共 30m + n = 31米.

供应商约谈记录

第 1 次约谈

约谈的供应商名称	河南腾翔建筑工程有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	宜阳山水文苑项目南侧景观围墙围挡安装草皮价格谈判		
约谈日期	2021年11月2日		
约谈地点	电话约谈		
约谈的内容			
<p>一、施工要求：</p> <p>1、草皮厚度$\geq 15\text{mm}$，草皮与围挡固定牢靠，接缝凭证严密，搭接$\geq 100\text{mm}$。保证不脱落。</p> <p>2、工期：2天。</p> <p>二、价格：</p> <p>含税（9%）固定综合单价 13 元/m^2，据实结算。</p>			
<p>最终报价：含税 13 元/m^2 大写： / 税率： 9%</p>			
签字确认栏			
供应商代表	签字： 	电话： 13243078795	日期： 2021.11.2
我司代表	签字：  2021.11.2	 2021.11.2	

28p

南大门草皮换新



宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单 编号 (SSWY021)

施工任务位置: 6/9/10/13 号楼主楼电井母线楼板预留洞扩大

派发部门: 河南腾翔建筑工程有限公司

派发时间: 2022.3.9

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可多选)


施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同: /

派发任务原因: 6/9/10/13 号楼主楼电井封闭母线楼板预留洞扩洞, 原预留洞口已按民建电气图纸预留, 但不能满足供电力配电图纸中封闭母线的安装要求, 需将原 150mm 洞口扩展到 250mm。

派发任务描述:

把封闭母线楼板洞口由原 150mm 洞口剔凿到 250mm (如图所示), 如有钢筋需切断钢筋, 基层清理干净, 垃圾清出现场整。

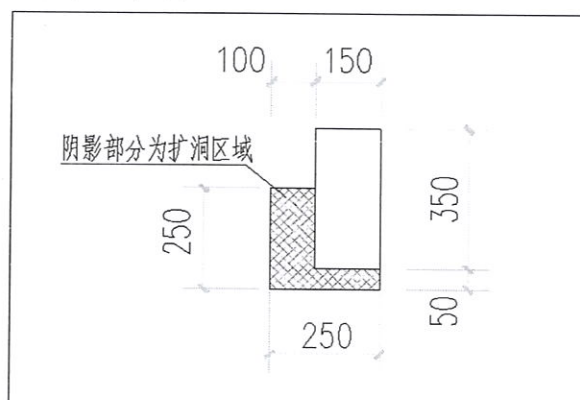

派发任务工期要求: 10 天

派发相关部门 (签字):

范天锋 2022.3.10

工程部负责人 (签字):

李仲丹

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

宜阳山水文苑 期交房派发零星工程验收确认单 编号 (SSWY021)

派发时间: 2022. 3. 9

完工时间: 2022. 3. 26

派发部门: 工程部

施工任务位置: 6/9/10/13 号楼主楼电井封闭母线楼板预留洞扩洞

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况: 主楼电井封闭母线板预留洞已按派发单要求尺寸完成扩洞施工, 9#、10#各 18 层每层 2 个, 6#、13#各 17 层每层 2 个, 共计 140 个, 基层清理干净, 垃圾清出现场。

相关验收人 (签字):

监理: 刘万通
张亮

王亚峰

工程部负责人 (签字):

李坤

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。


供应商约谈记录

约谈的供应商名称	河南腾翔建筑工程有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	预留洞扩大价格、户外展板价格
约谈日期	2022.3.14
约谈地点	开元壹号营销中心三楼会议室

约谈的内容

1、因6#9#10#13#主楼电井封闭母线楼板原预留洞尺寸已按民建电气图纸预留，但不能满足电力配电图纸中封闭母线的安装要求，需将原洞口扩展（尺寸如下图），且原《宜阳山水文苑年度零星工程合同》中无满足该尺寸预留洞扩大要求。

2、因项目需求，需做户外展板（龙卡板+户外画面，覆膜）。

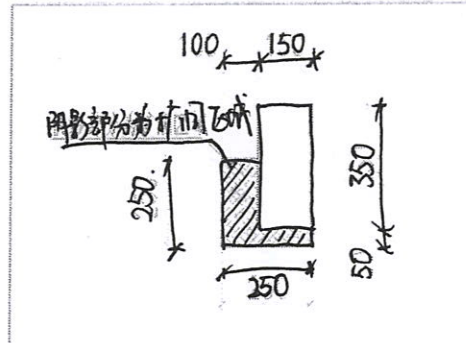

3、报价清单如下：

预留洞扩洞价格为含税包干价127元/个，含人工费、搬运费、机械费、利润、管理费、税金、疫情增加费等一切可能发生的费用。据实结算。

户外展板（龙卡板+户外画面，覆膜）价格为含税包干价45元/m²，含人工费、搬运费、机械费、设计费、利润、管理费、税金、疫情增加费等一切可能发生的费用。据实结算。

最终报价（人民币）：

大写： /

专票税率：9%

签字确认栏

供应商代表

签字：

电话：15293078795

日期：2022.3.14

我司代表

签字：

2022.3.14

2022.3.14

电梯井母线洞扩洞



宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单 编号 (SSWY022)

施工任务位置: 地库排烟风机房

派发部门: 河南腾翔建筑工程有限公司

派发时间: 2022. 3. 21

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可
多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同: /

派发任务原因: 落地排烟风机素混凝土基础不在消防单位和总包单位合同施工范围内, 由第三方单位实施。

派发任务描述:

在地库风机房内做排烟落地风机 C20 素混凝土基础 2000*2200*150mm (在机房地面已做标线), 共 20 个, 表面平整收光。

派发任务工期要求: 3 天

派发相关部门 (签字):

范天铎 2022.3.21

工程部负责人 (签字):

李中伟 2022.3.21

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

宜阳山水文苑 期交房派发零星工程验收确认单 编号 (SSWY022)

派发时间: 2022. 3. 21

完工时间: 2022. 3. 24

派发部门: 工程部

施工任务位置: 地下车库排烟风机房

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况: 已按要求完成山水文苑地库风机房排烟落地风机 C20 素混凝土基础
2000*2200*150mm, 共 20 个, 表面已平整收光。

相关验收人 (签字):

张亮

王合平

工程部负责人 (签字):

李伟

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

工程签证单

山水文苑地库风机排烟落地风机C20素混凝土基础

尺寸 2000 x 2200 x 150mm , 共20个 符合使用要求。

签证单

2022.6.29

供应商约谈记录

约谈的供应商名称	河南腾翔建筑工程有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	地库排烟机房C20素混凝土基础
约谈日期	2022. 3. 21
约谈地点	开元壹号营销中心三楼会议室

约谈的内容

1、落地排烟机房C20素混凝土基础(尺寸2000*2200*150mm)不在消防和总包单位合同施工范围内，需由第三方单位实施。

2、报价清单如下：

排烟机房C20素混凝土基础(尺寸2000*2200*150mm)价格为含税包干价1150元/m³，含人工费、材料费、机械费、利润、管理费、税金、疫情增加费等一切可能发生的费用。据实结算。

最终报价（人民币）：

大写： /

专票税率： 9%

签字确认栏

供应商代表

签字：



电话：

13243078795

日期：

2022.3.21


我司代表


签字：




 2022.3.21

同单位 2022.3.21

022 排风设备基础

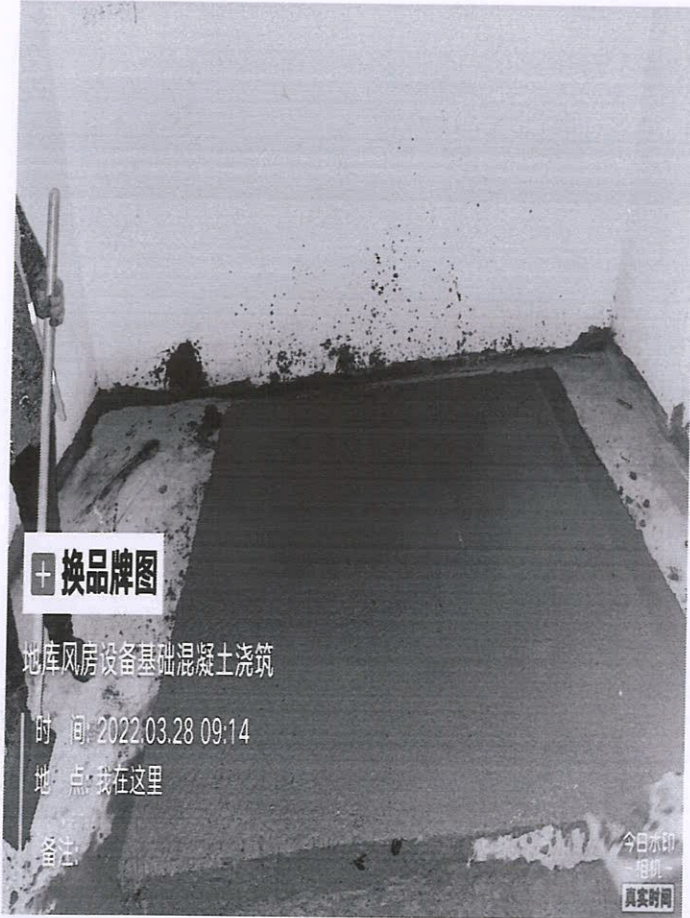

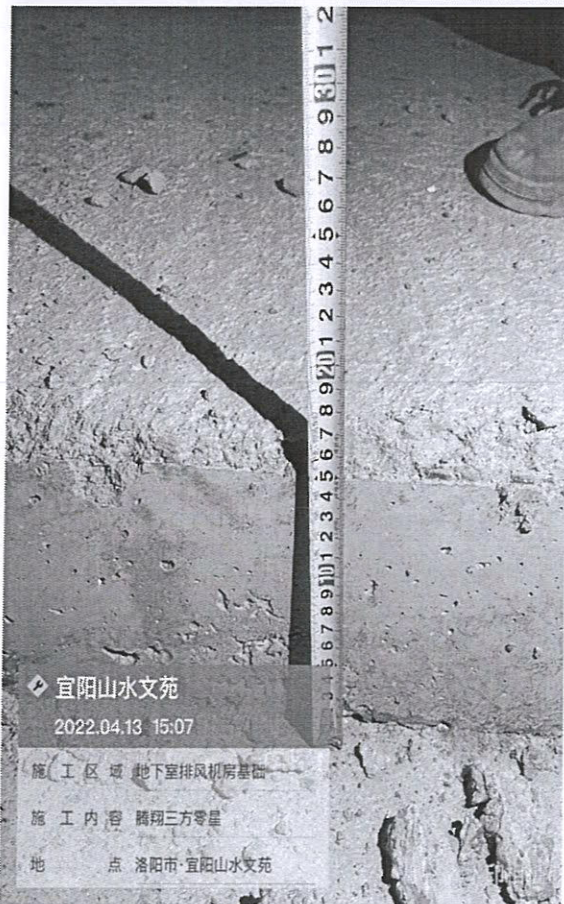

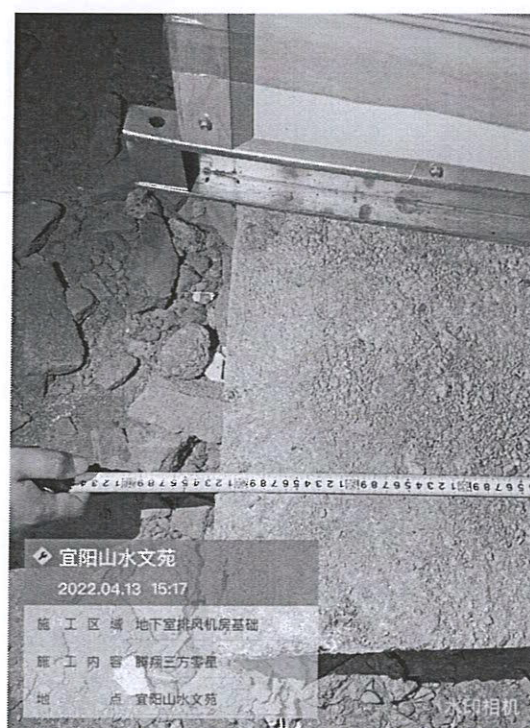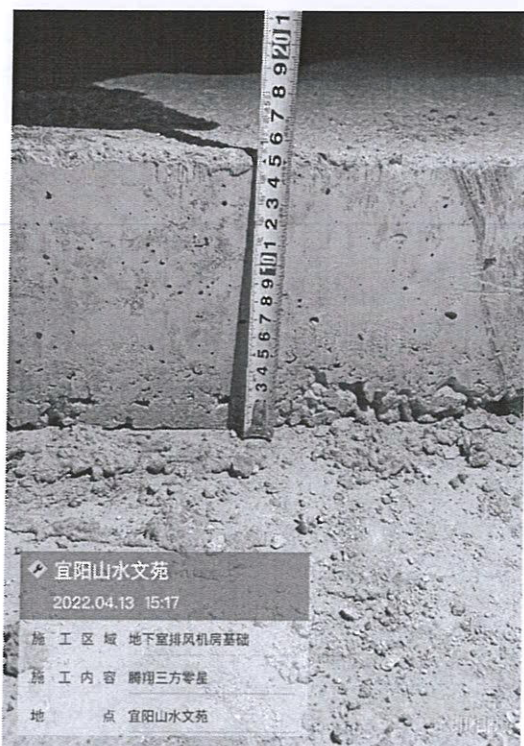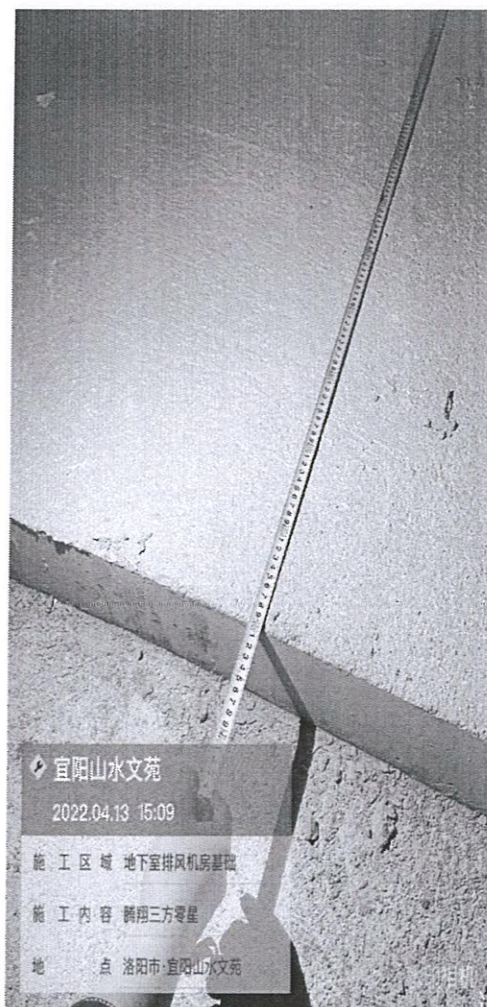

宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单 编号 (SSWY023)

施工任务位置: 滨河北路围挡党建宣传牌

派发部门: 河南腾翔建筑工程有限公司

派发时间: 2022. 3. 14

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可
多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同: /

派发任务原因: 滨河北路原党建宣传牌破旧, 应住建局要求更换新牌

派发任务描述:

材料要求同原版材料(龙卡板+户外画面, 覆膜), 数量(1.2*2.4米共10块;
0.6*0.4共9块)。

派发任务工期要求: 2天

派发相关部门(签字):

工程部负责人(签字):

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料(任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入(技术工种180元/工日, 普工力工100元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

宜阳山水文苑 期交房派发零星工程验收确认单 编号 (SSWY023)

派发时间: 2022.3.14

完工时间: 2022.3.16

派发部门: 工程部

施工任务位置: 山水文苑南边围挡, 工程部

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)


派发任务完成情况: 已按照派发单要求完成户外展板 (龙卡板+户外画面, 覆膜)


制作面积 $1.2 \times 2.4 = 2.88$ 平方米, 10 个共 28.8 平方米。

小展板面积 $0.6 \times 0.4 = 0.24$ 平方米, 9 个共 2.16 平方米。


相关验收人 (签字):







工程部负责人 (签字):



注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。


供应商约谈记录

约谈的供应商名称	河南腾翔建筑工程有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	预留洞扩大价格、户外展板价格
约谈日期	2022.3.14
约谈地点	开元壹号营销中心三楼会议室

约谈的内容

1、因6#9#10#13#主楼电井封闭母线楼板原预留洞尺寸已按民建电气图纸预留，但不能满足电力配电图纸中封闭母线的安装要求，需将原洞口扩展（尺寸如下图），且原《宜阳山水文苑年度零星工程合同》中无满足该尺寸预留洞扩大要求。

2、因项目需求，需做户外展板（龙卡板+户外画面，覆膜）。

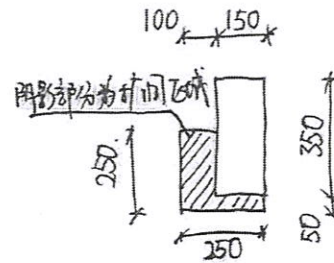

3、报价清单如下：

预留洞扩洞价格为含税包干价127元/个，含人工费、搬运费、机械费、利润、管理费、税金、疫情增加费等一切可能发生的费用。据实结算。

户外展板（龙卡板+户外画面，覆膜）价格为含税包干价45元/m²，含人工费、搬运费、机械费、设计费、利润、管理费、税金、疫情增加费等一切可能发生的费用。据实结算。

最终报价（人民币）：

大写：/

专票税率：9%

签字确认栏

供应商代表

签字：张亮

电话：13243078795


日期：2021.3.14


我司代表

签字：[Signature] 2022.3.14

签字：[Signature] 2022.3.14

023 户外展板

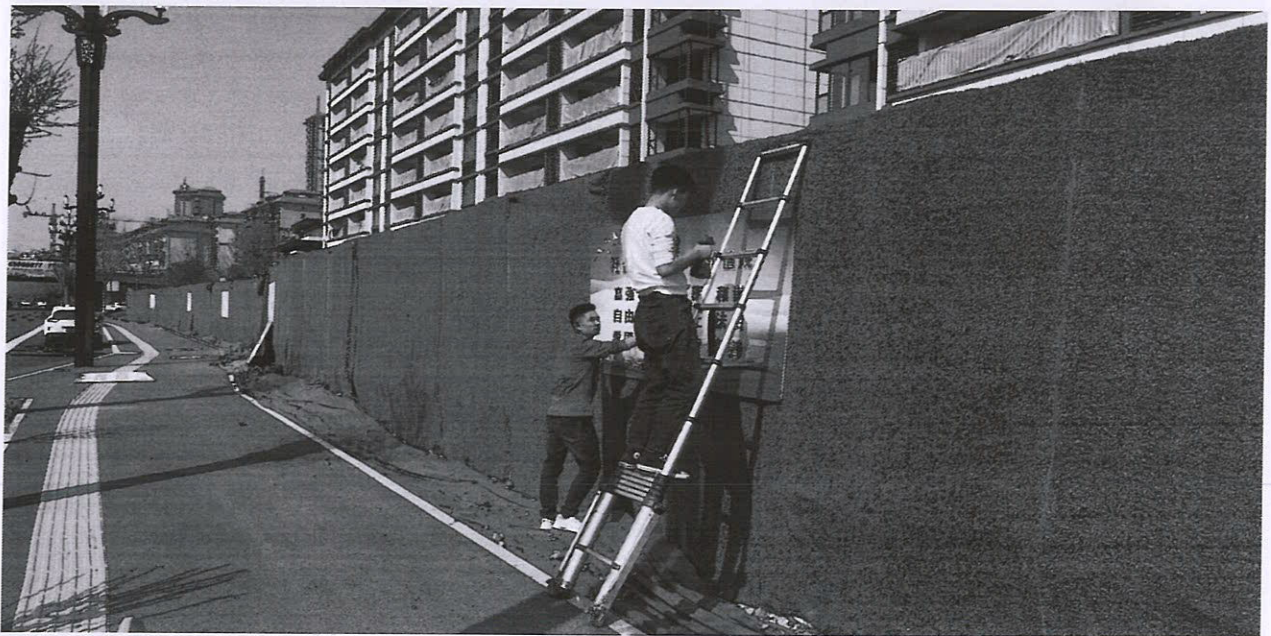



中浩德地产有限公司
CHINA GOOD HOUSE ESTATE CO., LTD.

宜阳山水文苑

上海文字建设集团 有限公司

中浩德控股集团有限公司
CHINA-HONDEN Holding Co., Ltd.

浩德地产 品质为先 基业百年

春节复工大会

宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单 编号 (SSWY024)

施工任务位置: 南大门口围挡

派发部门: 河南腾翔建筑工程有限公司

派发时间: 2022. 3. 16

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同: /

派发任务原因: 滨河北路南大门处原旧围挡影响形象, 应住建局要求更换新围挡。

派发任务描述:

将原旧围挡拆除, 新建围挡(做可开启大门2个)、草皮, 材料质量符合合同要求标准。

派发任务工期要求: 2天

派发相关部门(签字):

工程部负责人(签字):

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料(任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入(技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

宜阳山水文苑 期交房派发零星工程验收确认单 编号 (SSWY024)

派发时间: 2022.3.16

完工时间: 2022.3.18

派发部门: 工程部

施工任务位置: 南大门围挡

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况: 已按要求完成山水文苑南大门围挡拆除、新建、草皮覆盖施工。
具体尺寸详见附件。

相关验收人 (签字):

刘进 22.4.13
张亮

工程部负责人 (签字):

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

南大门



① 南大门 新建围墙、单段高2m、总长27.5m。

② 拆除围墙 1m 高2.3m。 (因破旧影响形象,应经
建局要求、拆除原利用
旧围墙,更换为新围墙)

河南腾翔建筑公司: 杨钧楠


监理: 刘子进 2022.4.13.
工程部: 郭彬

成本部: 闫琳琳 2022.4.13

024 南大门围挡拆除



024 新建南大门围挡

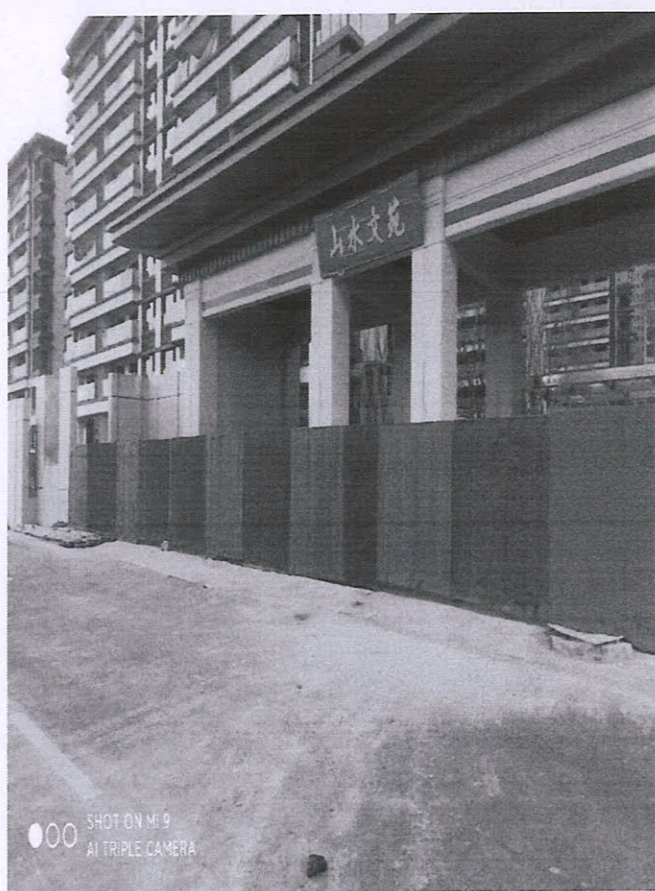

工 作 联 系 单

项目名称	中浩德·山水文苑	联系单编号	358
合同名称	中浩德山水文苑总承包合同	合同编号	SSWY.01-JA-008
主送单位	中国建筑第七工程局有限公司		
抄送单位	建基工程咨询有限公司		
事由	关于山水文苑现场生活区、办公室房子及地坪清理事宜		


内容：

由你单位承建的山水文苑项目，现场生活区、办公室房子及地坪（照片附后）严重影响下步工序施工，现要求你司3日内开始清理，如不施工，由第三方代清，费用扣除！


下无正文

责任工程师：（签字）

工程经理：（签字）

日期：2022年3月7日

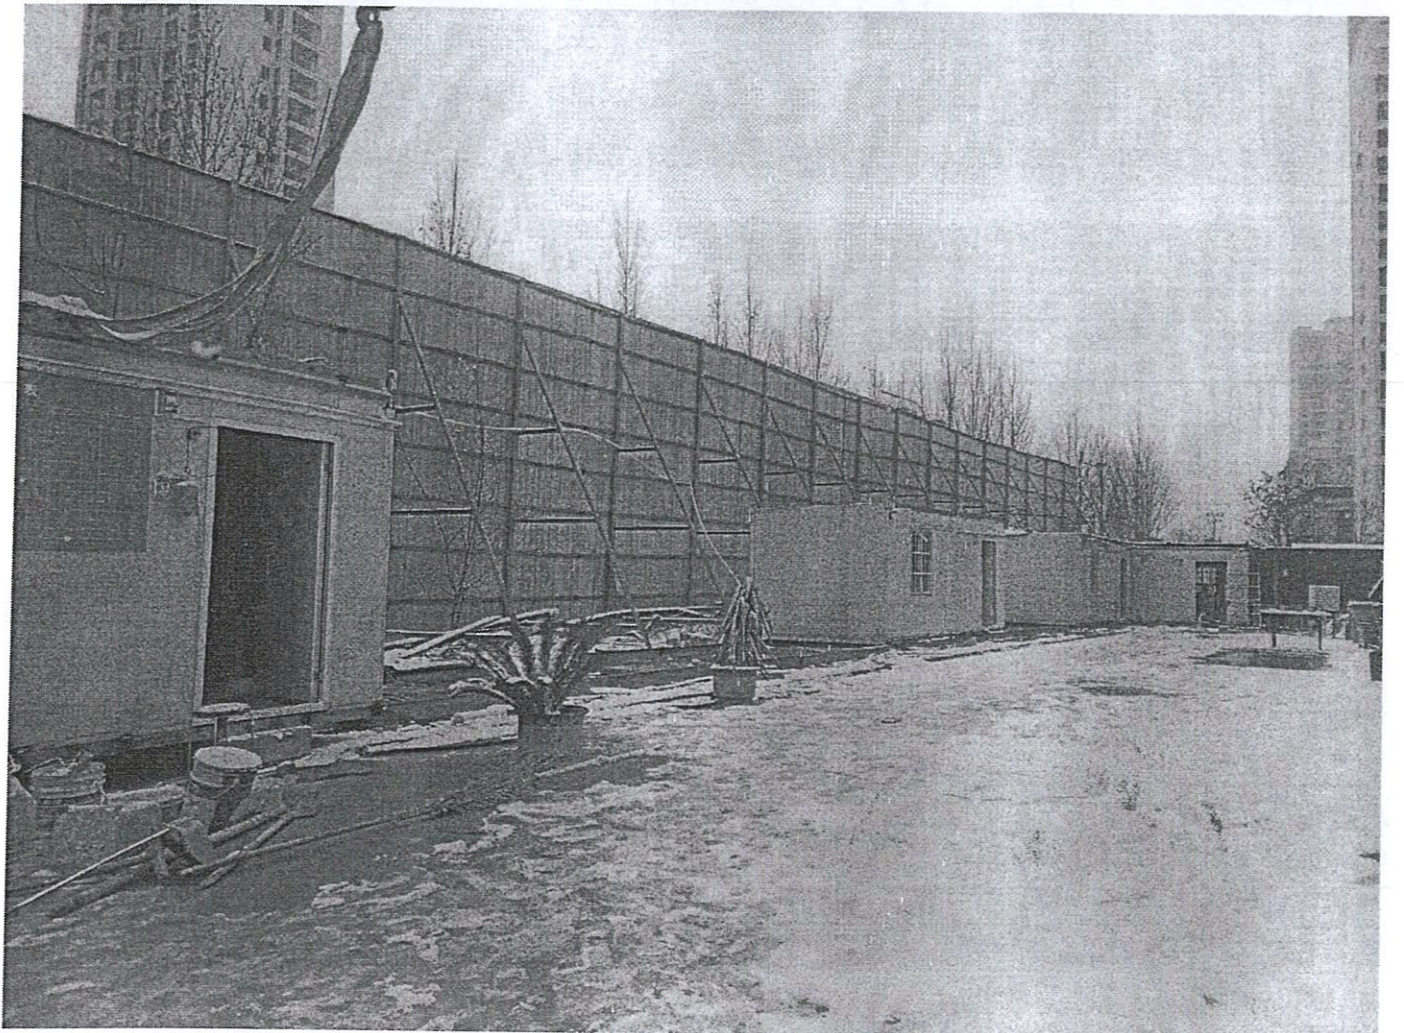

宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单 编号 (SSWY026)

施工任务位置：施工现场东侧总包生活区，西侧总包办公室

派发部门：河南腾翔建筑工程有限公司

派发时间：2022.3.27

任务派发形式：零星借工；综合施工(可
多选)

施工内容是否转扣其他单位：否；是

转扣方合同：中浩德山水文苑总承包合同

派发任务原因：施工现场原生活区、办公区水泥地坪严重影响下步工序施工。

派发任务描述：


混凝土地坪破除，清理出现场。

派发任务工期要求：20 天

派发相关部门（签字）：



工程部门负责人（签字）：



注：1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料（任务单号应一致）

2. 零星借工按工日计入（技术工种 180 元/工日，普工力工 100 元/工日），综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份，施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

宜阳山水文苑 期交房派发零星工程验收确认单 编号 (SSWY026)

派发时间: 2022. 3. 27

完工时间: 2022. 4. 15

派发部门: 工程部

施工任务位置: 山水文苑东部生活区北部生活区及西大门混凝土破除清运

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况: 已完成山水文苑东部生活区北部生活区及西大门混凝土破除清运,

东区总面积 1389. 87 平方米; 西区总面积 371. 55 平方米。

东区另破除水池 17. 05 平方米。

总计 1778. 47 平方米。

详细尺寸见附图。

相关验收人 (签字):

张刘进

韩物


工程部负责人 (签字):

李翔

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

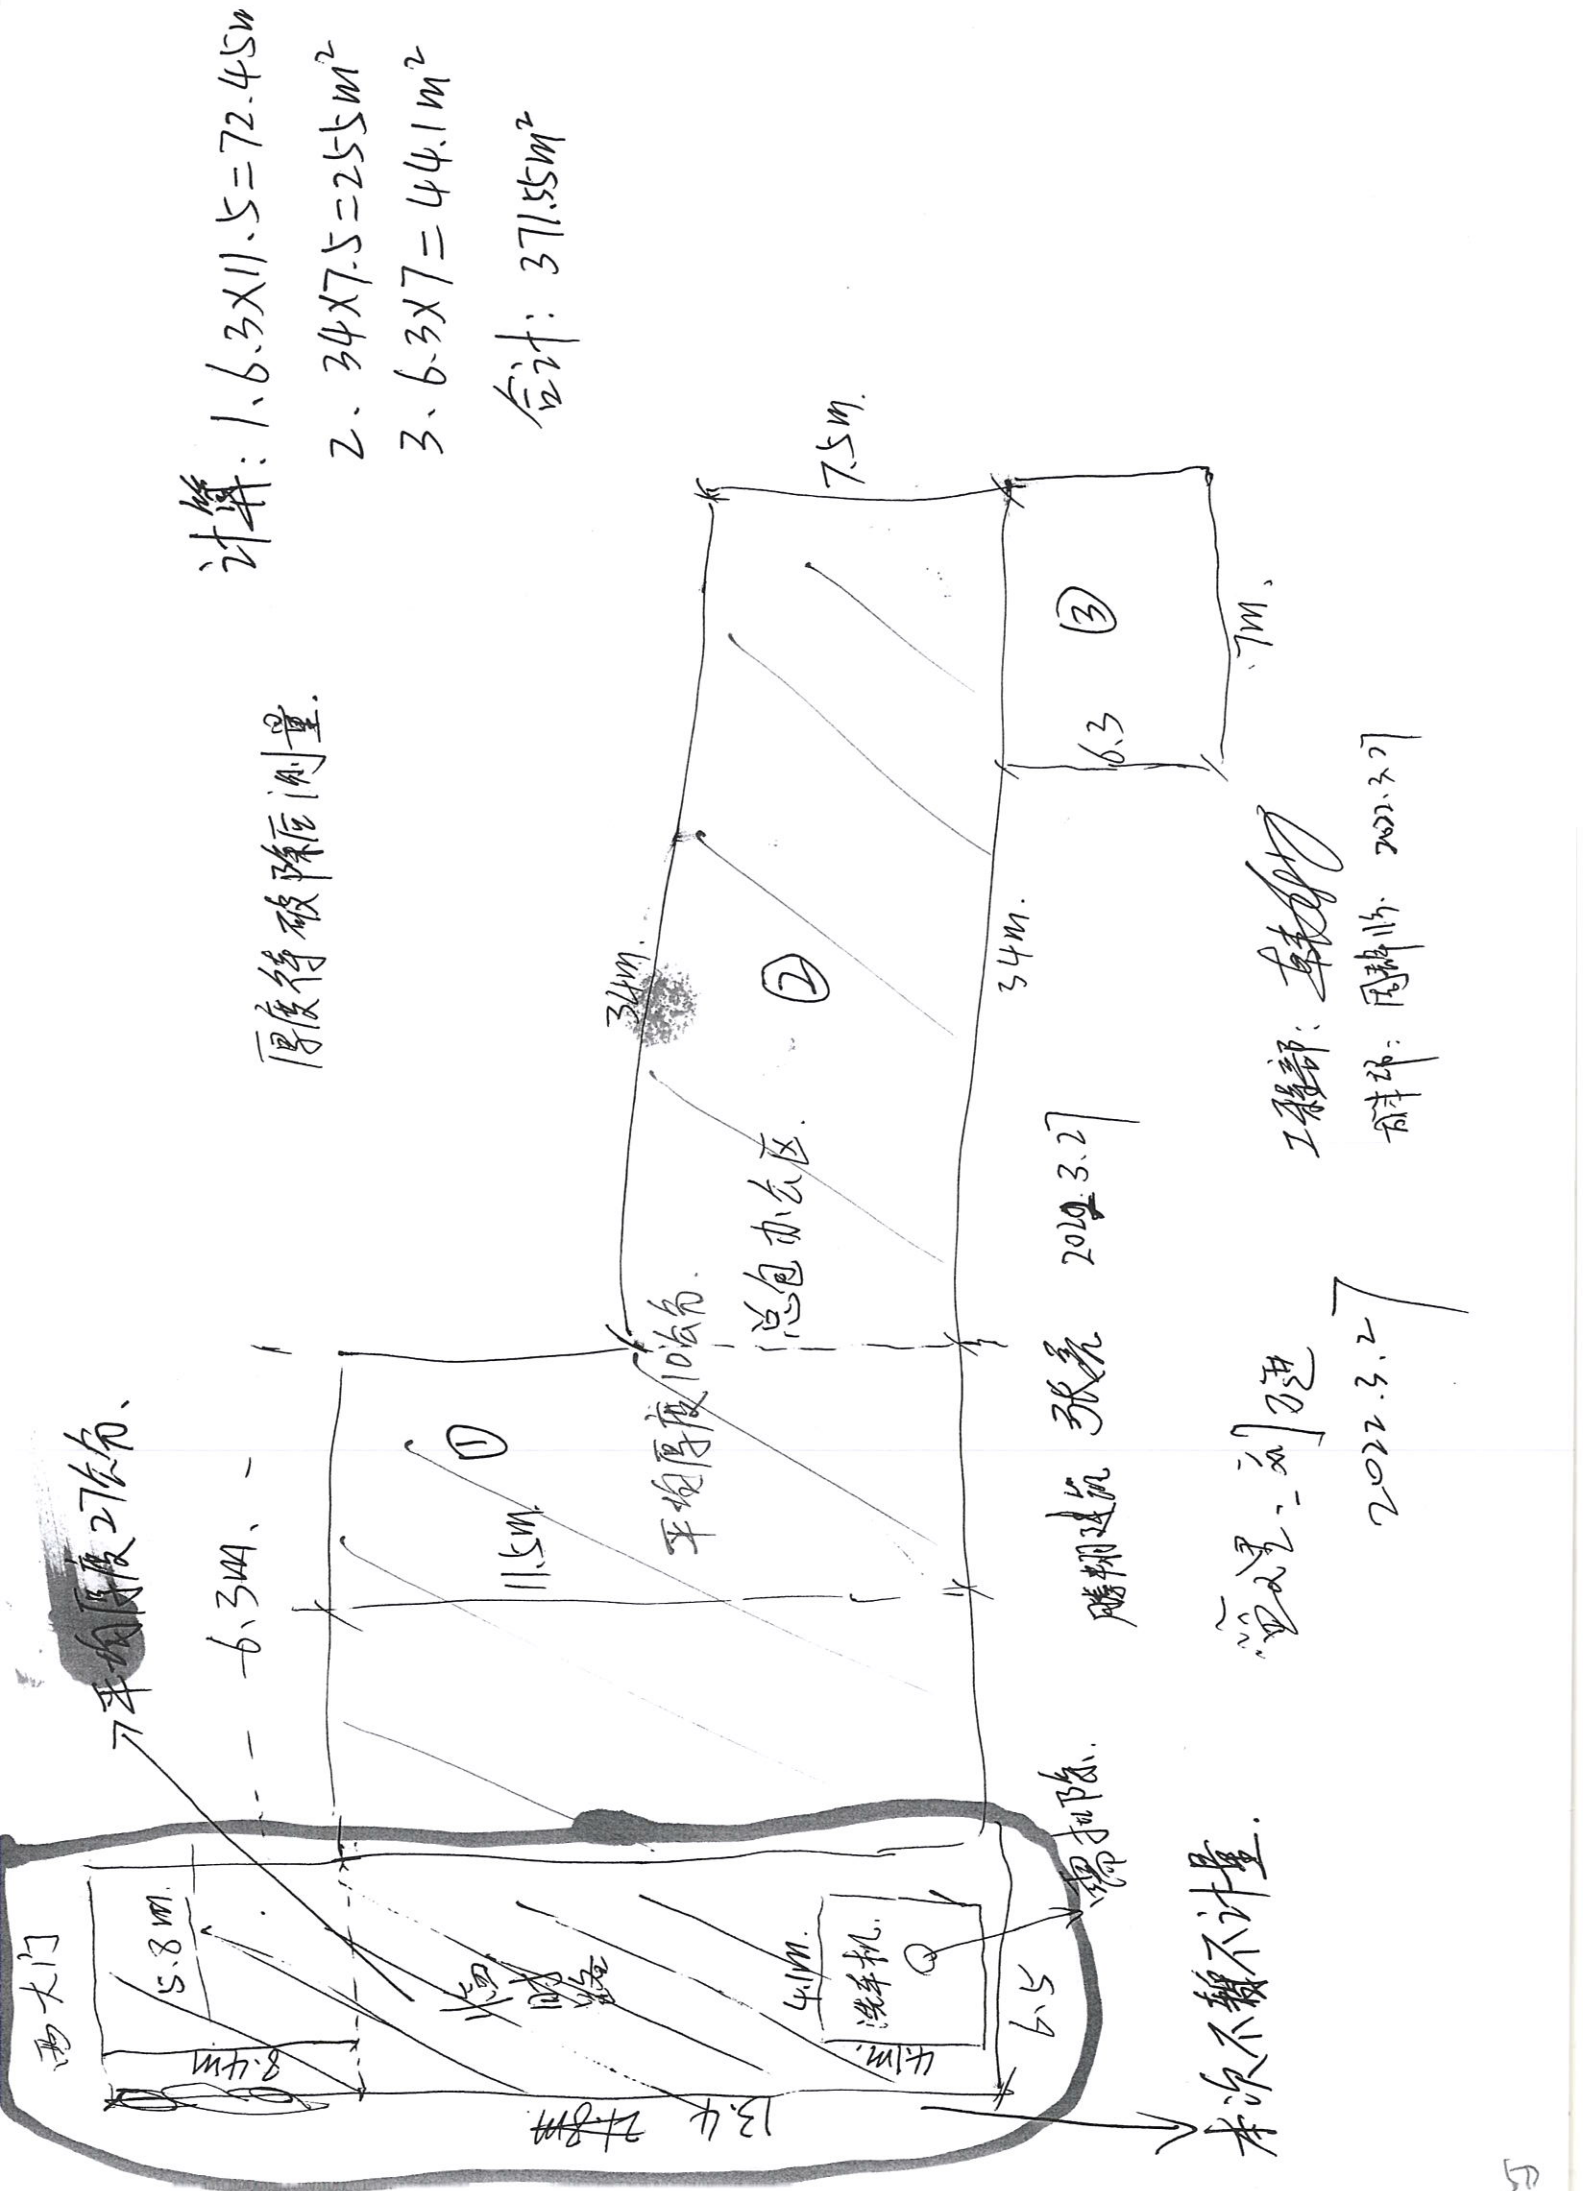

计算: 1. $6.3 \times 11.5 = 72.45m^2$
 2. $3.4 \times 7.5 = 25.5m^2$
 3. $6.3 \times 7 = 44.1m^2$
 合计: $371.55m^2$

厚度待破除后测量.

腾翔建筑 张亮 2022.3.27

本次不暂不计量.

刘进

工程部: 张亮


2022.3.27

项目部: 周静怡 2022.3.27

20M大

正 +5.5M

F +3.4M

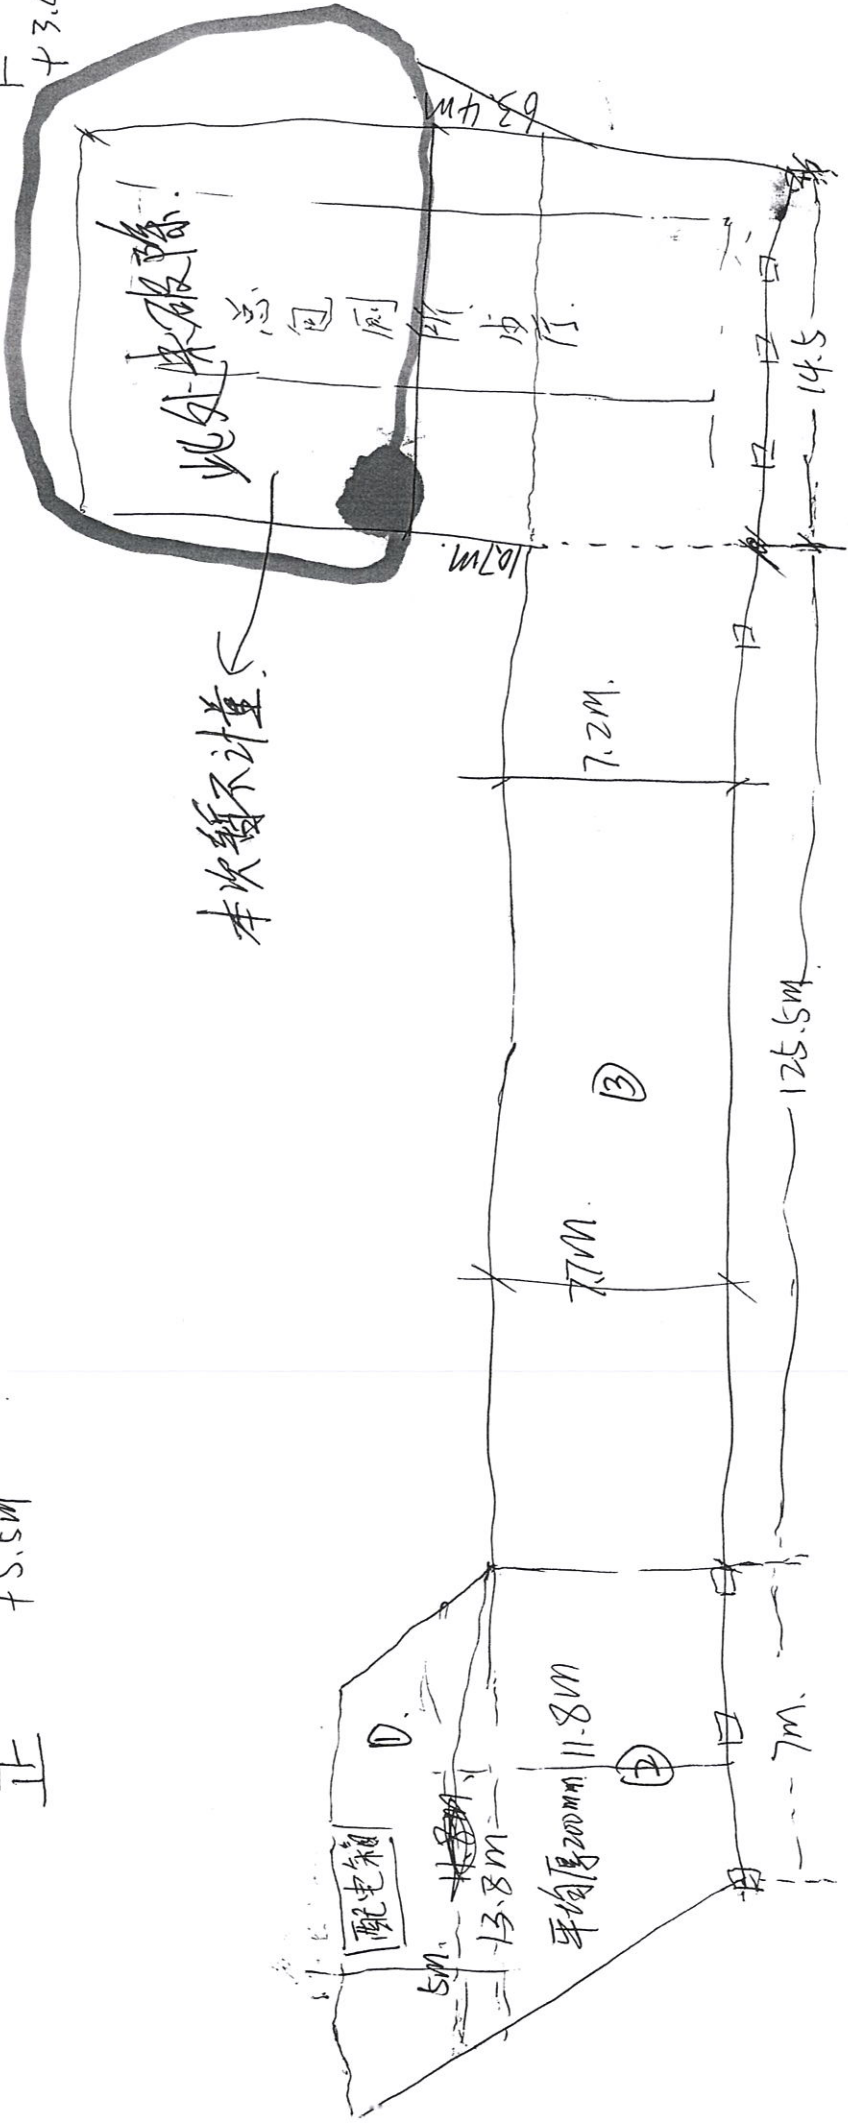

计算: ↓ 东侧总包生活区地坪.

1. $5 \times 13.8 = 69m^2$

2. $(7 + 13.8) / 2 \times 11.8 = 122.72m^2$

说明: 刘健 2022.3.27

3. $(125.5 + 14.5) \times (7.2 + 7.7) / 2 = 1043m^2$

4. $10.7 \times 14.5 = 155.15m^2$

合计: 1389.87m²

滕翔峰 张亮 2022.3.27

工程部 韩

本部 同明怡 2022.3.27



计算

长 15.5m × 宽 1.1m × 厚度按 0.3m 计算.

= 17.05m²

张名

监督: 刘万进

工程部: 韩少

026 混凝土破除照片



026 混凝土破除照片



026 混凝土破除照片



工作联系单

项目名称	中浩德·山水文苑	联系单编号	363
合同名称	中浩德山水文苑	合同编号	/
主送单位	中国建筑第七工程局有限公司 上海文宇建设集团有限公司 郑州诺金装饰工程有限公司 河南玖恒建设工程有限公司 恒言园林工程有限公司洛阳分公司 虜克电梯有限公司 洛阳坤宏建设集团有限公司		
抄送单位	建基工程咨询有限公司		
事由	关于山水文苑现场清理事宜		

内容:

由你单位承建的山水文苑项目，现场及各楼周边遗留垃圾（不包含室内及各自加工区垃圾），严重影响下步工序施工，现由第三方清理及外运，费用由以下单位分摊：

现场垃圾分摊	
单位	分摊比例
门窗	23%
大堂装修	11%
文宇外墙漆	10%
诺金外墙漆	8%
景观	2%
电梯	1%
总包	45%
合计	100%

垃圾清运需人工及机械配合装车外运，所发生费用以实际为准，以上各单位均可以现场监督。

下无正文

责任工程师：（签字）

工程经理：（签字）




日期：2022年3月9日

宜阳山水文苑一期交房零星工程任务派发单 编号 (SSWY027)

施工任务位置: 施工现场室外

派发部门: 河南腾翔建筑工程有限公司

派发时间: 2022.3.10

任务派发形式: 零星借工; 综合施工(可
多选)

施工内容是否转扣其他单位: 否; 是

转扣方合同: 中国建筑第七工程局有限公司 上海文宇建设集团有限公司

郑州诺金装饰工程有限公司 河南玖恒建设工程有限公司

恒言园林工程有限公司洛阳分公司 房克电梯有限公司

洛阳坤宏建设集团有限公司

派发任务原因: 现场垃圾严重影响下步工序施工, 急需清理, 多次通知要求清理, 各单位无行动。

派发任务描述:

施工现场室外垃圾, 门厅、风道内垃圾需人工清理至指定地方, 采用挖机装车外运。

派发任务工期要求: 6天

派发相关部门(签字):

工程部负责人(签字):

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料(任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入(技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

宜阳山水文苑 期交房派发零星工程验收确认单 编号 (SSWY027)

派发时间: 2022. 3. 10

完工时间: 2022. 4. 15

派发部门: 工程部

施工任务位置: 宜阳山水文苑大门西侧及内部场地

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况: 已完成 3. 10-4. 15 期间宜阳山水文苑内部垃圾整理及装车外运工作, 小区内部垃圾由人工整理到钩机可以施工的指定区域, 再由钩机装车外运。工作内容详见附件。

相关验收人 (签字):

张亮 刘进 郭力

工程部负责人 (签字):

李彬

注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 180 元/工日, 普工力工 100 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。

3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

供应商约谈记录

约谈的供应商名称	河南腾翔建筑工程有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	240钩机、垃圾外运10m3车、洒水车
约谈日期	2021. 10. 22
约谈地点	开元壹号营销中心二楼会议室

约谈的内容

1、现场垃圾清运需使用240钩机、垃圾外运10m3车、洒水车，合同无该部分单价，故进行价格约谈

2、报价清单如下：

240钩机价格为含税包干价2500元/台班，垃圾外运10m3车为含税包干价330元/车，洒水车价格为140元/趟。此价格均含人工费、材料费、机械费、利润、管理费、税金、疫情增加费等一切可能发生的费用。据实结算。

最终报价（人民币）：

大写： /

专票税率：9%

签字确认栏


供应商代表

签字： 

电话： 13243078795

日期： 2021.10.22

我司代表

签字：  2021.10.22

同腾翔, 2021.10.22.

宜阳山水苑内部场地清理人工机械使用

序号	日期	工作内容	60钩机 (机械台班)	240钩机 (机械台班)	垃圾外运 (10m³车)	备注
1	3.18	清理南大门土堆垃圾、整理2号楼回填土、修路	1			
2	3.19	白天钩机整理垃圾修路、晚上加班装垃圾	1		10	
3	3.20	白天钩机整理垃圾修路、晚上加班装垃圾	1		7	
4	3.22	白天钩机整理垃圾修路、晚上加班装垃圾	1		9	
5	3.29	白天钩机整理垃圾修路、晚上加班装垃圾		1	18	洒水车1
6	3.31	白天钩机整理垃圾修路、晚上加班装垃圾		1	3	
7	4.06	白天钩机整理垃圾修路、晚上加班装垃圾、垃圾土		1	44	
8	4.07	白天钩机整理垃圾修路、晚上加班装垃圾、垃圾土		1	26	
9	4.08	白天钩机整理垃圾修路、晚上加班装垃圾、垃圾土		1	8	
10	4.09	白天钩机整理垃圾修路、晚上加班装垃圾、垃圾土		1	8	
		合计	4	6	133	1

第16号?

张进刘万进

宜阳山水文苑部场地清理人工机械使用情况

序号	日期	工作内容	人工	备注
1	3.11	捡园区内垃圾	6	
2	3.12	捡园区内垃圾	7	
3	3.13	捡园区内垃圾	6	
4	3.14	捡园区内垃圾	7	
5	3.15	捡园区内垃圾	7	
6	3.16	捡园区内垃圾	5	
7	3.17	捡园区内垃圾	5	
8	3.18	捡园区内垃圾	7	
9	3.19	捡园区内垃圾	5	夜班1人
10	3.20	捡园区内垃圾	5	夜班1人
11	3.21	捡园区内垃圾	4	
12	3.22	捡园区内垃圾	5	夜班1人
13	3.23	捡园区内垃圾	4	
14	3.24	捡园区内垃圾	3	
15	3.27	捡园区内垃圾	4	
16	3.28	捡园区内垃圾	4	
17	3.29	捡园区内垃圾	3	
18	3.30	捡园区内垃圾	3	
19	3.31	捡园区内垃圾	2	
20	4.01	捡园区内垃圾	5	
21	4.02	捡园区内垃圾	3	
22	4.03	捡园区内垃圾	4	
23	4.04	捡园区内垃圾	4	

工作时间 7:30-11:30

13:30-17:30

张立 万进 张立

加班(夜班)

19:00-02:00


24	4.05	捡园区内垃圾	4	
25	4.06	捡园区内垃圾	4	
26	4.07	捡园区内垃圾	4	
27	4.08	捡园区内垃圾	4	
28	4.09	捡园区内垃圾	5	
29	4.10	捡园区内垃圾	5	
30	4.11	捡园区内垃圾	5	
31	4.12	捡园区内垃圾	7	
32	4.13	捡园区内垃圾	4	
	4.14	捡园区内垃圾	4	
	4.15	捡园区内垃圾	8	
		合计	162	

张亮 万通 郭


2022.3.11-2022.3.14 人工照片



2022.3.15-2022.3.18 人工照片

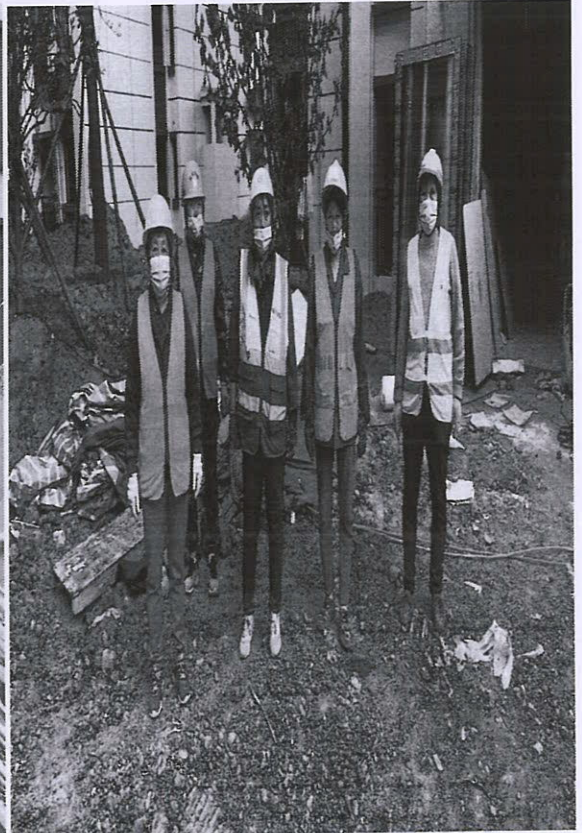



2022.3.19-2022.3.20 人工照片

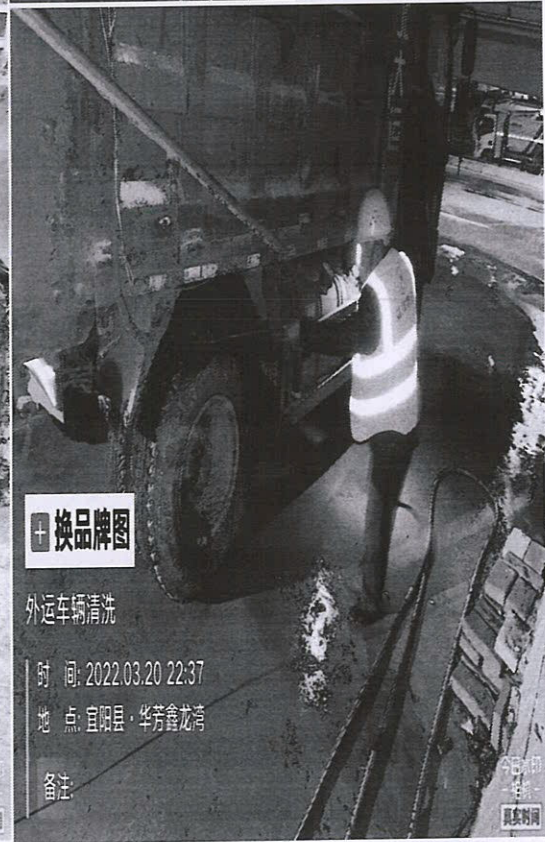


2022.3.21-2022.3.23 人工照片





2022.3.24、2022.3.27-3.29 人工照片

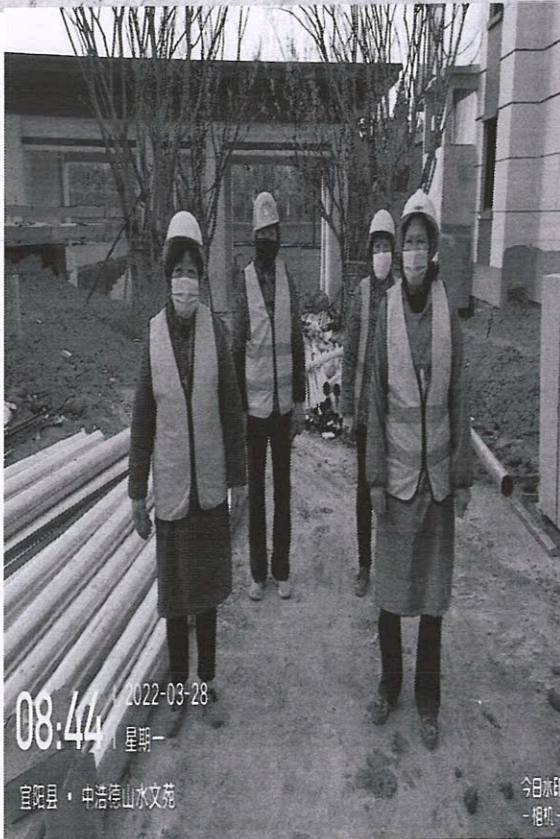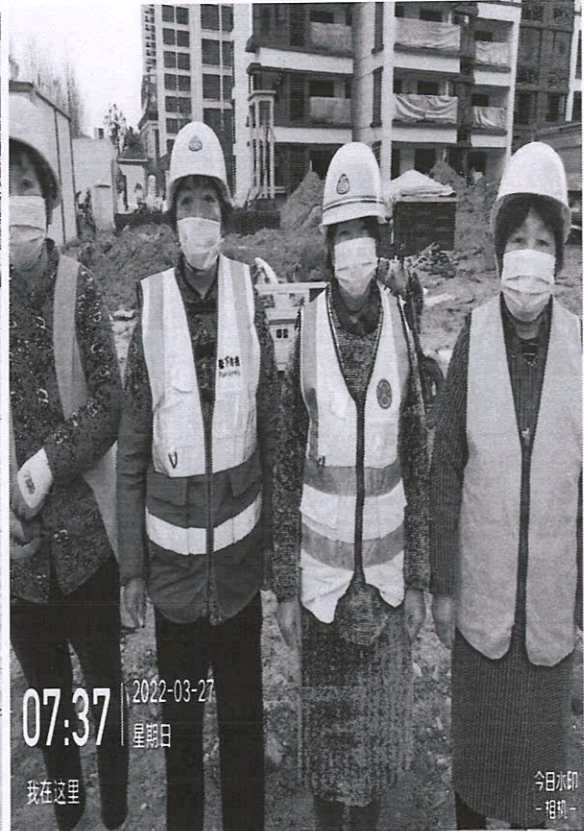


2022.3.30-2022.3.31 2022.4.01-2022.4.02 人工照片

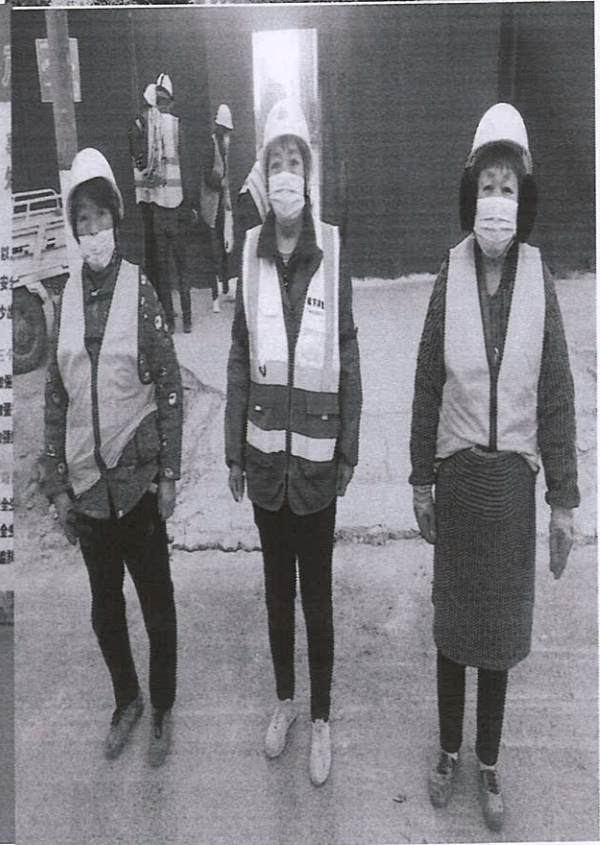

2022.4.3-2022.4.6 人工照片

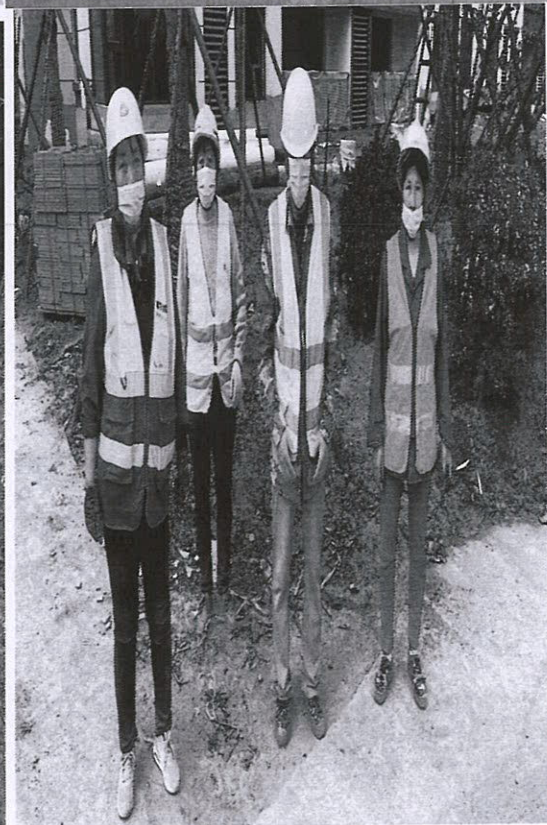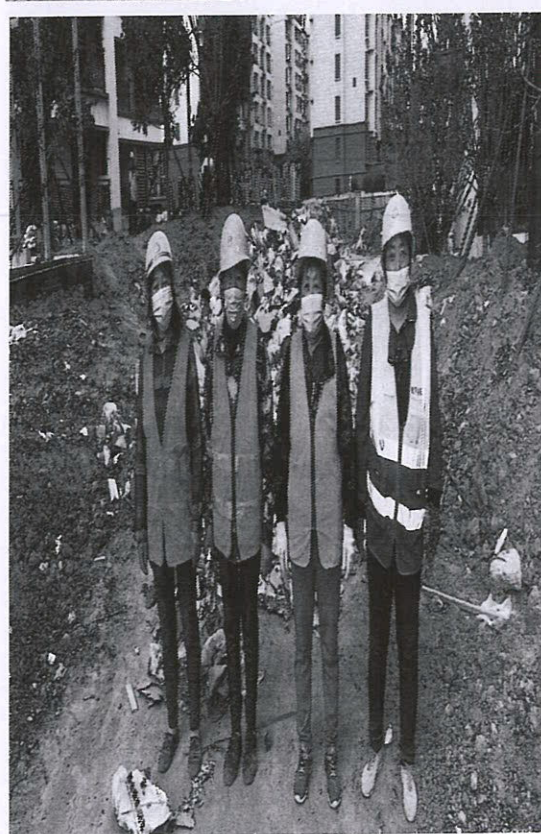

2022.4.7-4.10 日工照片

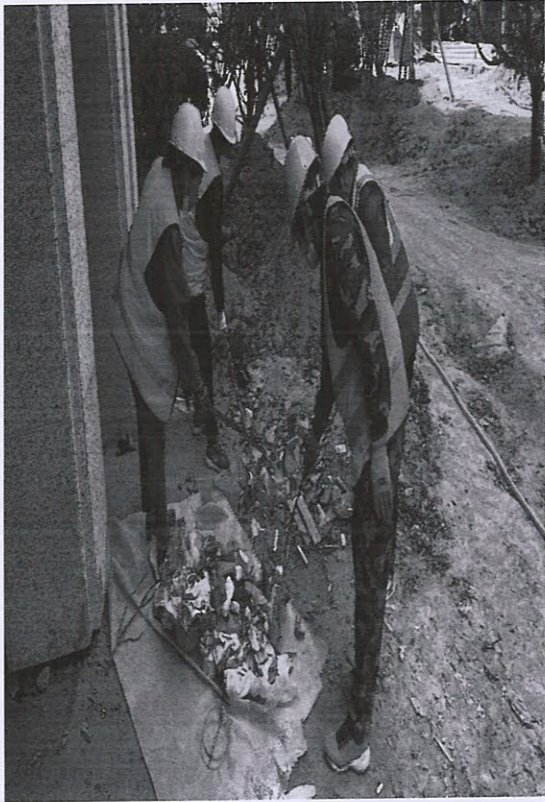

2022.4.11-2022.4.14 人工照片



2022.4.15 人工照片



宜阳山水文苑第三方施工人员签到表

序号	姓名	电话	签到日期	备注
	许永法	17737206692	3.18	
	李海真		3.18	
	韦慧泽		3.18	
	石亚斌		3.18	
	李金松		3.18	
	耿元军		3.18	
	薛飞龙		3.18	

宜阳山水文苑第三方施工人员签到表

序号	姓名	电话	签到日期	备注
	许永涛	17737206692	3.24	
	耿元军		3.24	
	靳飞龙		3.24	

宜阳山水文苑第三方施工人员签到表

序号	姓名	电话	签到日期	备注
	许永强	17737206692	3.30	
	李文松		3.30	
	耿元军		3.30	

宜阳山水文苑第三方施工人员签到表

序号	姓名	电话	签到日期	备注
	许永法	17737206692	3.31	
	薛飞坤		3.31	

宜阳山水文苑第三方施工人员签到表

序号	姓名	电话	签到日期	备注
	许永涛	17737206692	4.1	
	李之林		4.1	
	朱亮		4.1	
	薛明飞		4.1	
	耿元学		4.1	

宜阳山水文苑第三方施工人员签到表

序号	姓名	电话	签到日期	备注
	许永涛	17732206692	4.12	
	耿元军		4.12	
	王仁成		4.12	
	吴友志		4.12	
	李强		4.12	
	薛龙飞		4.12	
	李立群		4.12	


宜阳山水文苑第三方施工人员签到表

序号	姓名	电话	签到日期	备注
	许永强	17757206692	4.13	
	耿元学		4.13	
	李廷松		4.13	
	薛加飞		4.13	


宜阳山水文苑第三方施工人员签到表

序号	姓名	电话	签到日期	备注
	许永法	17737206692	4.15	
	李强		4.15	
	马元荣		4.15	
	李长		4.15	
	吴庆忠		4.15	
	薛龙飞		4.15	
	李元		4.15	
	李立群		4.15	

60钩机 3.18 3.19 3.20 3.22 工作照片

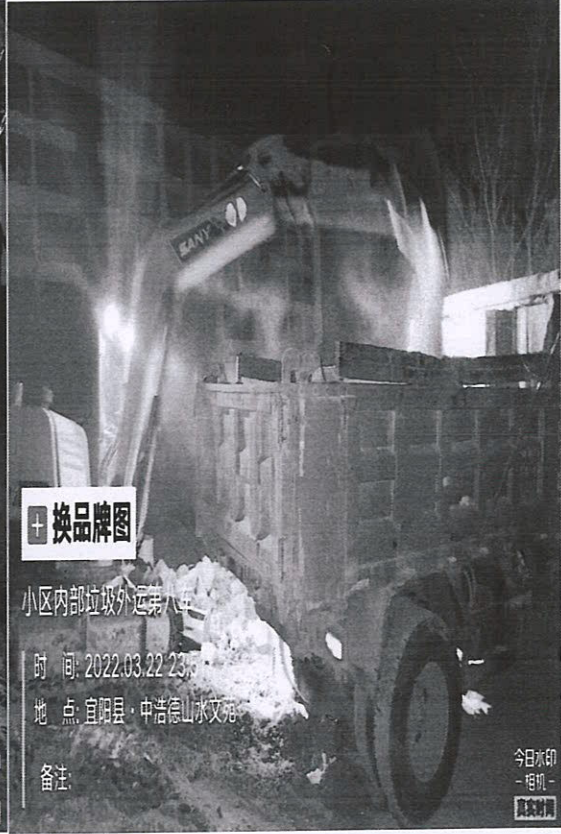


240 钩机 3.29 3.31 - 4.6, 4.7 工作照片

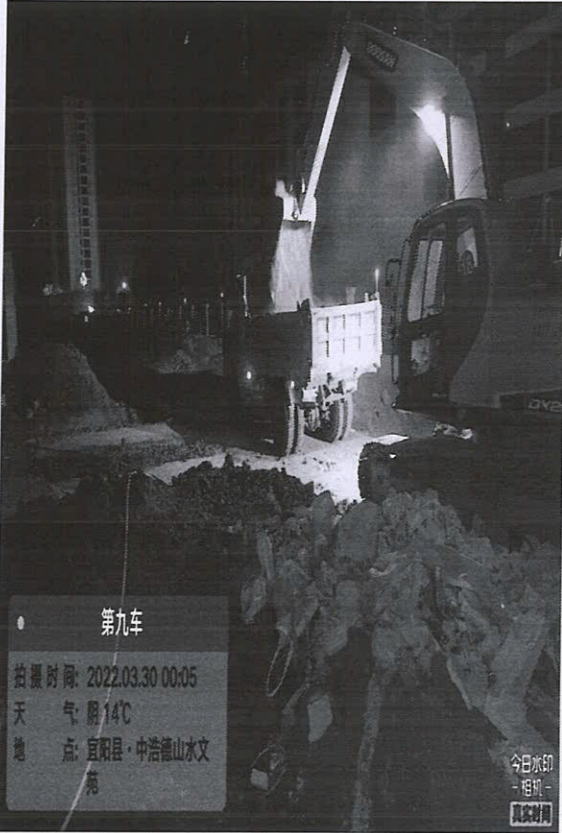

● 第九车
 拍摄时间: 2022.03.30 00:05
 天气: 晴 14℃
 地点: 宜阳县·中浩德山水文苑

今日水印
 相机
 真实时间

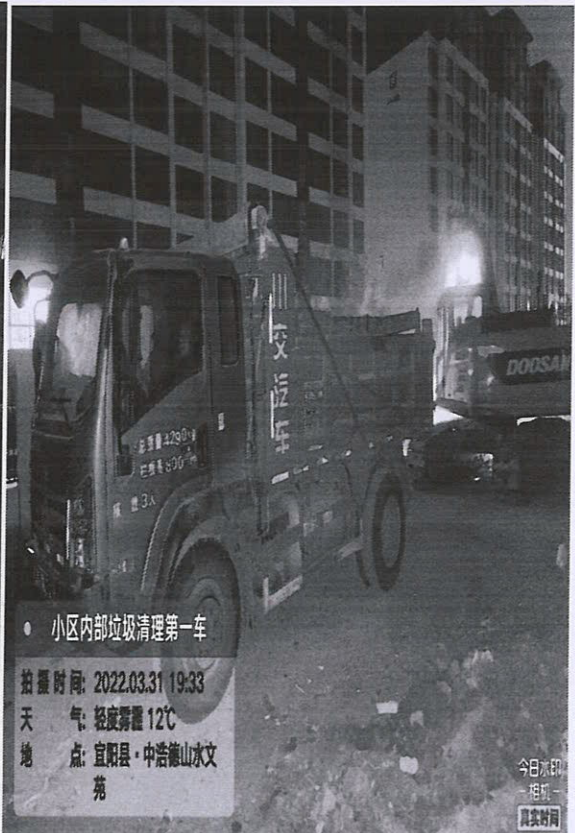

● 小区内部垃圾清理第一车
 拍摄时间: 2022.03.31 19:33
 天气: 轻度雾霾 12℃
 地点: 宜阳县·中浩德山水文苑

今日水印
 相机
 真实时间



● 9号楼西边土堆外运第三十八车
 拍摄时间: 2022.04.06 23:35
 地点: 宜阳县·宜阳县·中浩德山水文苑


今日水印
 相机
 真实时间





● 东大门垃圾清理第一车
 拍摄时间: 2022.04.07 19:56
 天气: 晴 21℃
 地点: 宜阳县·中浩德山水文苑

今日水印
 相机
 真实时间

240 钩机 4.8 4.9 工作照片

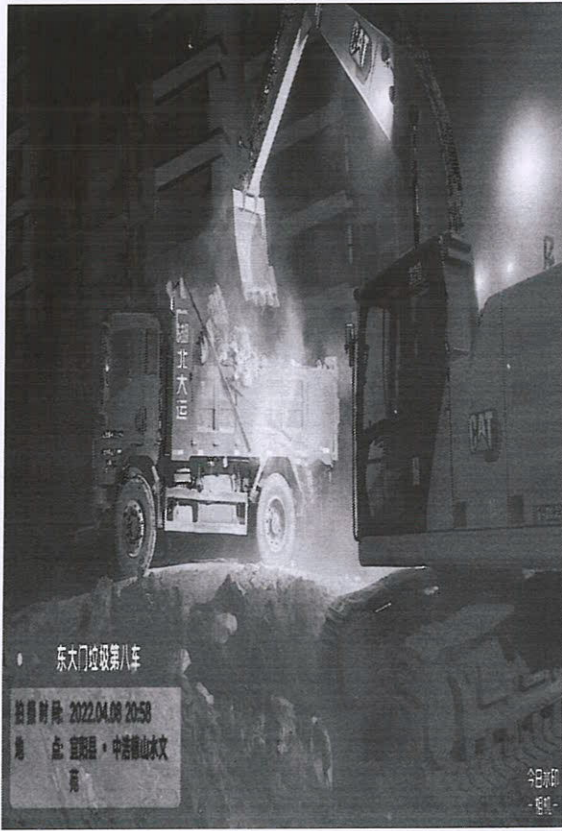

3.19 垃圾清运 工作照片

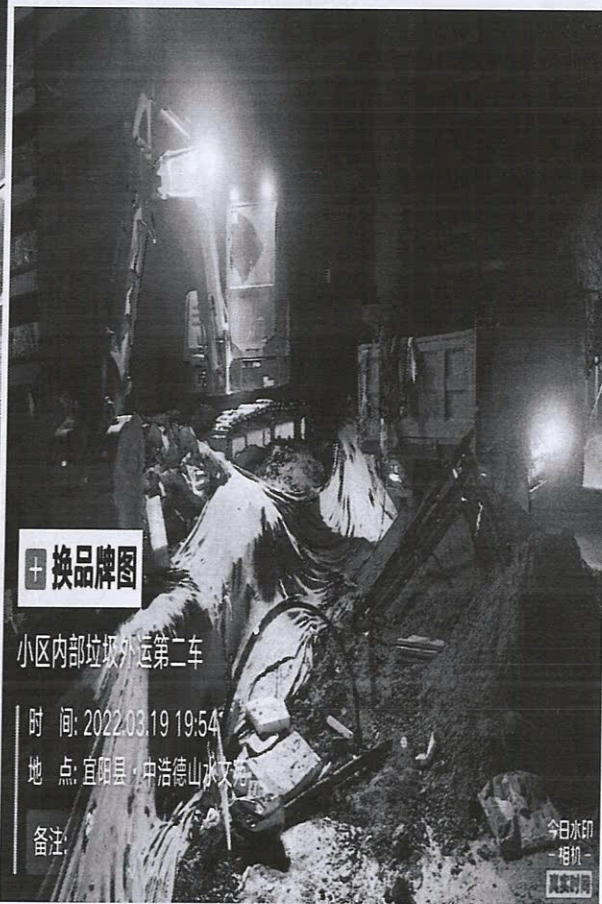



3.19 垃圾清运工作照片




3.20 垃圾清运 工作照片



3.20, 垃圾清运 工作照片

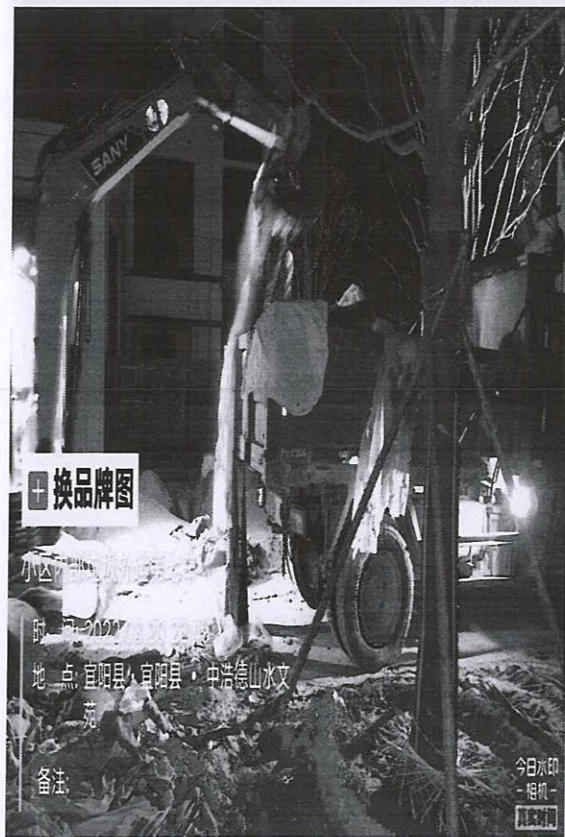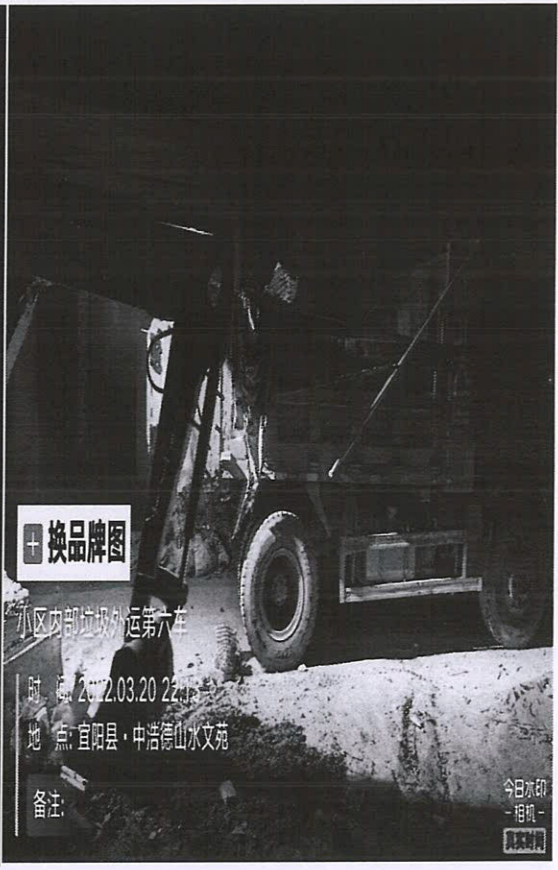

3.22 垃圾清运 工作照片

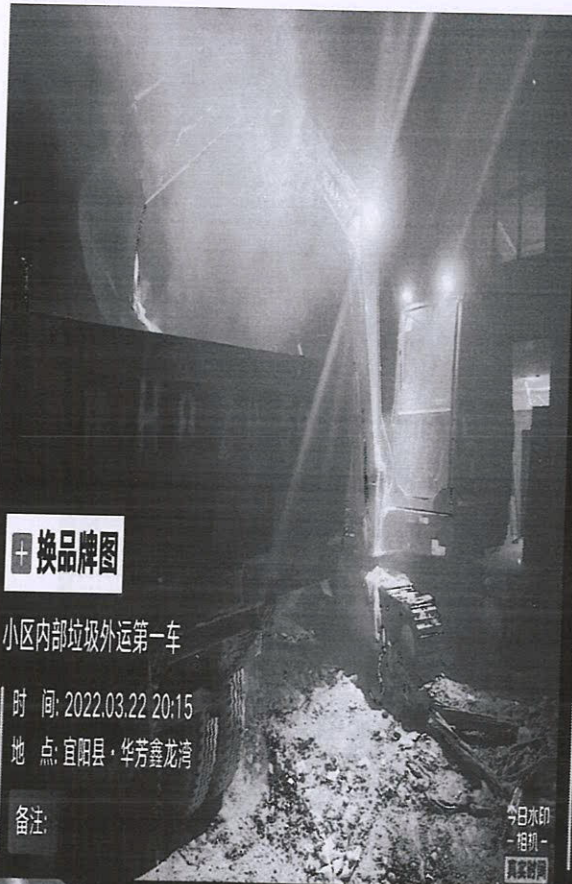

+ 换品牌图

小区内部垃圾外运第一车

时间: 2022.03.22 20:15

地点: 宜阳县·华芳鑫龙湾

备注:

今日水印
-相机-
真实时间



+ 换品牌图

小区内部垃圾外运第二车

时间: 2022.03.22 20:50

地点: 宜阳县·中浩德山水文苑

备注:

今日水印
-相机-
真实时间



+ 换品牌图

小区内部垃圾外运第三车

时间: 2022.03.22 21:44

地点: 宜阳县·滨河又一城

备注:

今日水印
-相机-
真实时间



+ 换品牌图

小区内部垃圾外运第四车

时间: 2022.03.22 21:50

地点: 宜阳县·滨河又一城


备注:

今日水印
-相机-
真实时间





3.22 垃圾清运 工作照片







3.29. 垃圾清运. 洒水车 工作照片

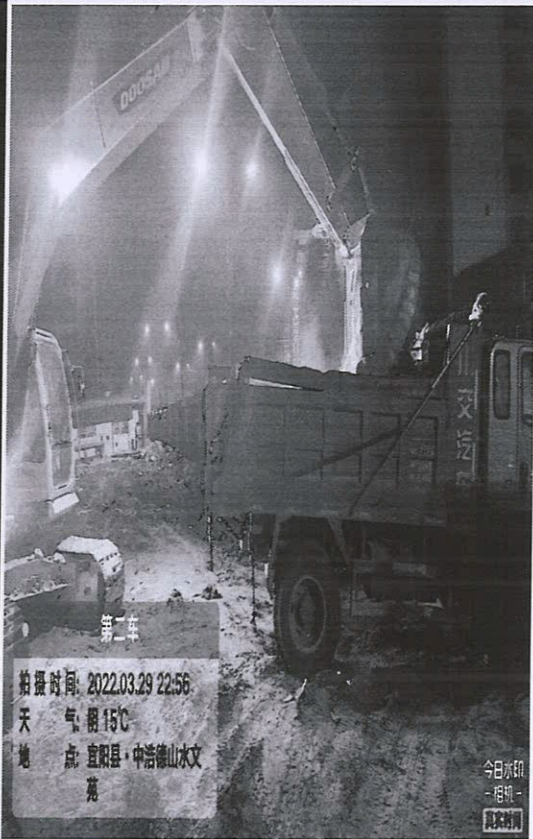



3.29 垃圾清运. 洒水车. 工作照片

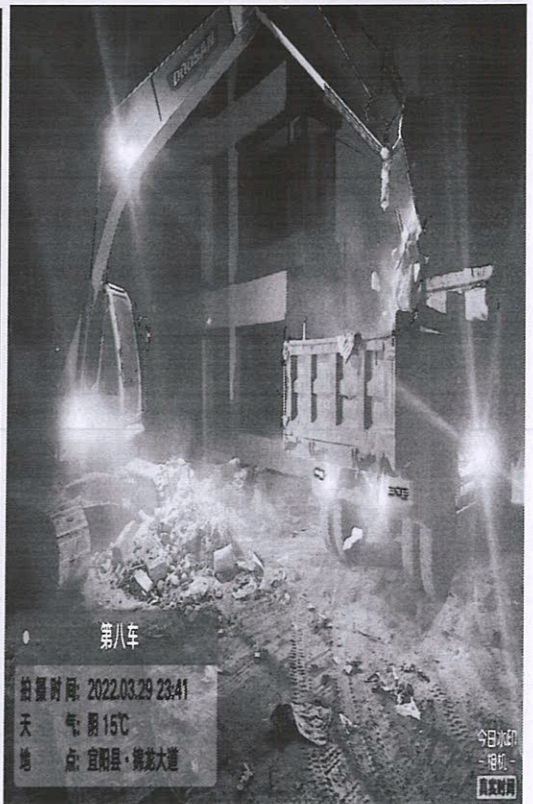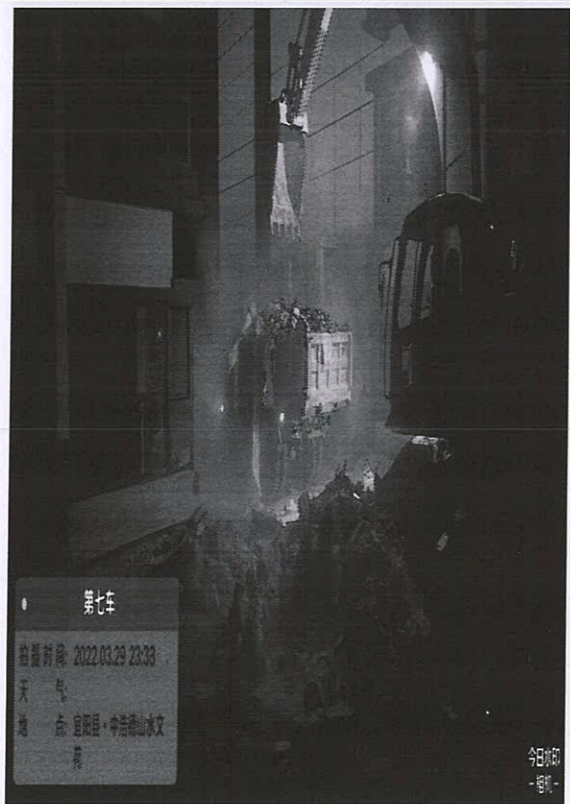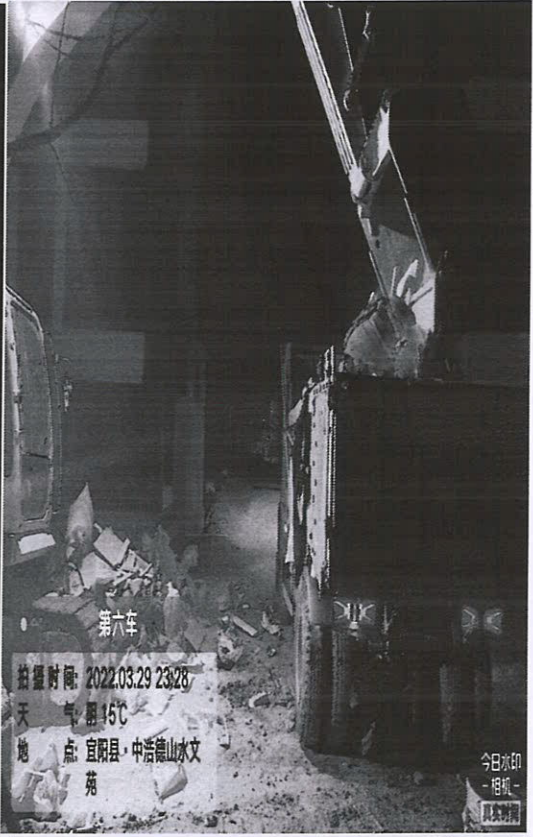


3.29. 垃圾清运洒水车 工作照片

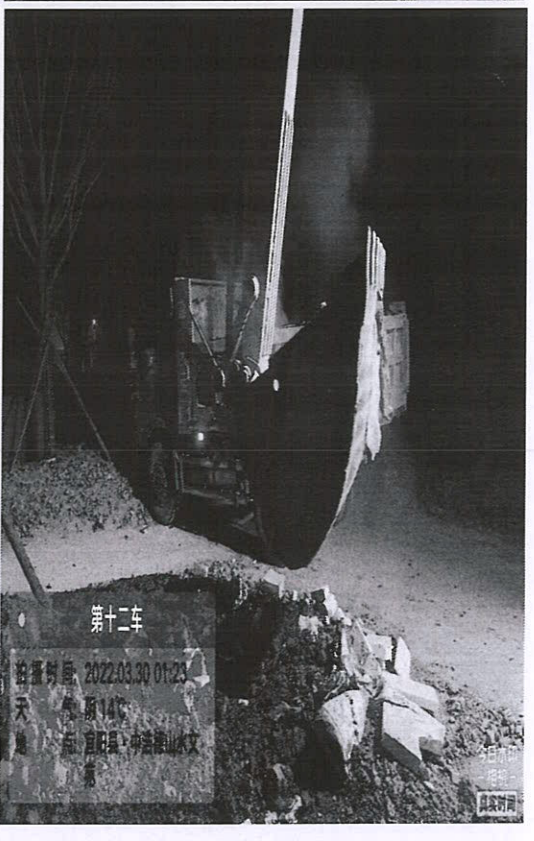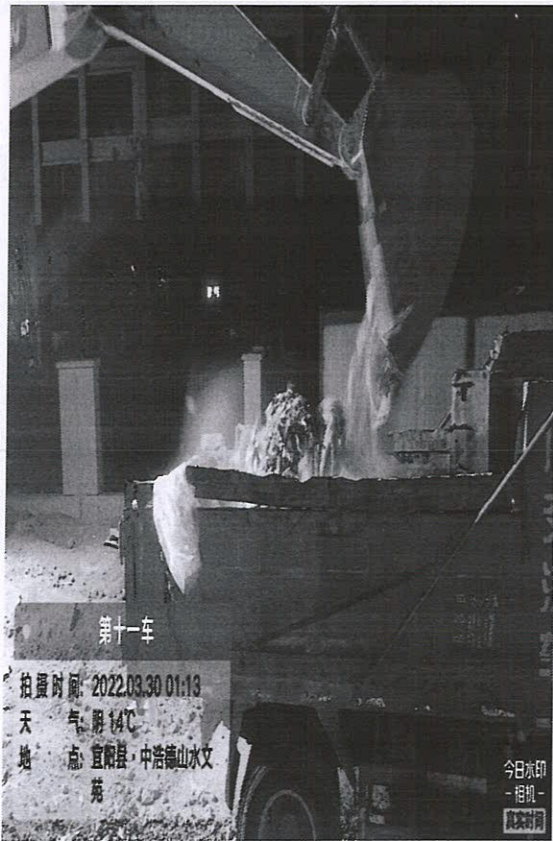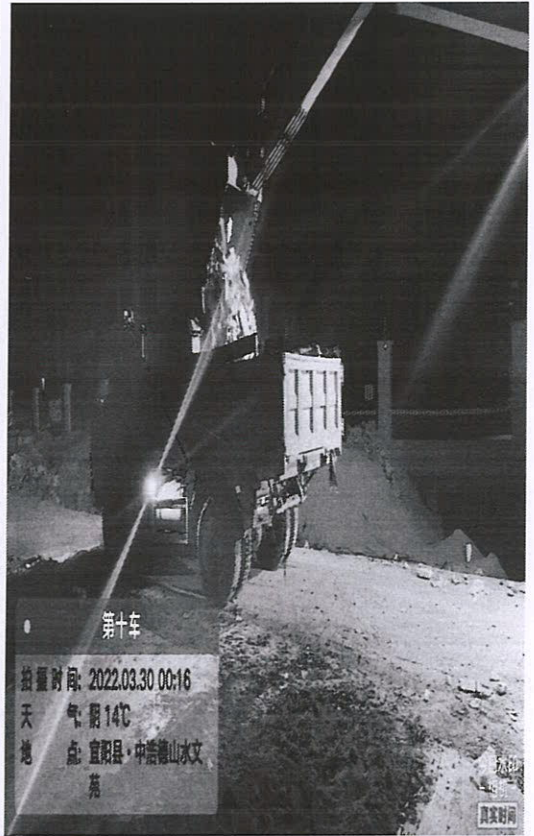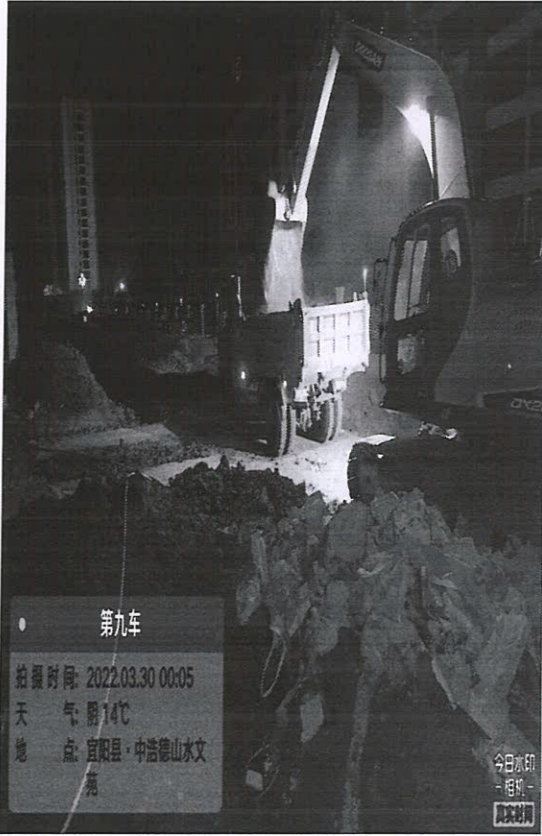



3.29. 垃圾清运. 洒水车. 工作照片

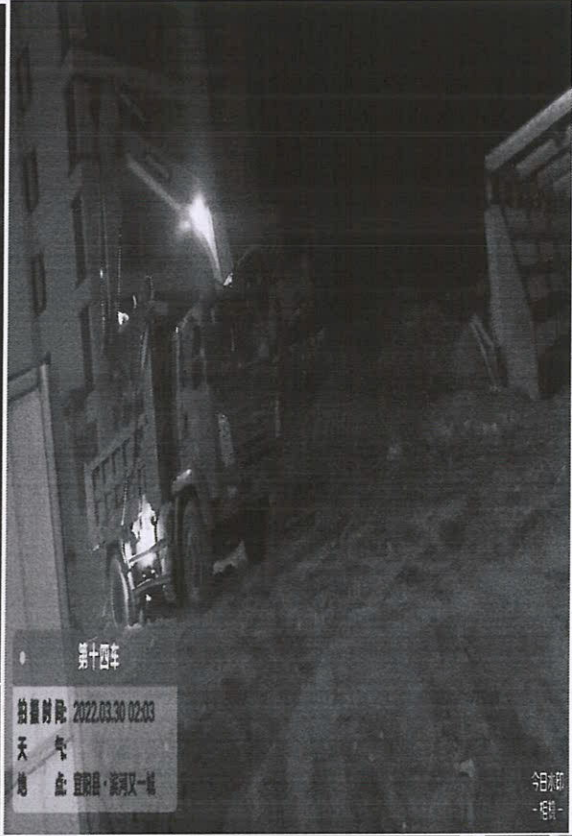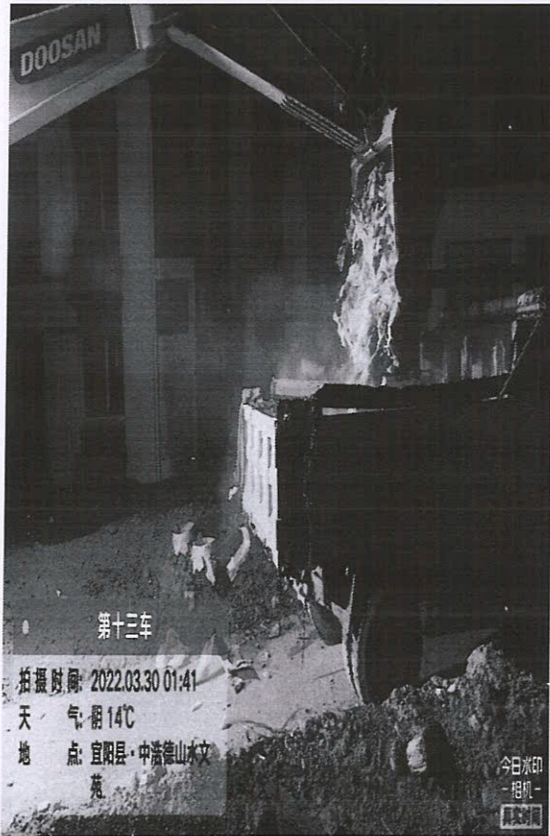

3.29. 垃圾清运, 洒水车, 工作照片

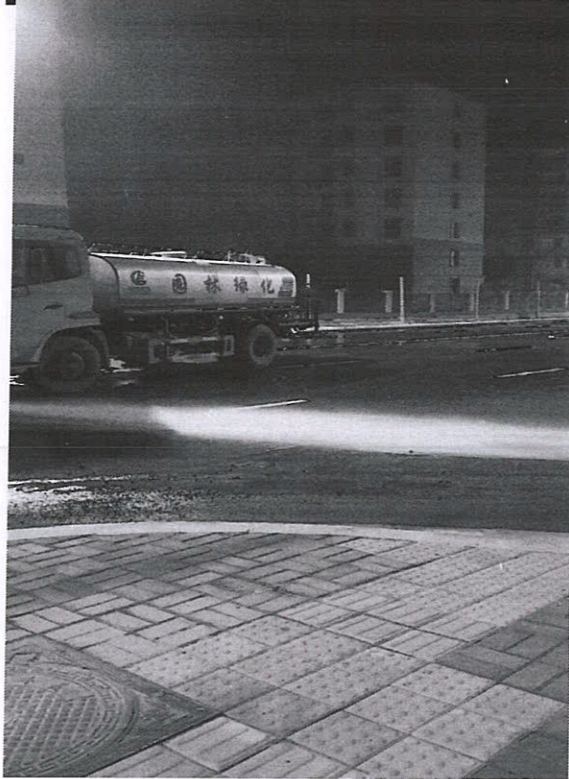




3.31. 垃圾清运工作照片

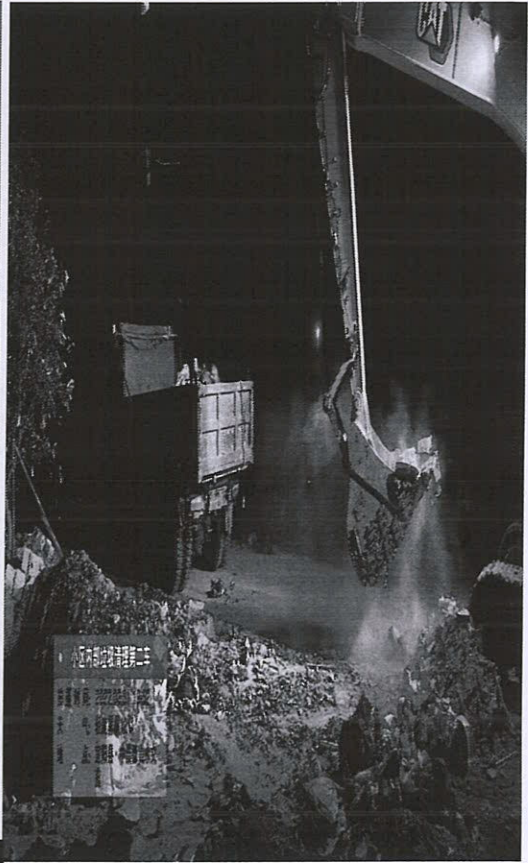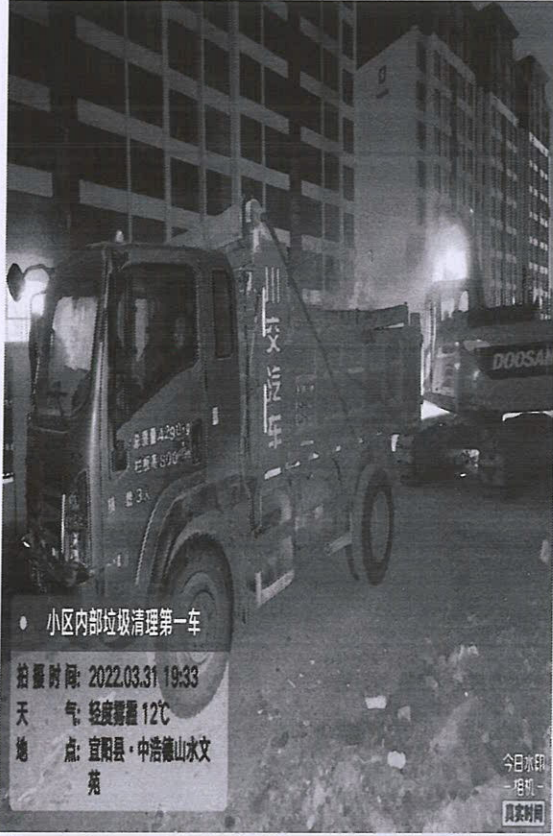

4.6 垃圾清运 工作照片




4.6 垃圾清运工作照片

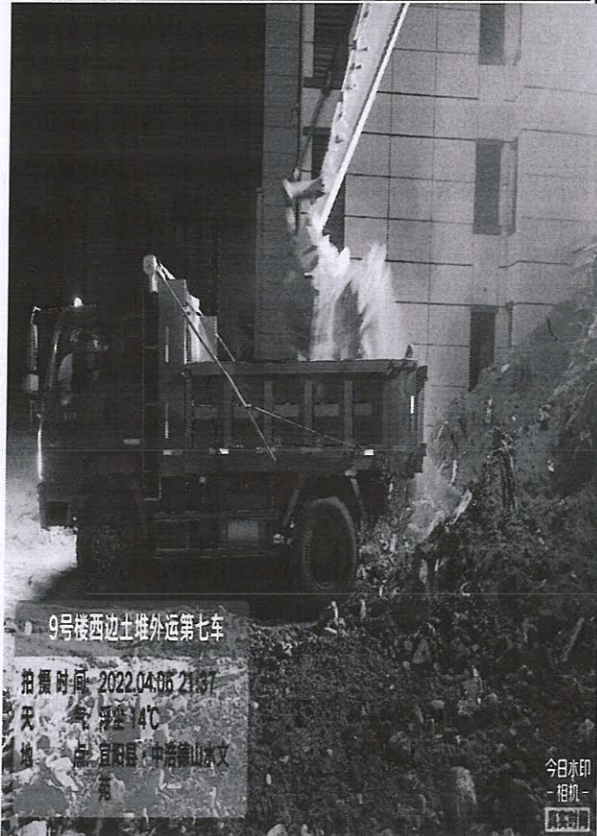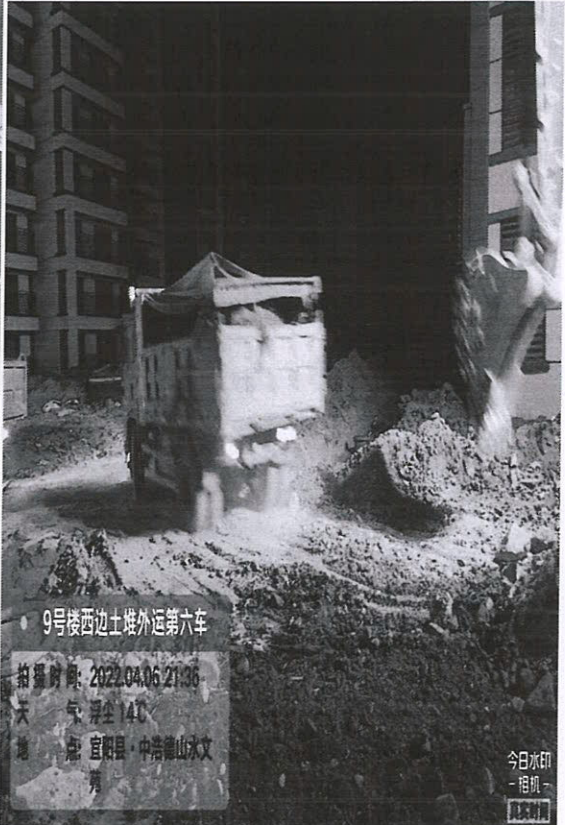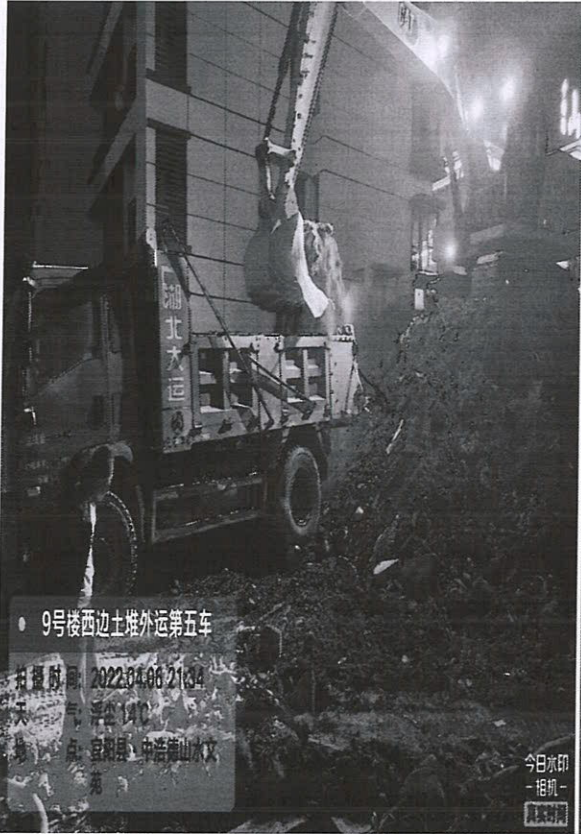




4.6 垃圾清运 工作照片




4.6 垃圾清运 工作照片

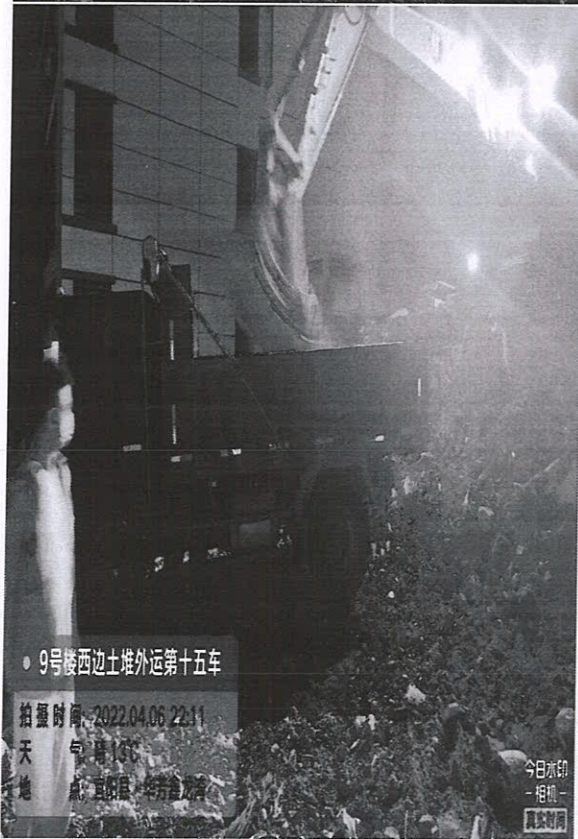


4.6 垃圾清运 工作照片

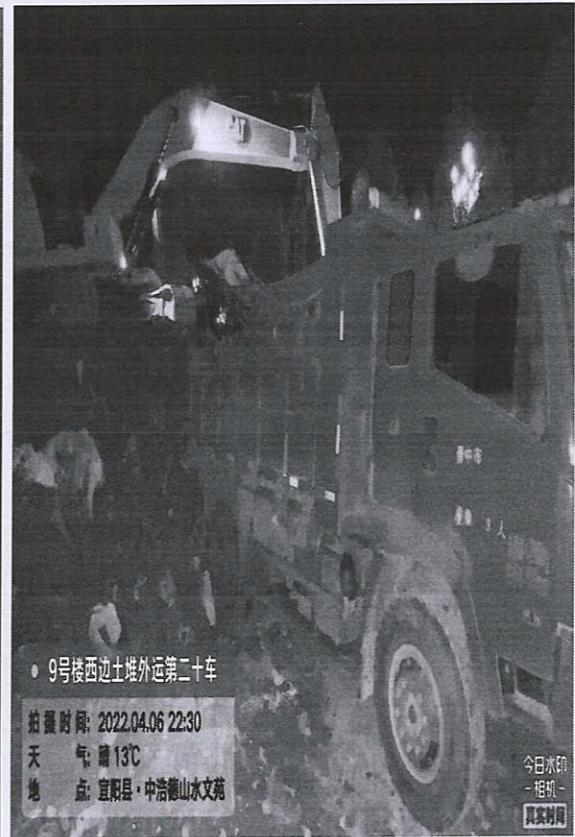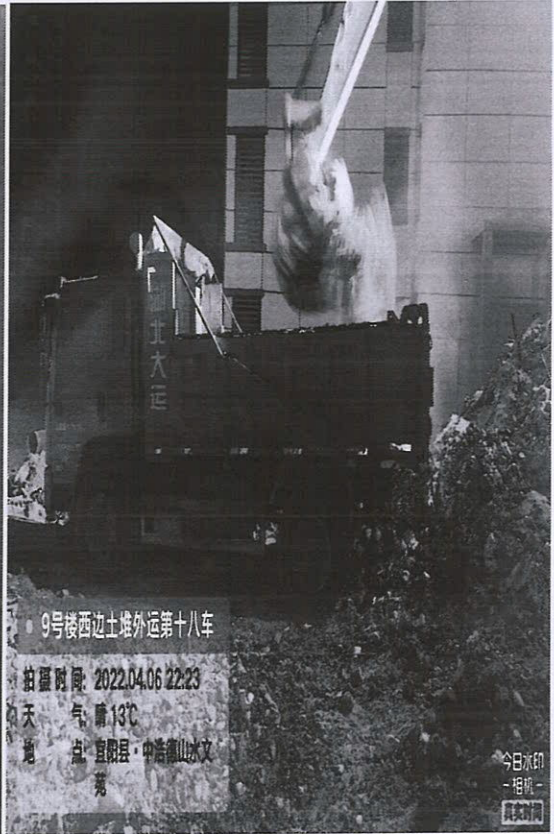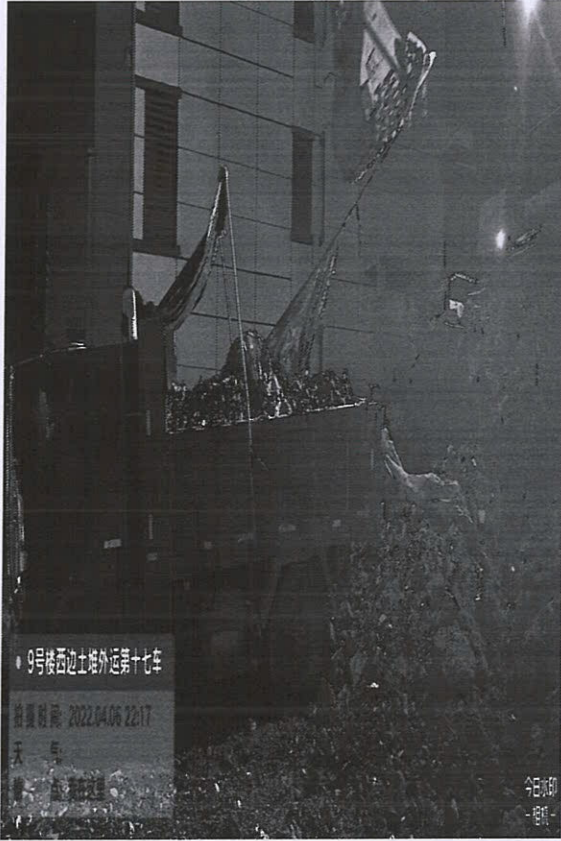


4.6 垃圾清运 工作照片

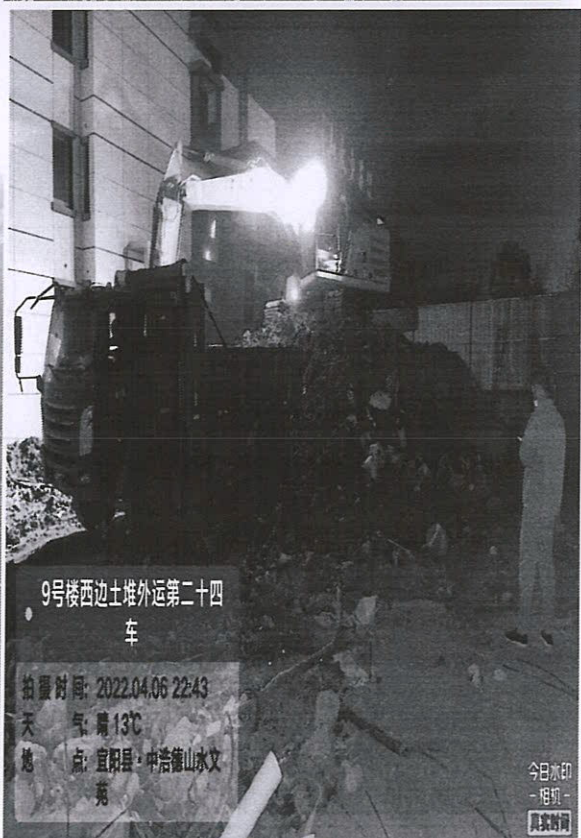

4.6 垃圾清运 工作照片

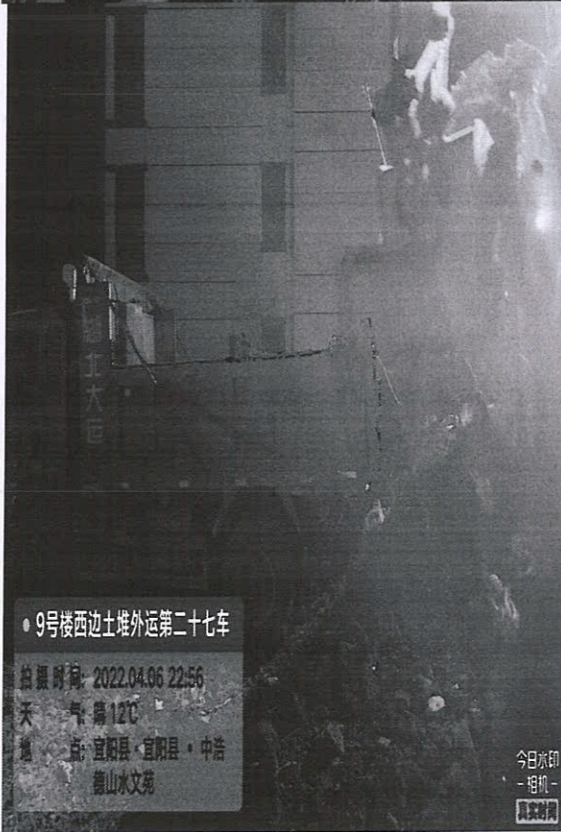

4.6 垃圾清运 工作照片

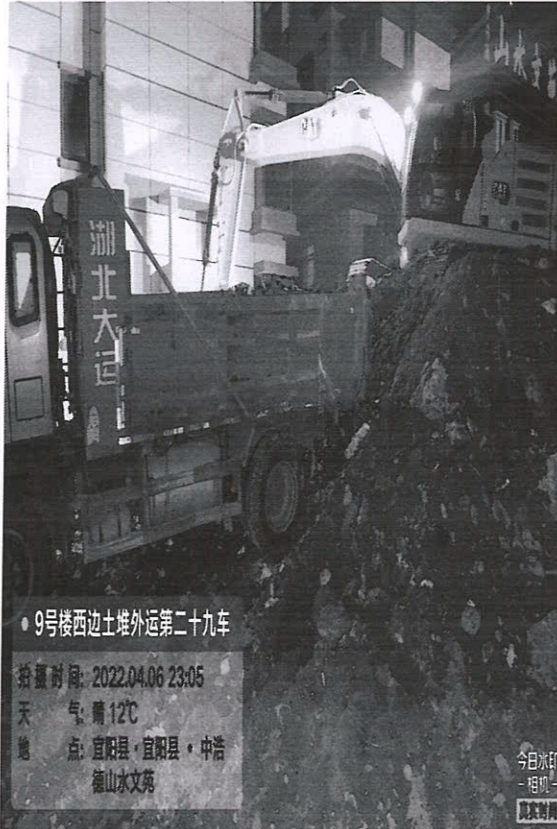

● 9号楼西边土堆外运第二十九车

拍摄时间: 2022.04.06 23:05

天气: 晴 12℃

地点: 宜阳县·宜阳县·中浩
德山水文苑

今日水印
-相机-
真实时间




● 9号楼西边土堆外运第三十车

拍摄时间: 2022.04.06 23:09

天气:

地点: 宜阳县·中浩德山水文苑

今日水印
-相机-
真实时间



● 9号楼西边土堆外运第三十一车

拍摄时间: 2022.04.06 23:10

天气: 晴 12℃

地点: 宜阳县·华芳鑫龙湾

今日水印
-相机-
真实时间




● 9号楼西边土堆外运第三十二车

拍摄时间: 2022.04.06 23:14




地点: 宜阳县·华芳鑫龙湾

今日水印
-相机-
真实时间

4.6. 垃圾清运 工作照片

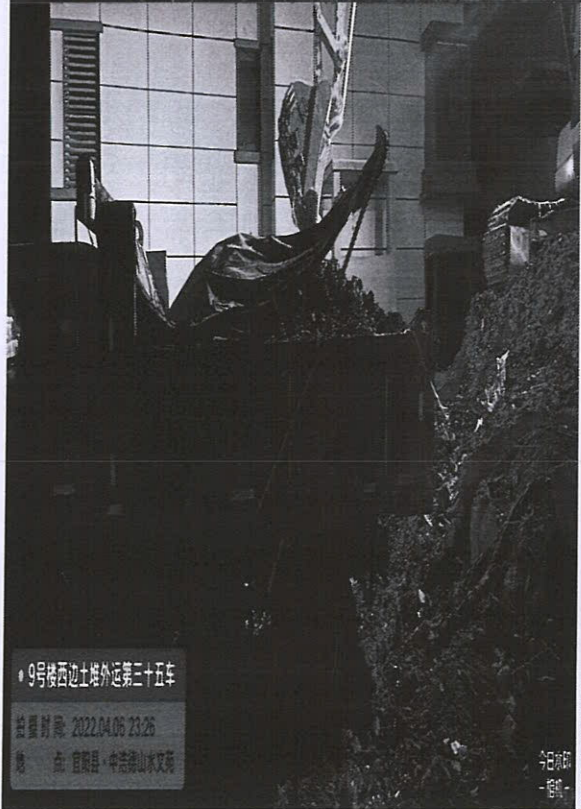

46. 垃圾清运、工作照片

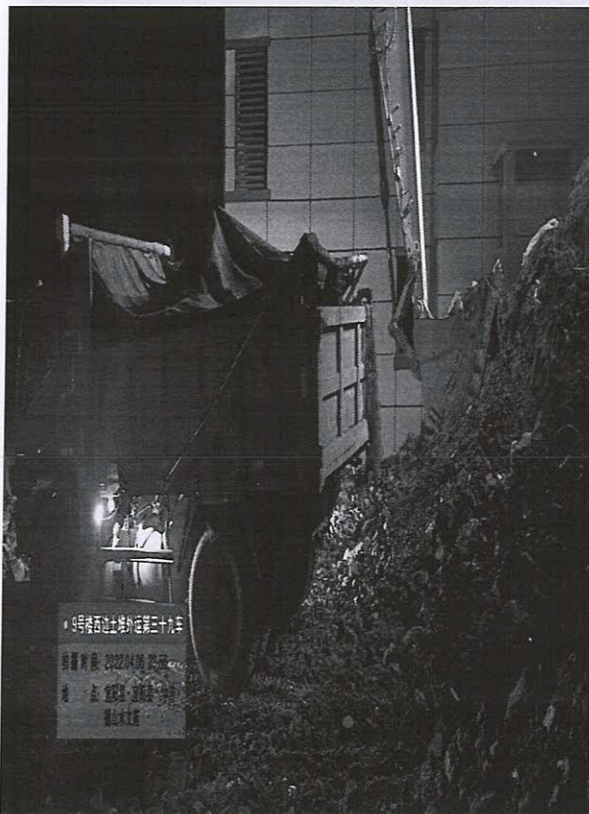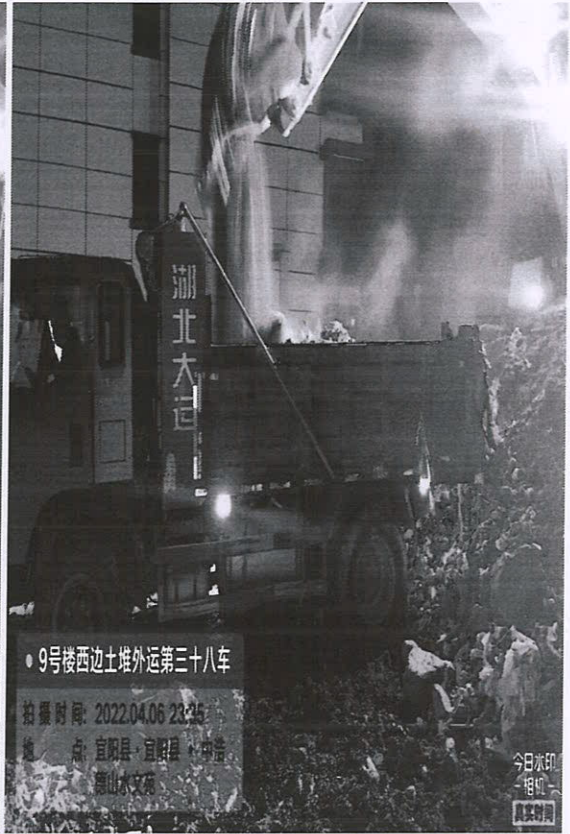


东6 垃圾清运. 工作照片



13号楼北边生活区水池清运第一车
 拍摄时间: 2022.04.06 20:09
 天气: 浮尘 17℃
 地点: 宜阳县·中浩德山水文苑
 今日水印
 -相机-
 真实时间



13号楼北边生活区水池清运第二车
 拍摄时间: 2022.04.06 20:23
 天气: 浮尘 16℃
 地点: 宜阳县·中浩德山水文苑
 今日水印
 -相机-
 真实时间

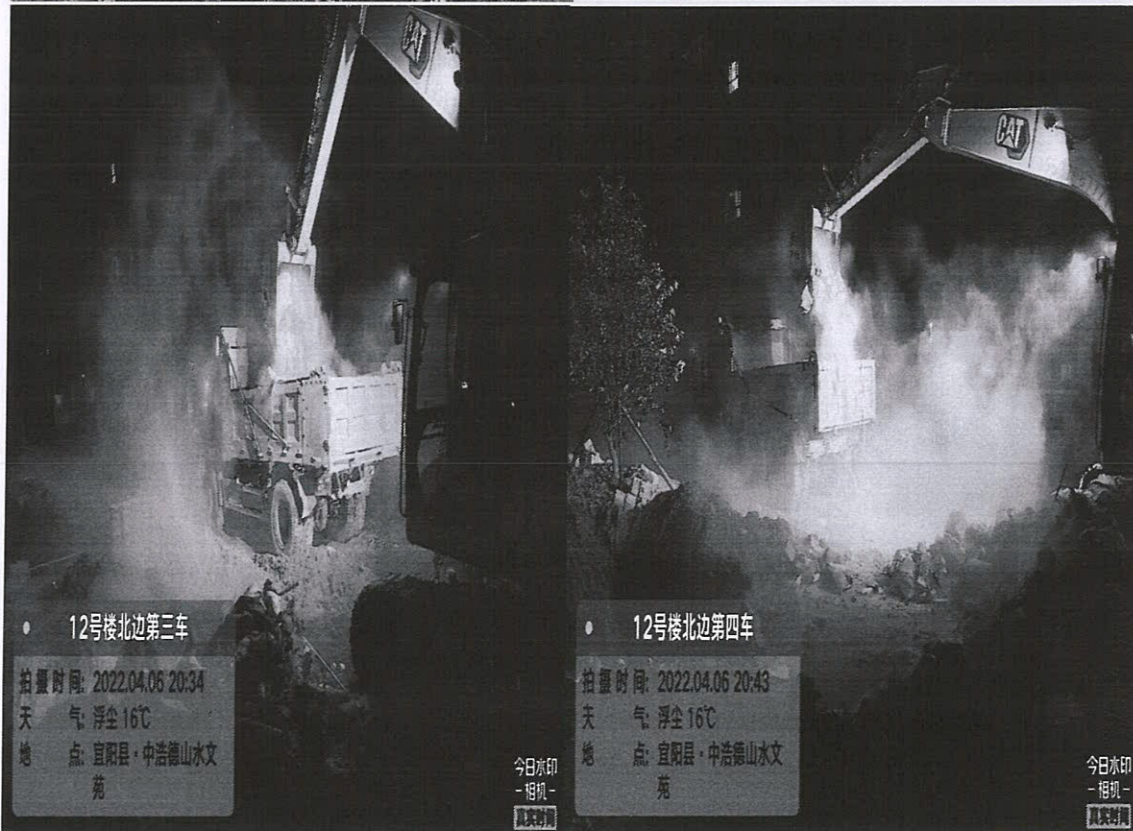



12号楼北边第三车
 拍摄时间: 2022.04.06 20:34
 天气: 浮尘 16℃
 地点: 宜阳县·中浩德山水文苑
 今日水印
 -相机-
 真实时间

12号楼北边第四车
 拍摄时间: 2022.04.06 20:43
 天气: 浮尘 16℃
 地点: 宜阳县·中浩德山水文苑
 今日水印
 -相机-
 真实时间


4.7. 垃圾清运 工作照片

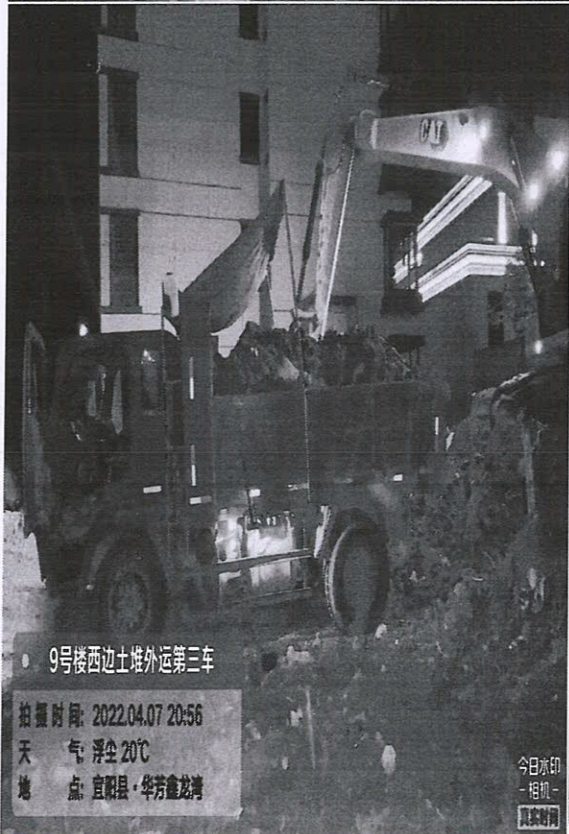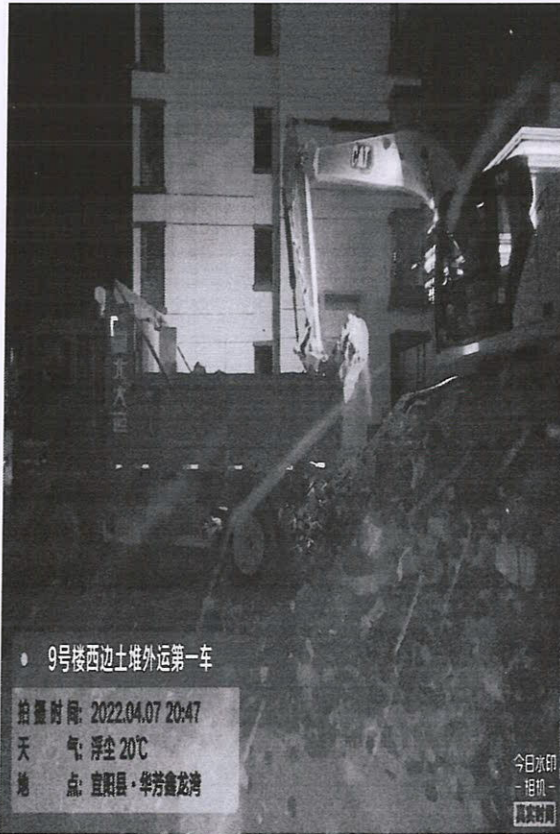


4.7 垃圾清运 工作照片

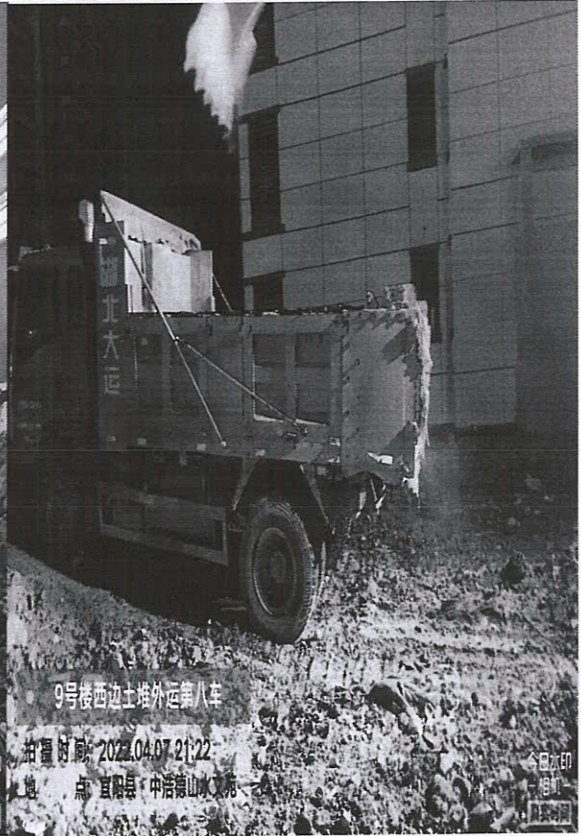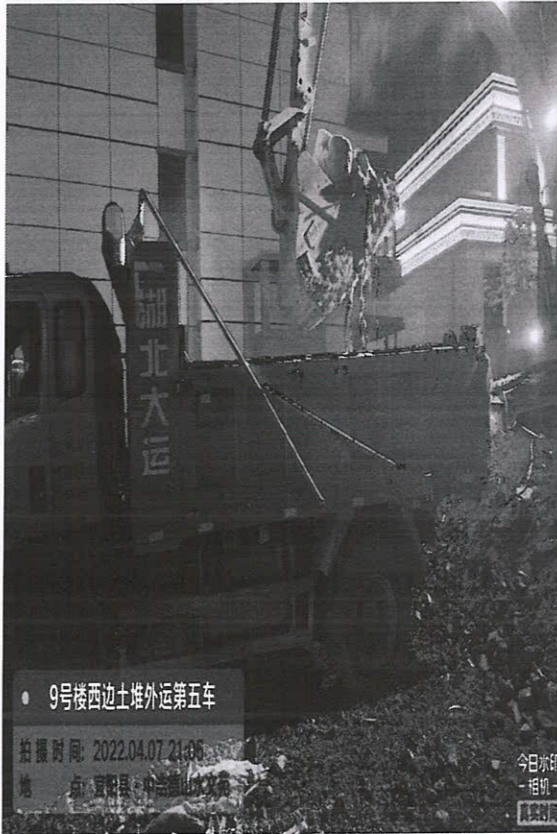


4.7 垃圾清运 工作照片

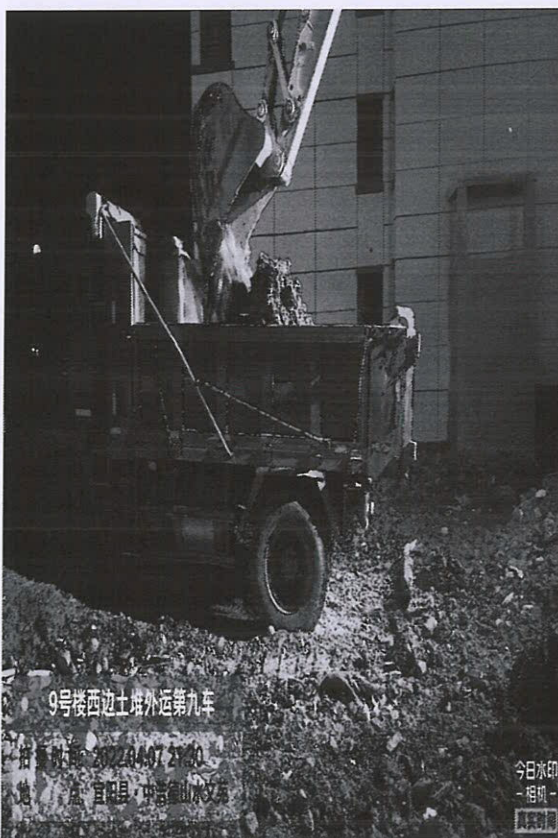



4.7. 垃圾清运工作照片

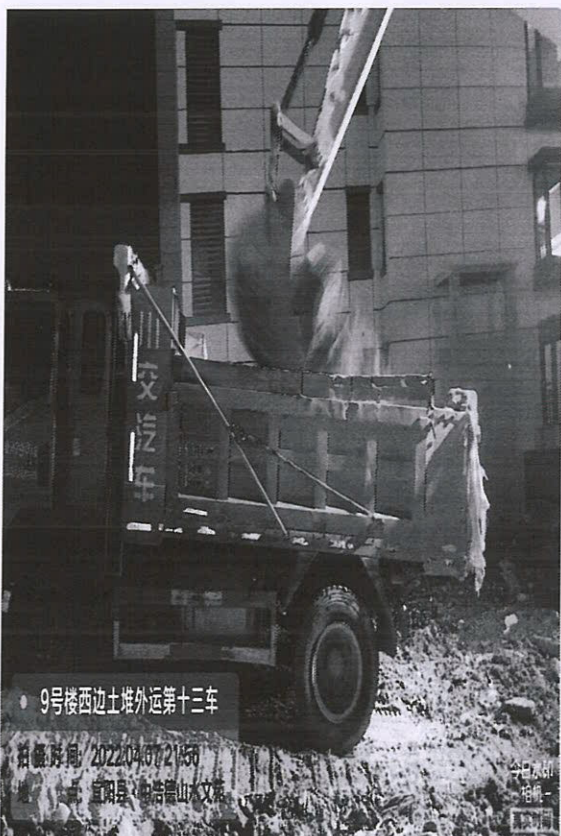

4.7 垃圾清运 工作照片

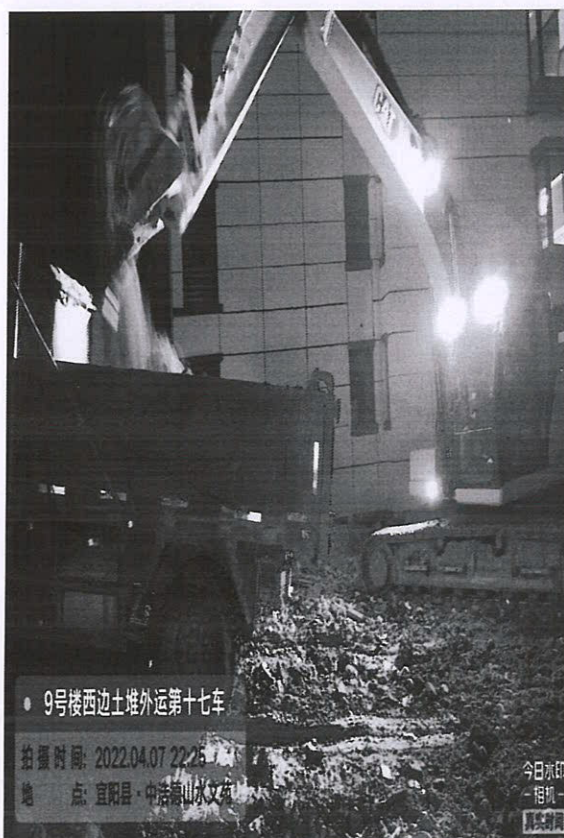

4.7. 垃圾清运 工作照片

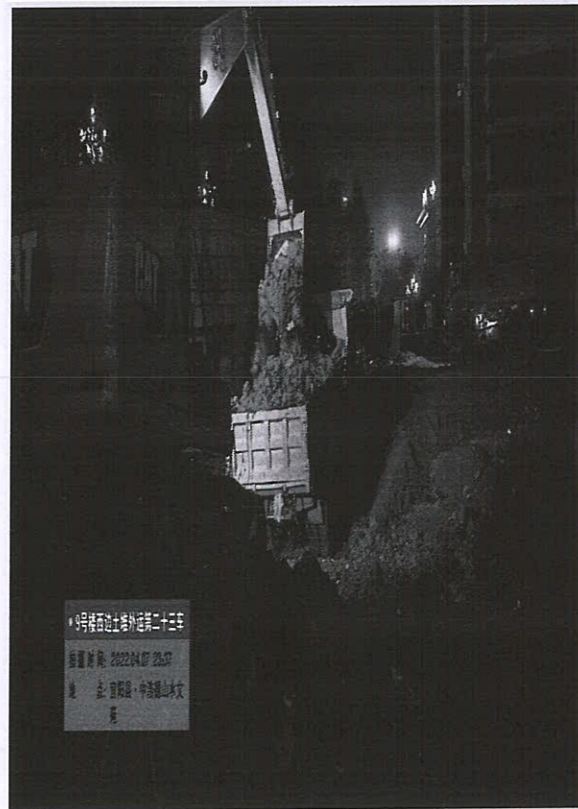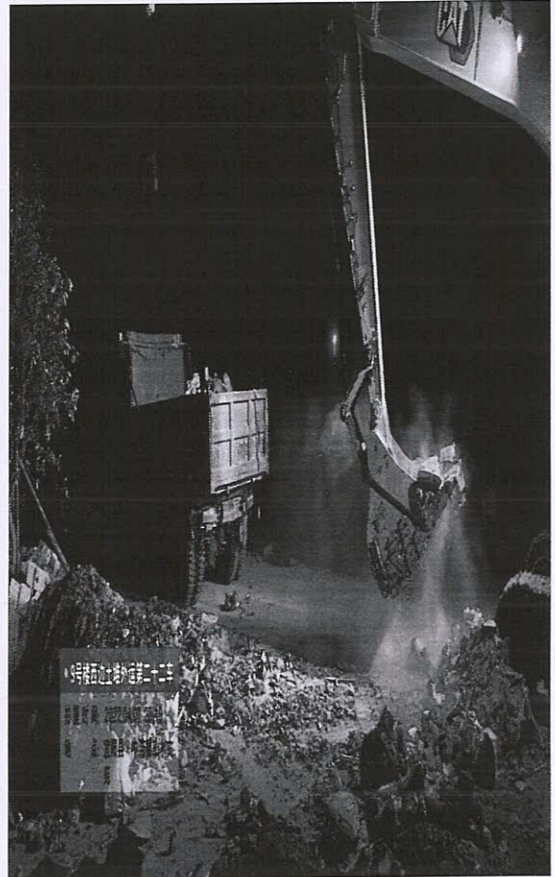


4.7 垃圾清运工作照片




东大门垃圾清理第一车
拍摄时间: 2022.04.07 19:56
天气: 晴 21℃
地点: 宣阳县·中溪翰山水文苑

今日水印
相机
真实时间

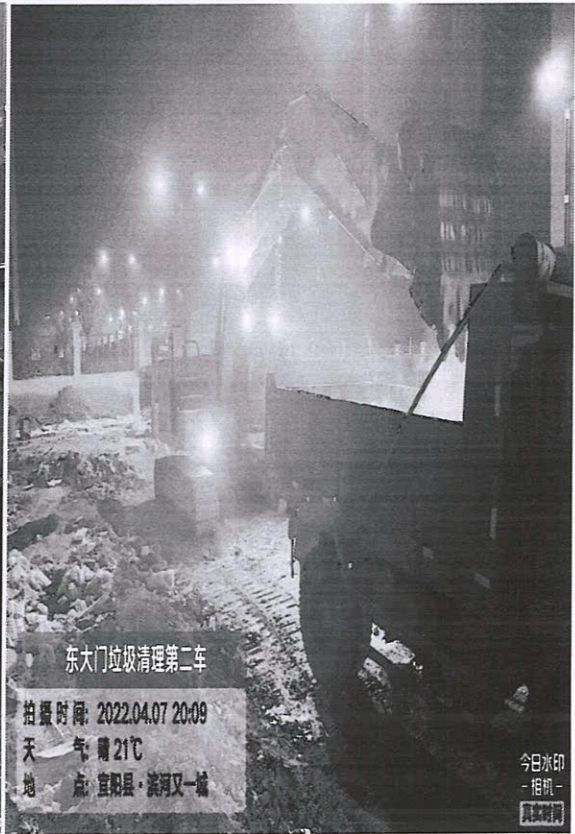

东大门垃圾清理第二车
拍摄时间: 2022.04.07 20:09
天气: 晴 21℃
地点: 宣阳县·滨河又一城




今日水印
相机
真实时间

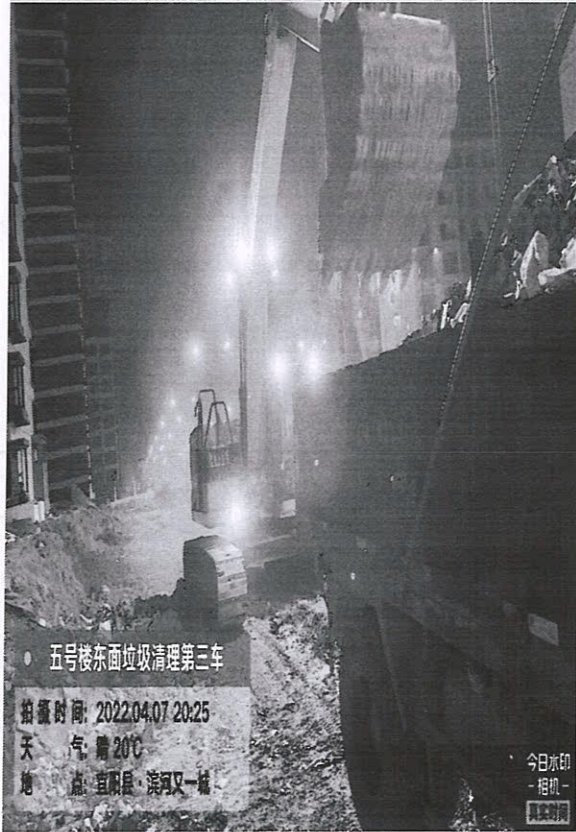




五号楼东面垃圾清理第三车
拍摄时间: 2022.04.07 20:25
天气: 晴 20℃
地点: 宣阳县·滨河又一城

今日水印
相机
真实时间




4.8 垃圾清运 工作照片

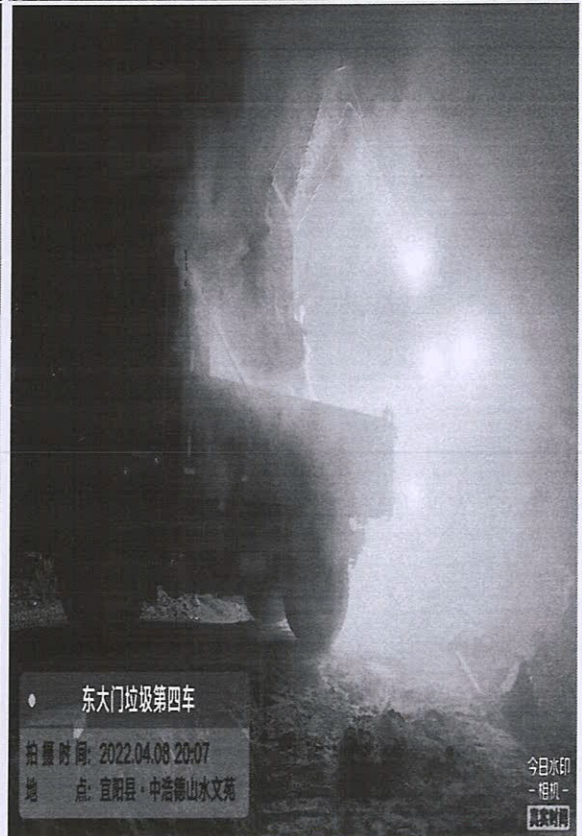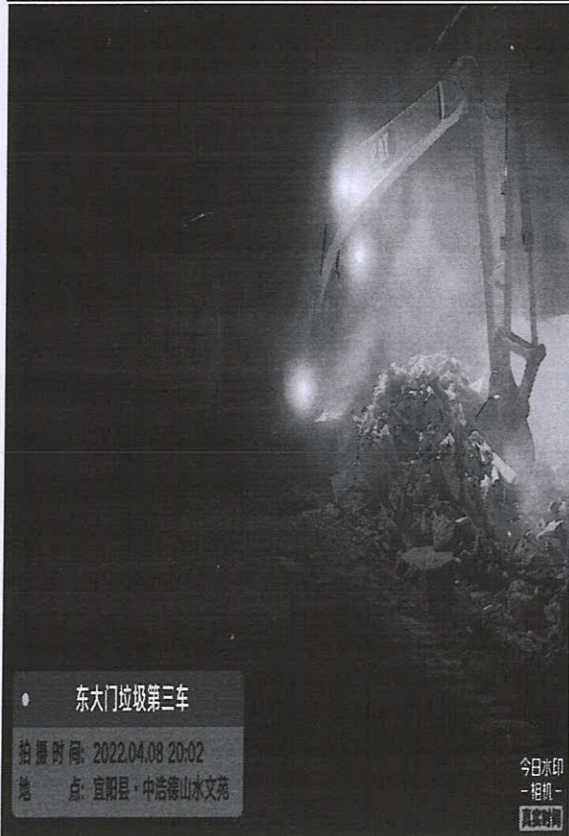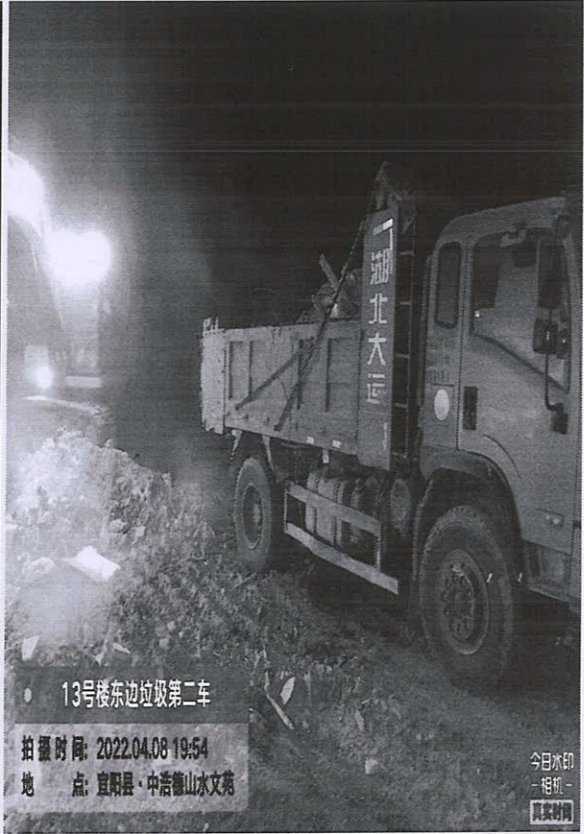

4.8 垃圾清运工作照片

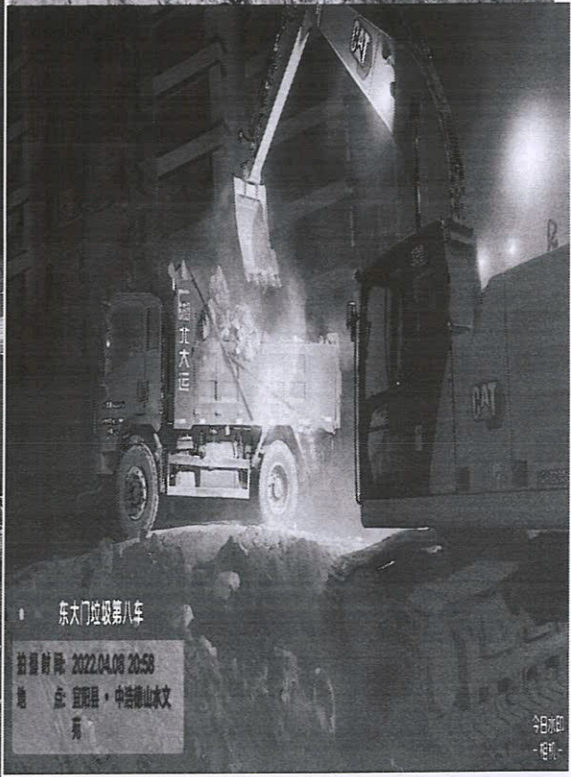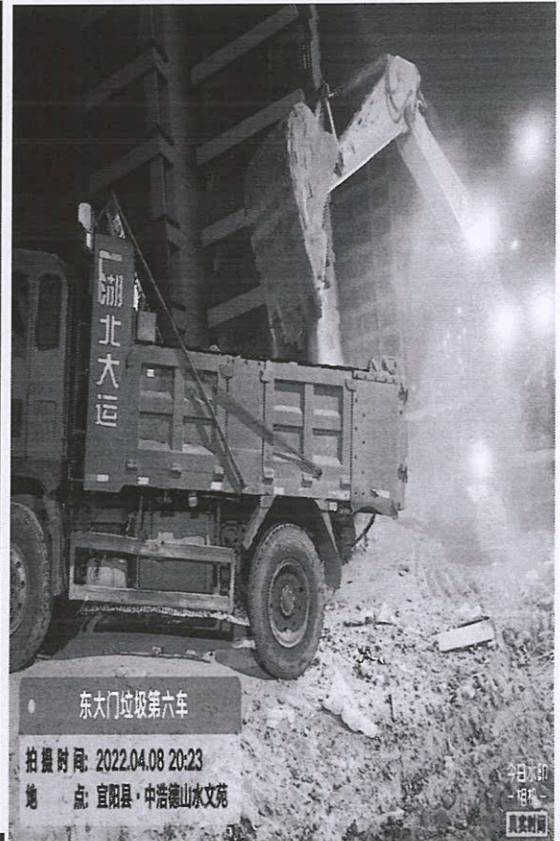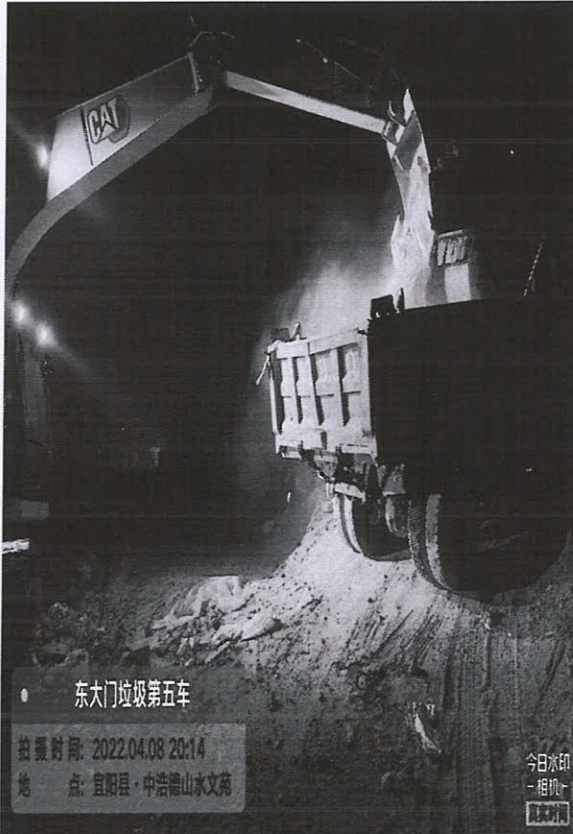

4.9 . 垃圾清运 工作照片

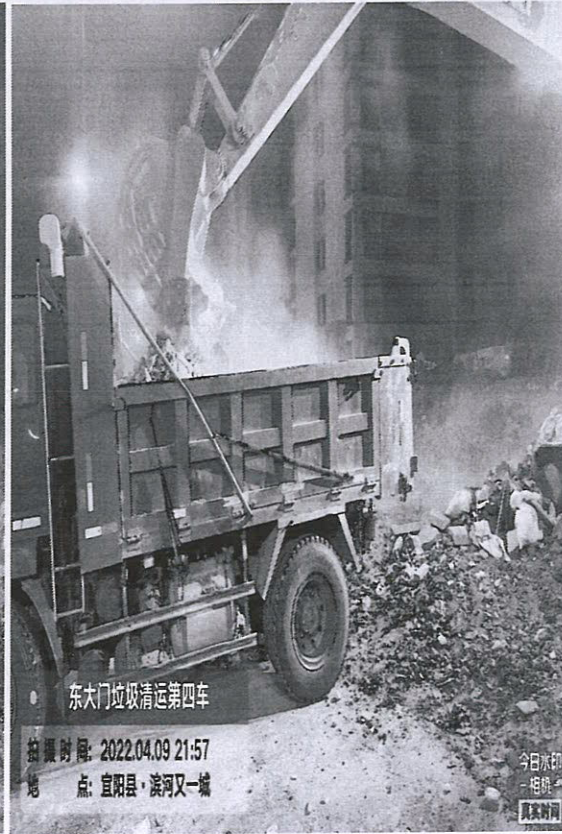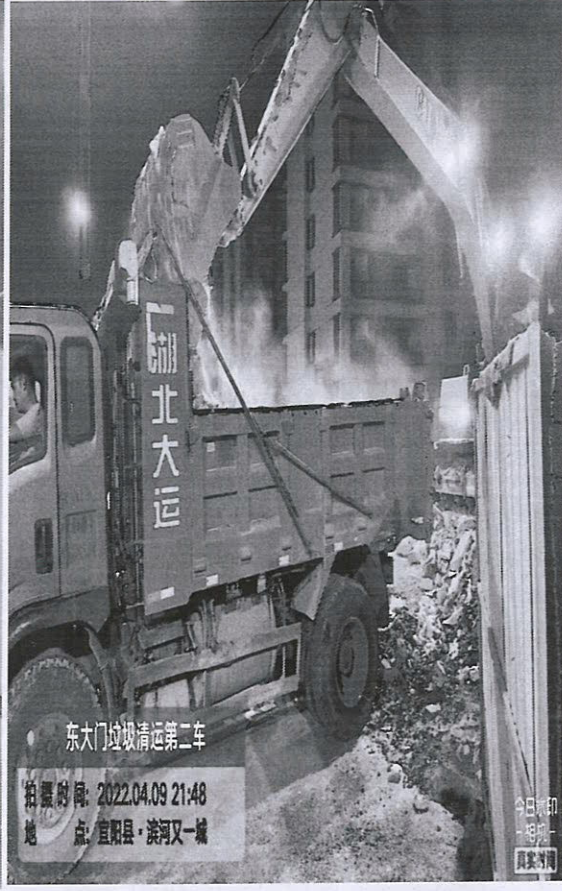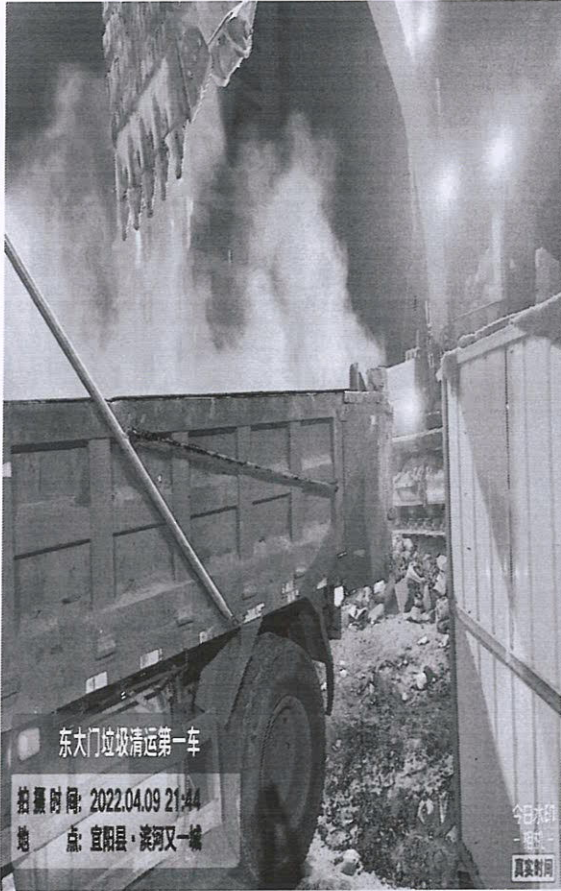

项目清单

项目	工程量	单价 (元)	总价 (元)	备注
017 10#水井房开洞	10	85.96	859.6	
018东大门新建围挡	35	171.9	6016.5	
019东围挡草皮	404.275	13	5255.575	
020南大门更换草皮	71.3	13	926.9	
021母线洞扩洞	140	127	17780	
022风机设备基础	13.2	1150	15180	
023广告牌	30.96	45	1393.2	
024南大门				
1. 围挡拆除	31	19.5	604.5	
2. 新建围挡	27.5	171.9	4727.25	
3. 草皮铺设	55	13	715	
025机房承重墩	4.6128	300	1383.84	
026混凝土破除				
	1389.87	137.6	191246.112	
	17.05	206.4	3519.12	
	371.55	68.8	25562.64	
			220327.872	
027垃圾清运				
人工	165	100	16500	

146

项目清单

项目	工程量	单价 (元)	总价 (元)	备注
60钩机	4	986.55	3946.2	
240钩机	6	2400	14400	
垃圾车	133	370.5	49276.5	
洒水车	1	500	500	
			84622.7	
合计			359792.937	
