

洛宁山水文苑项目临电工程施工合同 结算汇总表

合同编号：LNSSWY-QQ-010

合同金额：450000元

合同名称：洛宁山水文苑项目临电工程

甲方：洛阳浩德浩康置业有限公司

乙方：陕西中电联电力有限公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算金额				415000.00
1.1	结算价				415388.51
1.2	变更				0.00
1.3	签证				0.00
1.4	协商优惠金额				-388.51
二	其他费用合计				0.00
2.1	扣减税差				0.00
三	工程结算金额	(小写)	415,000.00元		
		(大写)	RMB肆拾壹万伍仟		
四	应扣甲供材合计			0.00元	
4.1	甲供材料一			0.00	
4.2	甲供材料二			0.00	
五	应扣水电费合计			0.00元	
5.1	水费			0.00	
5.2	电费			0.00	
六	工程最终付款金额	(小写)	415,000.00元		
		(大写)	RMB肆拾壹万伍仟		
七	工程最终发票金额	(小写)	415,000.00元		
		(大写)	RMB肆拾壹万伍仟		

甲方代表：段吴平

乙方代表：胡世峰

日期：2022.10.17

日期：2022.10.17



洛宁山水文苑项目临电工程施工合同
结算明细汇总表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	合同工程量	现场实际工程量	应扣工程量	金额 (元)		备注
							综合单价	合价	
1	砌筑井	1. 手工井	座	1	0	-1	1340.2	-1340.2	
2	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 镀锌扁钢 3. 型号: 40*3	m	50			-29.21	-1460.50	综合单价调整
3	电力电缆	1. 名称: 高压电缆 2. 型号: YJLV22-8.7/10kv-3*70mm ² 3. 材质: 铝芯 4. 敷设方式、部位: 直埋式 5. 电压等级 (kV): 10kv 6. 铺砂盖砖	m	450	217	-233	85.62	-19949.46	
4	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC110 4. 配置形式: 埋地敷设	m	450	195	-255	38.39	-9789.45	
5	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 深度: 2m以内	m ³	216	156.24	-59.76	6.82	-407.56	
6	回填方	1. 土方回填 2. 夯填	m ³	216	156.24	-59.76	27.85	-1664.32	
7	未施工项扣款小计		元					-34611.49	
8	合同金额		元					450000.00	
9	合计		元					415388.51	
10	协商优惠金额		元					-388.51	
11	最终协商结算金额		元					415000.00	



乙方代表: 胡世峰
日期: 2022.10.17

甲方代表: 穆安平
日期: 2022.10.17

工程竣工结算申请报告

洛阳浩德浩康置业有限公司：

兹有我司与贵司签订的《洛宁山水文苑项目临电工程施工合同 LNSSWY-QQ-010》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 450000 元；合同执行过程中发生签证 0 份，增加造价为 0 元；合同执行过程中发生设计变更 0 份，增（减）造价为 0 元。

合同增加造价合计为 0 元，申报合同结算造价为 415388.51 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2022 年 7 月 15 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 332310.81 元（大写：叁拾叁万贰仟叁佰壹拾元捌角壹分）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：胡世锋

手机号码：13949233799

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

结算通知书

陕西中电联电力有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：LNSSWY-QQ-010的《洛宁山水文苑项目临电工程施工合同》，目前贵司已完成洛宁山水文苑项目临电工程施工合同，我司同意贵司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

- 1、要求贵公司在 2022 年 08 月 25 日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在 2022 年 08 月 25 日之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；
- 2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《工程结算审核申请书》于 2022 年 08 月 25 日前提交我司工程部门签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
- 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

- 1、结算通知书 2、结算申请单 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、合作方报送的结算资料

施工单位签收人签字：

胡世辉

项目总签发：

陈明友

工程总签发：

马志丹

年 月 日

工程结算资料核对确认表

项目名称	洛宁山水文苑项目临电施工合同		核对时间	2022.08.25
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1份		
2	结算申请报告	1份		
3	工程验收单	1份		
4	帐目往来明细	1份		
5	水电费清单	1份		
6	施工合同	1份		
7	工程量清单	1份		
8	竣工图纸	1套		
相关部门签字栏	施工单位:  (签字盖章) 	项目工程部: (签字盖章) 	成本部门:  (签字盖章)	

- 注：1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

授权委托书

致：洛阳浩德浩康置业有限公司

本人胡世锋系陕西中电联电力有限公司的法定代表人，现委托胡世锋为我方代理人，并以本公司的名义办理 洛宁山水文苑项目临电 工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：陕西中电联电力有限公司（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）



单项工程验收单 (分包)

2021年12月21日

合同名称	洛宁山水文苑项目临电工程施工合同		
施工单位	陕西中电联电业有限公司		
建设单位	美阳洛德洛康置业有限公司		
工程开工日期	2021年11月20日	工程竣工日期	2021年12月10日
工程内容: 630kVA箱变供电系统工程, 涉及630kVA箱变2台, 电缆YJV22-3*70mm ² -1*50mm ² 敷设410米, 架空绝缘导线JL1G行-70mm ² 架设210米, 水泥杆2根, 杆上安装有跌落式熔断器, 户室配电箱1台, 智能断路器1台, 剩余电流动作保护装置1台, 所有接地电阻不大于4Ω, 合变断路器试验, 绝缘电阻合格。 验收结论: 现场测量电缆: YJV22-3*70mm ² -1*50mm ² 长度为217米, 电缆两端长度195米, 镀锌扁钢40*3mm, 其它工程量与合同相符, 施工质量合格, 验收合格, 12月7日送电完成, 工程并未验收。			

工程评价结果: 在评价结果后打√



1	工期: A: 超计划天数	B: 未超计划√			
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合√	符合√	符合√	符合√	符合√
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
3	质量: A: 优良	C: 不合格			
	安全: A: 未出事故√	B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故			
4	现场: A: 整洁、无浪费√	B: 出现轻微浪费 C: 差			

验收单位

施工单位验收人员签字或盖章	李阳 2021.12.21	
监理单位验收人员签字或盖章	郑俊岭 2021.12.21	
建设单位参建各方验收人员签字或盖章		
工程部	设计部	成本部
白行博		段笑阳
		2021.12.21

工程往来账目明细

合同名称：洛宁山水文苑项目临电工程施工合同

合同编号：LNSSWY-QQ-010

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2022. 1. 14	332, 310. 81	332310. 81	415388. 51	9%	
小计					

甲方财务：张巧巧

乙方财务：

(单位盖章)



洛宁山水文苑项目水电费结清证明

洛阳浩德浩康置业有限公司：

陕西中电联电力有限公司 承建的洛宁山水文苑项目 洛宁山水文苑项目临电工程 已全部施工完成，并验收通过，期间所发生的水、电费已全部结清。

特此说明！

施工单位签章：



水电提供单位签章：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "张明敏".

建设单位项目部签章：


A handwritten signature in black ink, appearing to be "李洪".

日

期：

2021.8.20

洛宁山水文苑项目临电工程施工图

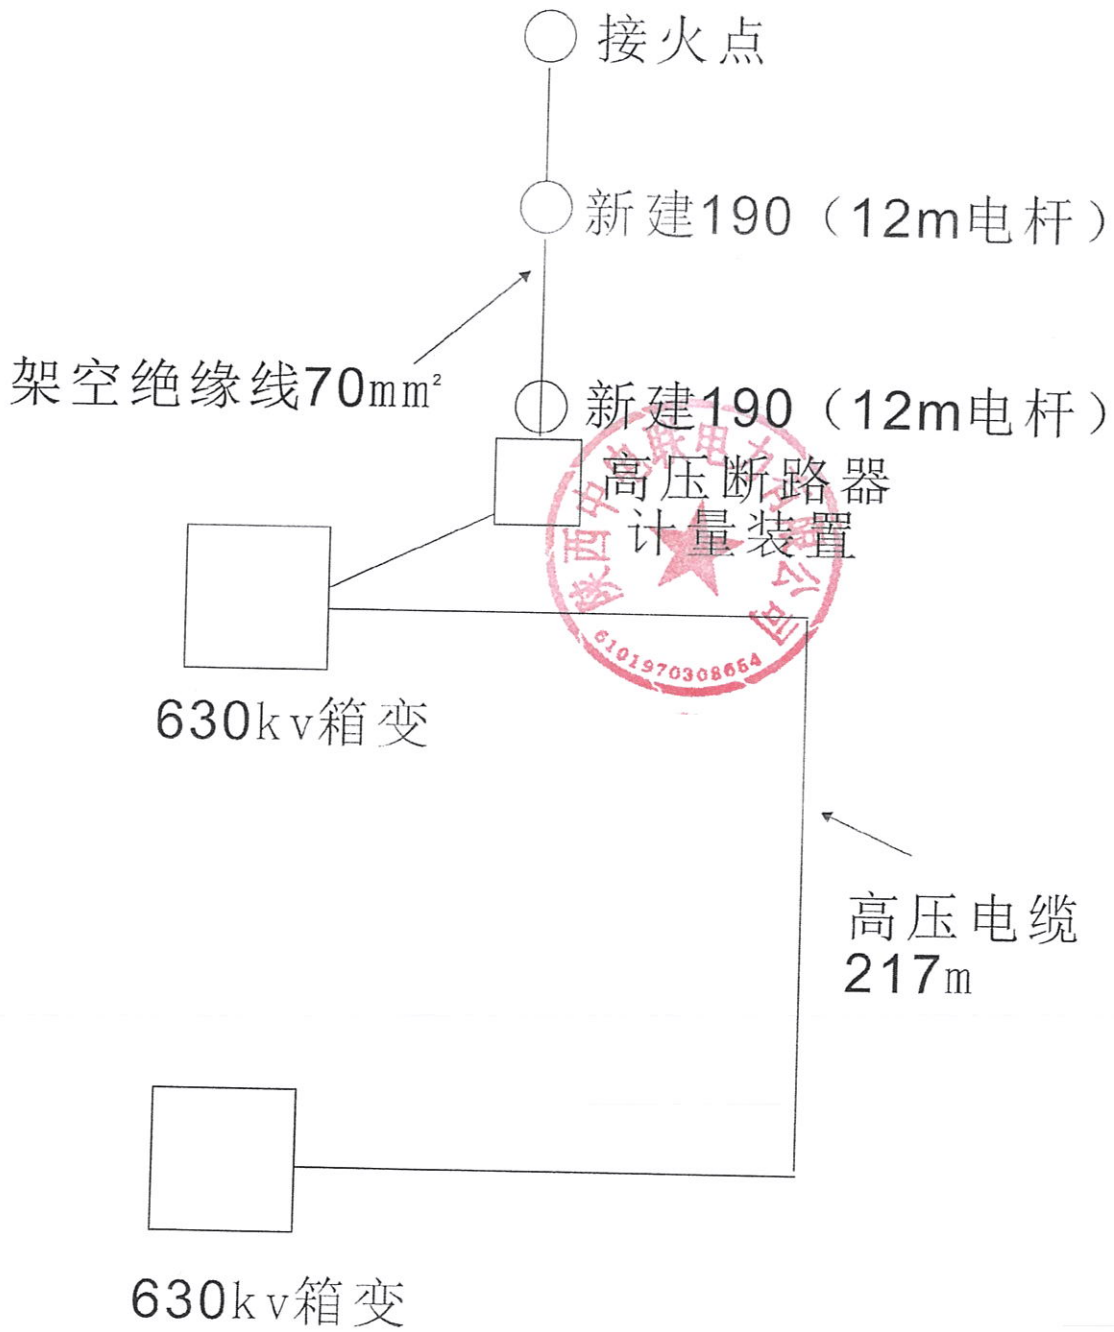

宗旺盛
