

宜阳山水文苑项目电线电缆供货合同结算汇总表

合同编号: SSWY.01-JA-094


合同金额: 5002127.55 元

合同名称: 宜阳山水文苑项目电线电缆供货合同

甲 方: 洛阳莘子园置业有限公司

乙 方: 郑缆科技股份有限公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算总造价	0	0	0	4576800.00
1.1	供货结算小计	0	0	0	4596611.58
1.2	合同转扣款(检测费转扣)	0	0	0	-16300.00
1.3	合同内扣款(合同内检测费)	0	0	0	-3500.00
1.4	设计变更	0	0	0	0.00
1.5	协商优惠金额				-11.58
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	0		0	0
2.2	0		0	0
三	工程结算金额 (小写)	4,576,800.00元			
	(大写)	肆佰伍拾柒万陆仟捌佰元整			
四	应扣甲供材合计	0元			
4.1	甲供材料一	0元			
4.2	甲供材料二	0元			
五	应扣水电费合计	0元			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额 (小写)	4,576,800.00元			
	(大写)	肆佰伍拾柒万陆仟捌佰元整			
七	工程最终发票金额 (小写)	4,576,800.00元			
	(大写)	肆佰伍拾柒万陆仟捌佰元整			

甲方代表: 

乙方代表:



日期: 2023.10.16

日期:

宜阳山水文苑项目电线电缆供货合同结算明细汇总表

序号	项目名称	工程造价（元）	备注
1	第一次进度2021.9~11结算金额	522544	
2	第二次进度2021.12结算金额	360607.24	
3	第三次进度2021.12结算金额	314650	
4	第四次进度2022.4.22结算金额	988812	
5	第五次进度2022.5.24结算金额	1260169.04	
6	第六次进度2022.5.27结算金额	1149829.3	
7	供货结算小计（1+2+3+4+5+6）	4596611.58	

甲方代表：~~洛阳德鑫置地有限公司~~、
洛阳莱子园置业有限公司

乙方代表：郑缆科技股份有限公司

甲方代表签字 郭子祥

乙方代表签字

日期：2023.10.16

日期：



工程结算资料核对确认表

项目名称	宜阳山水文苑项目电线电缆供货合同结算		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算申请书	1		
2	结算通知书	1		
3	工程验收单	15		
4	授权委托书	1		
5	工程账目来往明细	1		
6	水电费清单	1		
7	施工合同	18		
8	工程量清单	1		
9	退货情况说明	1		
相关部门签字栏	施工单位： (签字盖章) 	项目工程部： (签字盖章) 	成本部门： (签字盖章)	

注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

工程结算通知书

郑缆科技股份有限公司：

我公司与贵公司签订的宜阳山水文苑项目电线电缆供货合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部门负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在2023年8月30日之前派专业人员与我公司成本部门肖兴辉接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以A4纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于2023年8月30日前提交我公司成本部门的肖兴辉签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》


1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门肖兴辉电话15737920802，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：



宜阳山水文苑工程总签发：



工程竣工结算申请报告

洛阳莘子园置业有限公司:

兹有我司与贵司签订的《宜阳山水文苑项目电线电缆供货合同SSWY.01-JA-094》、《宜阳山水文苑项目电线电缆供货合同补充协议SSWY.01-JA-094-B01》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为5002127.55元；合同执行过程中发生签证 份，增（减）造价为 元；合同执行过程中发生设计变更 份，增（减）造价为 元。

合同增（减）造价合计为 元，申报合同结算造价为4596610.63元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2023年8月14日），我司已收到贵司支付的工程款共计2481867.20元（大写：贰佰肆拾捌万壹仟捌佰陆拾柒元贰角整）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：李锐

手机号码：13721647874

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

授权委托书

致：洛阳莘子园置业有限公司

本人叶三朋系郑缆科技股份有限公司的法定代表人，现委托李锐为我方代理人，并以本公司的名义办理宜阳山水文苑项目电线电缆供货合同的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：

（盖章）



法定代表人：

（签字或盖章）

叶三朋

委托代理人：

（签字）

李锐

工程往来账目明细

合同名称：宜阳山水文苑项目电线电缆供货合同

合同编号：SSWY.01-JA-094

日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	税率 (%)	备注
2021.12.06	506867.68	200000.00	522544.00	13%	
		150000.00		13%	
		156867.68		13%	
2022.01.27	305210.50	305210.50	314650.00	13%	
2022.01.27	349789.02	360787.24	360607.24	13%	
		-10998.22		13%	
2022.05.11	969147.60	950000.00	988812.00	13%	
2022.06.25	1222364.00	100000.00	1260169.04	13%	
		100000.00		13%	
		20000.00		13%	
2023.01.17	1115334.00	150000.00	1149828.35	13%	
小计	4458712.8	7481857.2	4896610.63		

甲方财务：

李坤

乙方财务：

(单位盖章)



退货情况说明

洛阳莘子园置业有限公司：

我公司与贵公司签订的《宜阳山水文苑项目电线电缆供货合同》合同号：SSWY.01-JA-094，已供货完成，截止报送结算资料至甲方时，仅发生一张退货清单，日期为2022年5月30日，退货明细：电线 BV-16 工程量 12000 米。除此之外无退货、无换货。若在质保期内，出现我司退货、换货单据，我司同意在质保金中双倍扣除对应金额。

供货单位（盖章）：



建设单位（盖章）：

范天锋 2023.8.30

监理单位（盖章）：

收货单位（盖章）：

日期：

证明

由郑缆科技股份有限公司供货的宜阳山水文苑项目电线电缆
供货合同与总承包无关，不存在水电费用，特此证明。




情况属实。

范天祥

2023.8.23



工 作 联 系 单

项目名称	中浩德·山水文苑项目	联系单编号	510
合同名称	宜阳山水文苑项目电线电缆供货合同	合同编号	SSWY.01-JA-094
主送单位	郑缆科技股份有限公司		
抄送单位	建基工程咨询有限公司		
事 由	关于催促提供电线电缆检测报告事宜		
<p>内容：</p> <p>由你公司供应的中浩德宜阳山水文苑项目电线电缆，我公司已多次通知你公司负责人提供相关检测报告，至今仍未提供已严重影响我公司相关验收，现要求你公司于8月10日前向我公司提供电线电缆检测相关报告，如逾期未报送，我公司将代为检测相关检测费用从你公司工程款中直接扣除，另给我公司造成的一切损失由你公司承担。</p> <p>下无正文。</p>			
责任工程师：（签字） 		工程经理：（签字） 	
日期：2022.8.4		 日期：	

工 作 联 系 单

项目名称	中浩德·山水文苑项目	联系单编号	530
合同名称	宜阳山水文苑项目电线电缆供货合同	合同编号	SSWY.01-JA-094
主送单位	郑缆科技股份有限公司		
抄送单位	建基工程咨询有限公司		
事由	关于催促提供电线电缆检测报告事宜		

内容:

由你公司承接宜阳山水文苑项目的电线电缆供应工程，在质监站指定检测机构做第三方检测的电线电缆与第三方检测机构检测的电线电缆台账不符（详见附件，附件附后），造成检测费用增加 16300.00 元，增加的检测费用由你公司承担，因你公司至今仍未向我公司提供相关第三方检测报告，致使我公司在第三方检测机构的其他检测项目无法取得，已严重影响我公司相关验收，现我对电线电缆检测的第三方检测费用代为支付，增加的检测费用从你公司工程款中直接扣除，另给我公司造成的一切损失由你公司承担。

下无正文。

责任工程师：（签字）

陈立志

日期：


工程经理：（签字）



日期：2022.8.29

附件:

楼号	试样名称	单价(元)	数量(组)	金额(元)	备注
1#楼	电线	500	3	1500	
	电缆	300	5	1500	
2#楼	电线	500	3	1500	
	电缆	300	5	1500	
3#楼	电线	500	3	1500	
	电缆	300	5	1500	
5#楼	电线	500	3	1500	
	电缆	300	5	1500	
6#楼	电线	500	3	1500	
	电缆	300	5	1500	
7#楼	电线	500	3	1500	
	电缆	300	5	1500	
8#楼	电线	500	3	1500	
	电缆	300	5	1500	
9#楼	电线	500	3	1500	
	电缆	300	5	1500	
10#楼	电线	500	3	1500	
	电缆	300	5	1500	
11#楼	电线	500	3	1500	
	电缆	300	5	1500	
12#楼	电线	500	3	1500	
	电缆	300	5	1500	
13#楼	电线	500	3	1500	
	电缆	300	5	1500	
合计				36000	

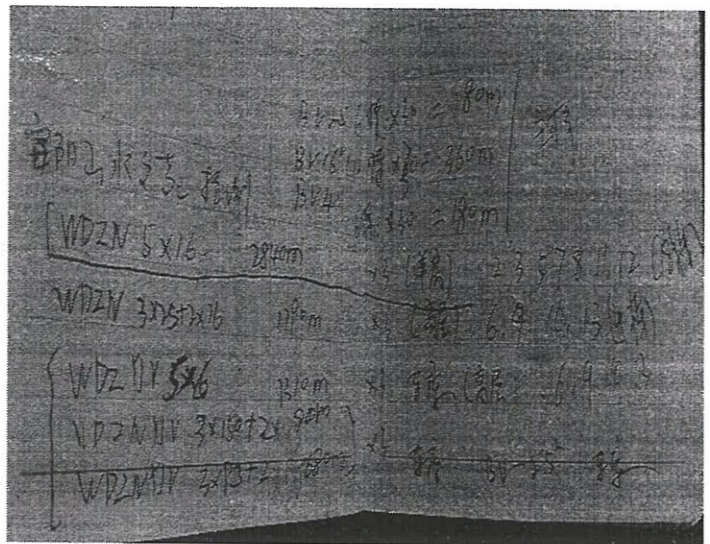

楼号	要求送样组数					郑筑实际送样组数							
	组数	规格	组数	规格	组数	规格	规格	规格	规格	组数	规格	组数	规格
1#楼	2	BV 2.5, BV 4, BV 16	1	WDZN 5*16						3	BV 2.5, BV 4, BV 16	5	WDZN 5*16, WDZYJV 5*6, WDZN 3*25+2*16, WDZNYJV3*150+2*95, WDZNYJV3*95+2*50
2#楼	3	BV 2.5, BV 4, BV 16	1	WDZN 5*16						2	BV 2.5, BV 4, BV 16	6	WDZN 5*16, WDZYJV 5*6, WDZN 3*25+2*16, WDZNYJV3*150+2*95, WDZNYJV3*95+2*50
3#楼	3	BV 2.5, BV 4, BV 16	1	WDZN 5*16						3	BV 2.5, BV 4, BV 16	5	WDZN 5*16, WDZYJV 5*6, WDZN 3*25+2*16, WDZNYJV3*150+2*95, WDZNYJV3*95+2*50
5#楼	3	BV 2.5, BV 4, BV 16	1	WDZN 5*16						3	BV 2.5, BV 4, BV 16	5	WDZN 5*16, WDZYJV 5*6, WDZN 3*25+2*16, WDZNYJV3*150+2*95, WDZNYJV3*95+2*50
6#楼	3	BV 2.5, BV 4, BV 16	2		WDZN 3*25+2*16	WDZYJV 5*6				3	BV 2.5, BV 4, BV 16	5	WDZN 5*16, WDZYJV 5*6, WDZN 3*25+2*16, WDZNYJV3*150+2*95, WDZNYJV3*95+2*50
7#楼	3	BV 2.5, BV 4, BV 16	1	WDZN 5*16						3	BV 2.5, BV 4, BV 16	5	WDZN 5*16, WDZYJV 5*6, WDZN 3*25+2*16, WDZNYJV3*150+2*95, WDZNYJV3*95+2*50
8#楼	1			BV 16	1	WDZN 5*16				2	BV 2.5, BV 4, BV 16	5	WDZN 5*16, WDZYJV 5*6, WDZN 3*25+2*16, WDZNYJV3*150+2*95, WDZNYJV3*95+2*50
9#楼	1			BV 16	2		WDZN 3*25+2*16	WDZYJV 5*6		3	BV 2.5, BV 4, BV 16	5	WDZN 5*16, WDZYJV 5*6, WDZN 3*25+2*16, WDZNYJV3*150+2*95, WDZNYJV3*95+2*50
10#楼	1			BV 16	2		WDZN 3*25+2*16	WDZYJV 5*6		2	BV 2.5, BV 4, BV 16	5	WDZN 5*16, WDZYJV 5*6, WDZN 3*25+2*16, WDZNYJV3*150+2*95, WDZNYJV3*95+2*50
11#楼	1			BV 16	1	WDZN 5*16				3	BV 2.5, BV 4, BV 16	5	WDZN 5*16, WDZYJV 5*6, WDZN 3*25+2*16, WDZNYJV3*150+2*95, WDZNYJV3*95+2*50
12#楼	3	BV 2.5, BV 4, BV 16	1	WDZN 5*16						2	BV 2.5, BV 4, BV 16	5	WDZN 5*16, WDZYJV 5*6, WDZN 3*25+2*16, WDZNYJV3*150+2*95, WDZNYJV3*95+2*50
13#楼	3	BV 2.5, BV 4, BV 16	2			WDZN 3*25+2*16	WDZYJV 5*6			3	BV 2.5, BV 4, BV 16	5	WDZN 5*16, WDZYJV 5*6, WDZN 3*25+2*16, WDZNYJV3*150+2*95, WDZNYJV3*95+2*50
三组	0				2	WDZNYJV3*95+2*50	WDZNYJV3*150+2*95	WDZYJV 5*6		0		0	
合计组数	23				19					36		60	
组数	500				300					500		300	
金额	14000				5700					13000		13000	
					19700							36000	
组数	3				41								
组数	500				300								
金额	4000				12200								
					16200								



备注: 郑筑实际送样组数49组, 费用共计16200元

甲供物资申请表

项目名称: 山水文苑 工程范围: 9#楼

物资名称: 电线 申请日期: 2021.9.6

序号	物资名称	品牌规格 型号	申请数量	使用部位	到货时间	备注
1	电线红	Bv2,5	400米 ✓			
2	电线黄	Bv2,5	400米 ✓			
3	电线绿	Bv2.5	400米 ✓			
4	电线蓝	Bv2.5	1200米 ✓			
5	电线双色	Bv2.5	1200米 ✓			
6	电线红色	Bv4	600米 ✓			
7	电线蓝色	Bv4	600米 ✓			
8	电线双色	Bv4	600米 ✓			

承包人项目负责人: 孟博文

日期: 2021.9.6

发包人项目部工程师: 范红修

日期: 2021.9.8

发包人项目部负责人: 李中群

日期: _____

发包人造价部负责人: _____

日期: _____

今日铜价 6P3P0元/吨

范红修 2021.9.8

电线电缆验收单

使用单位	序号	线缆规格型号	数量(米)	备注
	1	BV-2.5	400✓	红
	2	BV-2.5	400✓	黄
	3	BV-2.5	400✓	绿
	4	BV-2.5	1200✓	蓝
	5	BV-2.5	1200✓	双
	6	BV-4	600✓	红
	7	BV-4	600✓	蓝
	8	BV-4	600✓	双
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
接货单位 签字	李金友 孟敬		供货单位 签字	
相关验收单位 签字	刘石进			范天峰 201.1.1

甲供物资申请表

项目名称: 山水文苑 工程范围: 地下室车位灯照明

物资名称: 电线 申请日期: 2021.9.28

序号	物资名称	品牌规格 型号	申请数量	使用部位	到货时间	备注
1	BV 蓝	2.5	8600 米 ✓		2021.10.2	
2	BV 双色	2.5	8600 米 ✓		2021.10.2	
3	BV 红	2.5	2900 米 ✓		2021.10.2	
4	BV 绿	2.5	2900 米 ✓		2021.10.2	
5	BV 黄	2.5	2900 米 ✓		2021.10.2	
6						
7						
8						

今日钢价: 69630元/吨 董玉峰 2021.9.28.



承包人项目负责人: 董博敏

日期: 2021.9.28

发包人项目部工程师: 董玉峰

日期: 2021.9.28

发包人项目部负责人: 李祥

日期: _____

发包人造价部负责人: _____

日期: _____

电线电缆验收单

使用单位	序号	线缆规格型号	数量(米)	备注
	1	BV-2.5	8600 米	蓝色
	2	BV-2.5	8600 米	双色
	3	BV-2.5	2900 米	红色
	4	BV-2.5	2900 米	绿色
	5	BV-2.5	2900 米	黄色
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
接货单位 签字	 李海文 2021.9.30 李海文 2021.9.30		供货单位 签字	 刘卫兵
相关验收单位 签字	 李实明 范云峰 2021.9.30			

今日钢价 70950元/吨


甲供物资申请表

范天峰. 2021.11.3

项目名称: 山水文苑项目 工程范围: 主楼8,9,10,11号楼

物资名称: 电线电缆 申请日期: 2021.11.3

序号	物资名称	品牌规格型号	申请数量	使用部位	到货时间	备注
1	电线	WDZ-BYJ2.5平方	54000米	8#9#10#11#		蓝色
2	电线	WDZ-BYJ2.5平方	54000米	8#9#10#11#		双色
3	电线	WDZ-BYJ2.5平方	22000米	8#9#10#11#		红色
4	电线	WDZ-BYJ2.5平方	22000米	8#9#10#11#		绿色
5	电线	WDZ-BYJ2.5平方	22000米	8#9#10#11#		黄色
6	电线	WDZ-BYJ2.5平方	6000米	8#9#10#11#		白色
7	电线	WDZ-BYJ4平方	15000米	8#9#10#11#		蓝色
8	电线	WDZ-BYJ4平方	15000米	8#9#10#11#		双色
9	电线	WDZ-BYJ4平方	5000米	8#9#10#11#		红色
10	电线	WDZ-BYJ4平方	5000米	8#9#10#11#		绿色
11	电线	WDZ-BYJ4平方	5000米	8#9#10#11#		黄色



承包人项目负责人: 李敬

日期: 2021.11.3

发包人项目部工程师: 范天峰

日期: 2021.11.3

发包人项目部负责人: 李坤

日期: _____

电线电缆验收单

使用单位	序号	线缆规格型号	数量(米)	备注	
	1	WDZ-BYJ-2.5	10000米 ✓	蓝色	
	2	WDZ-BYJ-2.5	10000米 ✓	双色	
	3	WDZ-BYJ-2.5	10000米 ✓	红色	
	4	WDZ-BYJ-2.5	10000米 ✓	绿色	
	5	WDZ-BYJ-2.5	4600米 ✓	黄色	
	6	WDZ-BYJ-2.5	6000米 ✓	白色	
	7	WDZ-BYJ-4	1000米	} 蓝色	
	8	WDZ-BYJ-4	10000米		双色
	9	WDZ-BYJ-4	5000米		红色
	10	WDZ-BYJ-4	5000米		绿色
	11	WDZ-BYJ-4	5000米		黄色
	12				
	13				
接货单位 签字	李金友 敬		供货单位 签字	刘卫军	
相关验收单位 签字	李金友 2021.11.8			李金友	

电线电缆验收单

使用单位	序号	线缆规格型号	数量 (米)	备注
	1	WDZ-BYJ-2.5	44000 米 ✓	蓝色
	2	WDZ-BYJ-2.5	44000 米 ✓	双色
	3	WDZ-BYJ-2.5	12000 米 ✓	红色
	4	WDZ-BYJ-2.5	12000 米 ✓	绿色
	5	WDZ-BYJ-2.5	17400 米 ✓	黄色
	6	WDZ-BYJ-4	14000 米	蓝色
	7	WDZ-BYJ-4	5000 米	
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
接货单位 签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 李金友 11.25 李锐 </div>		供货单位 签字	
相关验收单位 签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 范天峰 2021.11.28 李锐 </div>			

宜阳山水文苑项目电线电缆供货清单第一次进度（2021年9月~11月）

序号	订货日期	名称	型号	规格	单位	计算式	数量	合同单价 (元/米)	合同铜价 (元/吨)	订货铜价 (元/吨)	涨跌幅 (%)	涨跌幅> 2%需调整	调整后单 价(元/ 米)	调整后小计 (元)
1	2021.09.08	电线	BV	2.5	米	400*3+1200*2	3600	1.8	71850	69390	-3%	需调整	1.78	6408.00
2	2021.09.08	电线	BV	4	米	600*3	1800	2.92	71850	69390	-3%	需调整	2.88	5184.00
3	2021.09.28	电线	BV	2.5	米	8600*2+2900*3	25900	1.8	71850	69630	-3%	需调整	1.78	46102.00
4	2021.11.03	电线	WDZ-BYJ	2.5	米	10000*4+4600+6000+44000*2+12000*2+17400	180000	1.84	71850	70950	-1%	不调整	1.84	331200.00
5	2021.11.03	电线	WDZ-BYJ	4	米	1000+10000+5000*3+14000+5000	45000	2.97	71850	70950	-1%	不调整	2.97	133650.00
6		合计(元)												522544.00
7		根据合同约定“5.2.2 每次线缆供货完毕，经甲方相关部门、监理单位及施工总承包单位验收无质量问题且核对无误后，28个工作日内甲方支付乙方该次线缆供货总金额的97%。”												

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称：洛阳葦子园置业有限公司

甲方代表：李兴科

签字日期：2021.12.2

单位名称：郑院科技股份有限公司

乙方代表：李锐

签字日期：2021.12.2

②-1

甲供物资申请表

项目名称: 山水文苑项目 工程范围: 主楼

物资名称: 主楼电缆 申请日期: 2021.12.8

序号	物资名称	品牌规格型号	申请数量	使用部位	到货时间	备注
1	电缆	WDZN-YJY-5*6	521米	8、9、10、11 号楼主楼	2021.12.10	

合计申请6996米/米
12月8日



承包人项目负责人: 李博

日期: 2021.12.8

发包人项目部工程师: 李博

日期: 2021.12.8

发包人项目部负责人: 李博

日期: _____

发包人造价部负责人: _____

日期: _____

电线电缆验收单

使用单位	序号	线缆规格型号	数量(米)	备注
	1	WDZN-YJY-5*6	521 米	
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
接货单位 签字	李全友 12.10		供货单位 签字	李锐
相关验收单位 签字	李全友		李锐	丁江峰 2024.12.10

22

合同总价: 69700元

范记峰
2021.12.13

甲供物资申请表

项目名称: 山水文苑项目 工程范围: 主楼1,2,3,7,12号楼

物资名称: 电线电缆 申请日期: 2021.12.13

序号	物资名称	品牌规格型号	申请数量	使用部位	到货时间	备注
1	电线	BV2.5平方	36000米	1#2#3#7#12#		蓝色
2	电线	BV2.5平方	36000米	1#2#3#7#12#		双色
3	电线	BV2.5平方	20000米	1#2#3#7#12#		红色
4	电线	BV2.5平方	20000米	1#2#3#7#12#		绿色
5	电线	BV2.5平方	6000米	1#2#3#7#12#		白色
6	电线	BV4平方	14500米	1#2#3#7#12#		红色
7	电线	BV4平方	14500米	1#2#3#7#12#		蓝色
8	电线	BV4平方	14500米	1#2#3#7#12#		双色
9	电线	WDZN-BYJ2.5平方	1300米	1#2#3#7#12#		红色
10	电线	WDZN-BYJ2.5平方	1300米	1#2#3#7#12#		绿色
11	电线	WDZN-BYJ2.5平方	2600米	1#2#3#7#12#		蓝色



承包人项目负责人: 范记峰

日期: 2021.12.13

发包人项目部工程师: 李朝

日期: 2021.12.13

发包人项目部负责人: _____

日期: _____

发包人造价部负责人: _____

日期: _____

电线电缆验收单


使用单位	序号	线缆规格型号	数量(米)	备注
	1	BV-4	10500 米	红色
	2	BV-4	10500 米	蓝色
	3	BV-4	10500 米	双色
	4	WDZN-BYJ-2.5	1300 米	红色
	5	WDZN-BYJ-2.5	1300 米	绿色
	6	WDZN-BYJ-2.5	2600 米	蓝色
	7		36700	
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
接货单位 签字	李金友.21.12.17		供货单位 签字	李经鹏
相关验收单位 签字	李实行 哥博文 范行保 2021.12.17			



2-3

电线电缆验收单

使用单位	序号	线缆规格型号	数量(米)	备注
	1	BV-2.5	16000 米	蓝色
	2	BV-2.5	16000 米	双色
	3	BV-2.5	15000 米	红色
	4	BV-2.5	15000 米	绿色
	5	BV-2.5	6000 米	白色
	6		6000 米	
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
接货单位 签字	李金友 12.21		供货单位 签字	李锐
相关验收单位 签字	李实行		哥博之	李锐 2021.12.21



2-4

电线电缆验收单

使用单位	序号	线缆规格型号	数量(米)	备注
	1	BV-2.5	20000 米	蓝色
	2	BV-2.5	20000 米	双色
	3	BV-2.5	5000 米	红色
	4	BV-2.5	5000 米	绿色
	5		5万	
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
接货单位 签字	李金友 12.24		供货单位 签字	李锐
相关验收单位 签字	李实行		李锐	李元峰 2021.12.24



2-5

电线电缆验收单

使用单位	序号	线缆规格型号	数量(米)	备注
	1	BV-4	4000 米	蓝色
	2	BV-4	4000 米	双色
	3	BV-4	4000 米	红色
	4		12000	
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
接货单位 签字	李石杰		供货单位 签字	李锐
相关验收单位 签字	李锐 李石杰 李石杰 2022.1.2			

宜阳山水文苑项目电线电缆供货清单第二次进度 (2021年12月10~13日)

序号	订货日期	名称	型号	规格	单位	计算式	数量	合同单价 (元/米)	合同铜价 (元/吨)	订货铜价 (元/吨)	涨跌幅 (%)	涨跌幅> 2%需调整	调整后单 价(元/ 米)	调整后小计 (元)	
1	2021.12.10	电缆	WDZN-YJY	5*6	米	521	521	27.56	71850	69960	-3%	需调整	27.44	14296.24	
2	2021.12.13	电线	BV	2.5	米	36000*2+20000* 2+6000	118000	1.8	71850	69700	-3%	需调整	1.78	210040.00	
3	2021.12.13	电线	BV	4	米	14500*3	43500	2.92	71850	69700	-3%	需调整	2.89	125715.00	
4	2021.12.13	电线	WDZN-BYJ	2.5	米	1300*2+2600	5200	2.05	71850	69700	-3%	需调整	2.03	10556.00	
5	合计 (元)														
6	本次进度款金额为=合计*97%					根据合同约定“5.2.2 每次线缆供货完毕,经甲方相关部门、监理单位及施工总承包单位验收无质量问题且核对无误后,28个工作日内甲方支付乙方该次线缆供货总金额的97%。”									

说明: 1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称: 洛阳莘子园置业有限公司

甲方代表: 

签字日期: 2022.1.20

单位名称: 郑缆科技股份有限公司

乙方代表: 

签字日期: 2022.1.20

今日合同价 69990元

日期 2021.12.23

甲供物资申请表

项目名称: 山水文苑项目 工程范围: 主楼1-2-3-5-7-12#

物资名称: 电线 申请日期: 2021.12.23

序号	物资名称	品牌规格型号	申请数量	使用部位	到货时间	备注
1	电线	BV4平方	25000	1-2-3-5-7-12#		红
2	电线	BV4平方	25000	1-2-3-5-7-12#		蓝
3	电线	BV4平方	25000	1-2-3-5-7-12#		双色
4	电线	BV2.5平方	25000	1-2-3-5-7-12#		红
5	电线	BV2.5平方	25000	1-2-3-5-7-12#		绿
6	电线	BV2.5平方	5000	1-2-3-5-7-12#		白
7			13000			
8						
9						
10						
11						



承包人项目负责人: 李强

日期: 2021.12.23

发包人项目部工程师: 李强

日期: 2021.12.23

发包人项目部负责人: 李强

日期: _____

发\\包人造价部负责人: _____

日期: _____

3-1

电线电缆验收单



使用单位	序号	线缆规格型号	数量(米)	备注
	1	BV-4	25000 米	蓝色
	2	BV-4	25000 米	双色
	3	BV-4	25000 米	红色
	4		75000	
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
接货单位 签字	李东 2022.1.7		供货单位 签字	李锐
相关验收单位 签字	李东行 李锐 李东 2022.1.7			

3-2

电线电缆验收单


使用单位	序号	线缆规格型号	数量(米)	备注
	1	BV-2.5	25000 米	红色
	2	BV-2.5	25000 米	绿色
	3	BV-2.5	5000 米	白色
	4		55000	
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
接货单位 签字	李金友 22.1.11		供货单位 签字	李凯
相关验收单位 签字	李凯, 范元科 2022.1.11, 孟博文			

宜阳山水文苑项目电线电缆供货清单第三次进度 (2021年12月23日)

序号	订货日期	名称	型号	规格	单位	计算式	数量	合同单价 (元/米)	合同铜价 (元/吨)	订货铜价 (元/吨)	涨跌幅 (%)	涨跌幅> 2%需调整	调整后单 价 (元/ 米)	调整后小计 (元)
1	2021.12.23	电线	BV	4	米	25000*3	75000	2.92	71850	69990	-3%	需调整	2.89	216750.00
2	2021.12.23	电线	BV	2.5	米	25000*2+5000	55000	1.8	71850	69990	-3%	需调整	1.78	97900.00
3	合计 (元)													
4	说明: 1) 本次进度款核对不作为结算依据。 单位名称: 洛阳莘子园置业有限公司 甲方代表:  郭科 签字日期: 2021.1.20. 单位名称: 郑缆科技股份有限公司 乙方代表:  李锐 签字日期: 2022.1.20. 根据合同约定“5.2.2 每次线缆供货完毕, 经甲方相关部门、监理单位及施工总承包单位验收无质量问题且核对无误后, 28个工作日内甲方支付乙方该次线缆供货总金额的97%。”													
本次进度款金额为=合计*97% 314650.00														

说明: 1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称: 洛阳莘子园置业有限公司

甲方代表:  郭科

签字日期: 2021.1.20.

单位名称: 郑缆科技股份有限公司

乙方代表:  李锐

签字日期: 2022.1.20.

今日钢价 71160元/吨

王正华 2022.2.25

甲供物资申请表

项目名称: 山水文苑项目 工程范围: 主楼

物资名称: 电线 申请日期: 2022.2.25

序号	物资名称	品牌规格型号	申请数量	使用部位	到货时间	备注
1	电线	BV4平方	15000米	6-13		兰
2	电线	BV4平方	15000米	6-13#		双色
3	电线	BV4平方	7500米	6-13主楼		红
4	电线	BV4平方	7500米	6-13主楼		绿
5	电线	BV2.5平方	25000米	主楼公共		兰
6	电线	BV2.5平方	25000米	主楼公共		双色
7	电线	BV16平方	17400米	主楼		兰
8	电线	BV16平方	17400米	主楼		双色
9	电线	BV16平方	8700米	主楼		红
10	电线	BV16平方	8700米	主楼		绿
11	电线	BV10平方	5400米	主楼		红
12	电线	BV10平方	5400米	主楼		兰
13	电线	BV10平方	5400米	主楼		双色



承包人项目负责人: _____

日期: 2022.2.25

发包人项目部工程师: _____

日期: 2022.2.25

发包人项目部负责人: _____


日期: _____

发包人造价部负责人: _____

日期: _____

电线电缆验收单


使用单位	序号	线缆规格型号	数量(米)	备注
	1	BV-4	15000米 ✓	蓝色
	2	BV-4	7000米 ✓	双色
	3	BV-4	7500米 ✓	红色
	4	BV-4	7500米 ✓	绿色
	5	BV-2.5	25000米 ✓	蓝色
	6	BV-2.5	25000米 ✓	双色
	7	BV-16	17400米 ✓	蓝色
	8	BV-16	17400米 ✓	双色
	9	BV-16	8700米 ✓	红色
	10	BV-16	8700米 ✓	绿色
	11	BV-10	5400米 ✓	红色
	12	BV-10	5400米 ✓	蓝色
	13	BV-10	5400米 ✓	双色
接货单位 签字	李金友 3.19		供货单位 签字	李锐
相关验收单位 签字	王博文		王天峰 2022.3.19	




宜阳山水文苑项目电线电缆供货清单第四次进度（2022年4月25日）

序号	订货日期	名称	型号	规格	单位	计算式	数量	合同单价 (元/米)	合同铜价 (元/吨)	订货铜价 (元/吨)	涨跌幅 (%)	涨跌幅 >2%需 调整	调整后单 价(元/ 米)	调整后小计 (元)	
1	2022.2.25	电线	BV	4	米	15000+7000+7500+7500+8000	45000 ✓	2.92	71850	71160	-1%	不调整	2.92	131400.00	
2	2022.2.25	电线	BV	2.5	米	25000*2	50000 ✓	1.8	71850	71160	-1%	不调整	1.8	90000.00	
3	2022.2.25	电线	BV	16	米	17400*2+8700* 2	52200 ✓	12.29	71850	71160	-1%	不调整	12.29	641538.00	
4	2022.2.25	电线	BV	10	米	5400*3	16200 ✓	7.77	71850	71160	-1%	不调整	7.77	125874.00	
18	合计(元)						163400.00							988812.00	
19						本次进度款金额为=合计*97%		根据合同约定“5.2.2 每次线缆供货完毕，经甲方相关部门、监理单位及施工总承包单位验收无质量问题且核对无误后，28个工作日内甲方支付乙方该次线缆供货总金额的97%；”							

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称：洛阳莘子园置业有限公司
 甲方代表：  王
 签字日期：2022.4.25

单位名称：郑缆科技股份有限公司
 乙方代表：  李
 签字日期：2022.4.25

9.64534

今日铜价: 71620元/吨

葛文峰 2022.2.19

甲供物资申请表

项目名称: 山水文苑项目 工程范围: 地库

物资名称: 电缆 申请日期: 2022.2.16

序号	物资名称	品牌规格型号	申请数量	使用部位	到货时间	备注
1	电缆	ZR - YJV -5*16	1000米	地库		
2	电缆	WDZ - YJY -5*16	680米	地库		
3	电缆	WDZN -YJY5*16	2840米	地库		
4	电缆	WDZ - YJY -5*10	510米	地库		
5	电缆	ZR - YJY -5*10	72米	地库		
6	电缆	WDZN - YJY -3*25+2*16	1790米	地库		
7	电缆	WDZ - YJY -5*6	1310米	地库		
8	电缆	WDZN -YJY5*6	470米	地库		
9	电缆	WDZN - YJY -5*10	420米	地库		
10	电缆	WDZN - YJY -5*4	1600米	地库		
11	电缆	WDZN - YJY -3*150+2*95	900米	地库		这三根电缆,不在原合同,今日双方 确认价格,以今日开始申请生产。 今日铜价73080元
12	电缆	WDZN - YJY -3*95+2*50	680米	地库		
13	电缆	WDZN - YJY -3*70+2*35	220米	地库		

葛文峰 2022.3.9



承包人项目负责人: _____

日期: 2022.2.19

发包人项目部工程师: _____

日期: 2022.2.19

发包人项目部负责人: _____

日期: _____

发包人造价部负责人: _____

日期: _____

电线电缆验收单

使用单位	序号	线缆规格型号	数量(米)	备注
	1	ZR-YJV-0.6/1KV-5*16	1000米 ✓	1.4米轴
	2	WDZ-YJY-0.6/1KV-5*16	680米 ✓	1.0米轴
	3	WDZN-YJY-0.6/1KV-5*16	2840米 ✓	2.0米轴
	4	WDZ-YJY-0.6/1KV-5*10	510米 ✓	0.8米轴
	5	ZR-YJY-0.6/1KV-5*10	72米 ✓	软包
	6	WDZN-YJY-0.6/1KV-3*25+2*16	1790米 ✓	1.8米轴
	7	WDZ-YJY-0.6/1KV-5*6	1310米 ✓	1.0米轴
	8	WDZN-YJY-0.6/1KV-5*6	470米 ✓	0.8米轴
	9	WDZN-YJY-0.6/1KV-5*10	420米 ✓	0.8米轴
	10	WDZN-YJY-0.6/1KV-5*4	1600米 ✓	1.0米轴
	11	WDZN-YJY-0.6/1KV-3*95+2*50	680米 ✓	1.8米轴
	12	WDZN-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35	220米 ✓	1.0米轴
接货单位 签字	李俊 - 3.19		供货单位 签字	魏
相关验收单位 签字	  			

电线电缆验收单


使用单位	序号	线缆规格型号	数量 (米)	备注
	1	WDZN-YJY-0.6/1KV-3*150+2*95	400米 ✓	1.8米轴
	2	WDZN-YJY-0.6/1KV-3*150+2*95	400米 ✓	1.8米轴
	3	BV-4 (2022.2.15)	8000米 ✓	蓝色
	4	订做		
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
接货单位 签字		李金凤 2022.4.7		供货单位 签字 
相关验收单位 签字				

宜阳山水文苑项目电线电缆供货清单第五次进度（2022年5月24日）

序号	订货日期	名称	型号	规格	单位	计算式	数量	合同单价 (元/米)	合同铜价 (元/吨)	订货铜价 (元/吨)	涨跌幅 (%)	涨跌幅 > 2%需调整	调整后单 价(元/ 米)	调整后小计 (元)
1	2022.2.19	电缆	ZR-YJV	5*16	米	1000	1000	62.9	71850	71620	0%	不调整	62.9	62900.00
2	2022.2.19	电缆	WDZ-YJV	5*16	米	680	680	63.16	71850	71620	0%	不调整	63.16	42948.80
3	2022.2.19	电缆	WDZN-YJV	5*16	米	2840	2840	66.95	71850	71620	0%	不调整	66.95	190138.00
4	2022.2.19	电缆	WDZ-YJV	5*10	米	510	510	42.02	71850	71620	0%	不调整	42.02	21430.20
5	2022.2.19	电缆	ZR-YJV	5*10	米	72	72	42.02	71850	71620	0%	不调整	42.02	3025.44
6	2022.2.19	电缆	WDZN-YJV	3*25+2*16	米	1790	1790	88.91	71850	71620	0%	不调整	88.91	159148.90
7	2022.2.19	电缆	WDZ-YJV	5*6	米	1310	1310	25.35	71850	71620	0%	不调整	25.35	33208.50
8	2022.2.19	电缆	WDZN-YJV	5*6	米	470	470	27.56	71850	71620	0%	不调整	27.56	12953.20
9	2022.2.19	电缆	WDZN-YJV	5*10	米	420	420	44.97	71850	71620	0%	不调整	44.97	18887.40
10	2022.2.19	电缆	WDZN-YJV	5*4	米	1600	1600	19.31	71850	71620	0%	不调整	19.31	30896.00
11	2022.3.9	电缆	WDZN-YJV	3*150+2*95	米	400*2	800	523.09	71590	73080	2%	不调整	523.09	418472.00
12	2022.3.9	电缆	WDZN-YJV	3*95+2*50	米	680	680	316.59	71590	73080	2%	不调整	316.59	215281.20
13	2022.3.9	电缆	WDZN-YJV	3*70+2*35	米	220	220	231.27	71590	73080	2%	不调整	231.27	50879.40
14			合计				12392.00							1260169.04
15			本次进度款金额为=合计*97%					根据合同约定“5.2.2 每次线缆供货完毕，经甲方相关部门、监理单位及施工单位总承包单位验收无质量问题且核对无误后，28个工作日内甲方支付乙方该次线缆供货总金额的 97%；”					1222364.0	

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称：洛阳莘子园置业有限公司

甲方代表： 

签字日期：2022.5.24

单位名称：郑缆科技股份有限公司

乙方代表： 

签字日期：2022.5.24

今日合计 75130元/m6

甲供物资申请表

范云峰

2022.4.22

项目名称: 山水文苑项目 工程范围: 地库

物资名称: 电缆 申请日期: 2022.4.20

序号	物资名称	品牌规格型号	申请数量	使用部位	到货时间	备注
1	电缆	WDZN-YJY-5*6	2000米	地库		
2	电缆	WDZN-YJY-5*16	1300米	地库		
3	电缆	WDZN-YJY-3*25+2*16	900米	地库		
4	电缆	WDZN-YJY-4*50+1*25	90米	地库		
5	电缆	WDZN-YJY-4*95+1*50	750米	地库		
6	电缆	WDZN-YJY-4*70+1*50	240米	地库		4x70+1x35
7	电缆	ZR-YJV-5*6	600米	地库		
8						
9						
10						
11						



承包人项目负责人: _____

日期: 2022.4.20

发包人项目部工程师: _____

日期: 2022.4.22

发包人项目部负责人: _____

日期: _____

发包人造价部负责人: _____

日期: _____

今日钢价 74120元/吨

葛江 2022.4.29

甲供物资申请表

项目名称: 山水文苑项目 工程范围: 地库

物资名称: 电缆 申请日期: 2022.4.24

序号	物资名称	品牌规格型号	申请数量	使用部位	到货时间	备注
1	电缆	WDZN-YJV-3*25+2*16	1200米	地库		
2	电缆	WDZN-YJV-3*70+2*35	360米	地库		
3	电缆	WDZN-YJV-4*70+1*35	580米	地库		
4	电缆	WDZN-YJV-4*50+1*25	350米	地库		
5	电缆	WDZN-YJV-4*95+1*50	780米	地库		
6						
7						
8						
9						
10						
11						



承包人项目负责人: 葛江

日期: 2022.4.24

发包人项目部工程师: 葛江

日期: 2022.4.27

发包人项目部负责人: 李朝

日期: _____

发包人造价部负责人: _____

日期: _____

电线电缆验收单

使用单位	序号	线缆规格型号	数量 (米)	备注
	1	WDZNYJY-5*6	2000 ✓	
	2	WDZNYJY-5*16	1300 ✓	
	3	WDZNYJY-3*25+2*16	900 ✓	
	4	WDZNYJY-4*50+1*25	90 ✓	
	5	WDZNYJY-4*95+1*50	750 ✓	
	6	WDZNYJY-4*70+1*35	240 ✓	
	7	ZRYJV-5*6	600 ✓	
	8	WDZNYJY-3*25+2*16	1200 ✓	
	9	WDZNYJY-3*70+2*35	360 ✓	
	10	WDZNYJY-4*70+1*35	580 ✓	
	11	WDZNYJY-4*50+1*25	350 ✓	
	12	WDZNYJY-4*95+1*50	780 ✓	
	13			
接货单位 签字	 李博		供货单位 签字	 李锐
相关验收单位 签字	李锐 22.5.14  李锐 22.5.14			

电线电缆退货单

使用单位	序号	线缆规格型号	数量(米)	备注
	1	RVB-16	12000	BV
	2	正破. 李锐		
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
接货单位 签字	李金友		供货单位 签字	李锐
相关验收单位 签字	王博		高峰	王元峰 2022.5.30



宜阳山水文苑项目电线电缆供货清单第六次进度 (2022年6月9日)

序号	订货日期	名称	型号	规格	单位	计算式	数量	合同单价 (元/米)	合同铜价 (元/吨)	订货铜价 (元/吨)	涨跌幅 (%)	涨跌幅 >2%需调整	调整后单 价 (元/ 米)	调整后小计 (元)
1	2022.4.22	电缆	WDZN-YJY	5*6	米	2000	2000 ✓	27.56	71850	75130	5%	调整	28.05	56100.00
2	2022.4.22	电缆	WDZN-YJY	5*16	米	1300	1300 ✓	66.95	71850	75130	5%	调整	68.26	88738.00
3	2022.4.22	电缆	WDZN-YJY	3*25+2*16	米	900	900 ✓	88.91	71850	75130	5%	调整	90.66	81594.00
4	2022.4.22	电缆	WDZN-YJY	4X50+1X25	米	90	90 ✓	188.22	74440	75130	1%	不调整	188.22	16939.80
5	2022.4.22	电缆	WDZN-YJY	4X95+1X50	米	750	750 ✓	367.55	74440	75130	1%	不调整	367.55	275662.50
6	2022.4.22	电缆	WDZN-YJY	4X70+1X35	米	240	240 ✓	266.25	74440	75130	1%	不调整	266.25	63900.00
7	2022.4.22	电缆	ZR-YJV	5*6	米	600	600 ✓	25.35	71850	75130	5%	调整	25.84	15504.00
8	2022.4.29	电缆	WDZN-YJY	3*25+2*16	米	1200	1200 ✓	88.91	71850	74120	3%	调整	89.70	107640.00
9	2022.4.29	电缆	WDZN-YJY	3X70+2X35	米	360	360 ✓	231.27	71590	74120	4%	调整	234.00	84240.00
10	2022.4.29	电缆	WDZN-YJY	4X70+1X35	米	580	580 ✓	266.25	74440	74120	0%	不调整	266.25	154425.00
11	2022.4.29	电缆	WDZN-YJY	4X50+1X25	米	350	350 ✓	188.22	74440	74120	0%	不调整	188.22	65877.00
12	2022.4.29	电缆	WDZN-YJY	4X95+1X50	米	780	780 ✓	367.55	74440	74120	0%	不调整	367.55	286689.00
13	2022.2.25	电线	BV	16	米	-12000	-12000 ✓	12.29	71850	71160	-1%	不调整	12.29	-147480.00
14			合计 (元)				9150.00	-2850						1149829.30
15			本次进度款金额为=合计*97% 根据合同约定“5.2.2 每次线缆供货完毕,经甲方相关部门、监理单位及施工单位及施工总承包单位验收无质量问题且核对无误后,28个工作日内甲方支付乙方该次线缆供货总金额的97%。”											


说明: 1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称: 洛阳莘子园置业有限公司

甲方代表: 

签字日期: 2022.6.9

单位名称: 郑缆科技股份有限公司

乙方代表: 

签字日期: 2022.6.9

1115334

2022.7.26日长江询价59050元/吨

范玉峰 2022.7.26

甲供物资申请表

项目名称：山水文苑项目 工程范围：地库

物资名称：电缆 电线 申请日期：2022.7.3

序号	物资名称	品牌规格型号	申请数量	使用部位	到货时间	备注
1	电缆	WDZN-YJY-5*16	1200米	地库		
2	电缆	WDZN-YJY-5*6	3550米	地库		
3	电缆	WDZN-YJY-3*25+2*16	300米	地库		+30=330米
4	电线	ZR-BYJ-2.5	200米	地库		黄
5	电线	ZR-BYJ-2.5	200米	地库		绿
6	电线	ZR-BYJ-2.5	1100米	地库		蓝
7	电线	ZR-BYJ-2.5	1100米	地库		双
8	电线	ZR-BYJ-2.5	1000米	地库		红
9	电线	BV-2.5	3000米	地库		-1500=1500米 黄
10	电线	BV-2.5	3000米	地库		-2000=1000米 绿
11	电线	BV-2.5	7400米	地库		-3500=3900米 红
12	电线	BV-2.5	10000米	地库		-5000=5000米 蓝
13	电线	BV-2.5	10000米	地库		双



承包人项目负责人：夏博文

日期：2022.7.3

发包人项目部工程师：范玉峰

日期：2022.7.26

发包人项目部负责人：_____

日期：_____

发包人造价部负责人：_____

日期：_____

宜昌山水文苑电缆 验收单 (四方签字单)

序号	规格型号	数量 (件)	备注
1	WDZN-YJY-5*16	1200	
2	WDZN-YJY-5*6	3550 ✓	
3	WDZN-YJY-3*25+2*16	330 ✓	
甲方签字	 质量验收结果： 2022.8.5		
乙方签字	河南国网电缆集团有限公司 质量验收结果：		
监理签字	质量验收结果：		
施工单位	 质量验收结果：		

宜昌山水文苑电缆 验收单 (四方签字单)

序号	规格型号	数量 (件)	备注
1	WDZ-BYJ-2.5	200	黄色
2	WDZ-BYJ-2.5	200	绿色
3	WDZ-BYJ-2.5	1100	蓝色
4	WDZ-BYJ-2.5	1100	双色
5	WDZ-BYJ-2.5	1000	红色
6	BV-2.5	1500	黄色
7	BV-2.5	1000	绿色
8	BV-2.5	3900	红色
9	BV-2.5	5000	蓝色
10	BV-2.5	10000	双色
甲方签字	 质量验收结果: 2022.7.28		
乙方签字	河南国网电缆集团有限公司 质量验收结果:		
监理签字	 质量验收结果:		
施工单位	 质量验收结果:		

甲控（乙供）材料、设备验收单

项目名称：宜阳山水文苑项目

合同名称：宜阳山水文苑电缆采购合同

合同编号：SSWY.01-JA-116

供应商名称：河南国网电缆集团有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

楼号	材料名称	规格/型号	质量评价	数量（单位）	备注
	电线	WDZ-BYJ-2.5		200	黄色
	电线	WDZ-BYJ-2.5		200	绿色
	电线	WDZ-BYJ-2.5		1100	蓝色
	电线	WDZ-BYJ-2.5		1100	双色
	电线	WDZ-BYJ-2.5		1000	红色
	电线	BV-2.5		1500	黄色
	电线	BV-2.5		1000	绿色
	电线	BV-2.5		3900	红色
	电线	BV-2.5		5000	蓝色
	电线	BV-2.5		10000	双色

注：1、出厂合格证齐全；2、外观合格（与样品一致）；3、厚度合格（每批抽查一次）；4、切割整齐无崩边；5、技术指标符合图纸设计要求；

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

有关各方责任工程师	质量验收结果	签名	日期
施工单位责任人			
监理工程师		雷博	
甲方工程师	合格		
甲方招采工程师		范天锋	2022.7.28
甲方设计工程师			
验收结论			

施工单位项目专用章：

监理公司项目专用章：

注：质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。

注：质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。

招采工程师、设计工程师第一批次验收参加，以后可视情况参与（多批次最少参加三次）。

甲控（乙供）材料、设备验收单

项目名称：宜阳山水文苑项目

合同名称：宜阳山水文苑电缆采购合同

合同编号：SSWY.01-JA-116

供应商名称：河南国网电缆集团有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下：

楼号	材料名称	规格/型号	质量评价	数量（单位）	备注
	电力电缆	WDZN-YJY-5*16		1200	
	电力电缆	WDZN-YJY-5*6		3550	
	电力电缆	WDZN-YJY-3*25+2*16		330	

注：1、出厂合格证齐全；2、外观合格（与样品一致）；3、厚度合格（每批抽查一次）；4、切割整齐无崩边；5、技术指标符合图纸设计要求；

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下：

有关各方责任工程师	质量验收结果	签名	日期
施工单位责任人			
监理工程师			
甲方工程师			
甲方招采工程师			2022.8.5
甲方设计工程师			

验收结论

施工单位项目专用章：

监理公司项目专用章：

注：质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。

注：质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写，不得含糊其辞。
招采工程师、设计工程师第一批次验收参加，以后可视情况参与（多批次最少参加三次）。
