

栾川山水文苑S1地块（1-11#楼）门窗制作及安装工程合同结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑S1地块门窗制作及安装工程合同结算审批表	1份1页	第1页	原件	
2	资料存档目录	1份1页	第2页	原件	
3	结算协议书	1份1页	第3页	原件	
4	结算汇总表	1份1页	第4页	原件	
5	结算明细表	1份4页	第5-8页	原件	
11	结算申请单	1份1页	第9页	原件	
12	结算通知书	1份1页	第10页	原件	
13	授权委托书	1份1页	第11页	原件	
14	工程资料核对确认单	1份2页	第12页	原件	
15	工程往来账目明细	1份1页	第13页	原件	
10	电费扣款	1份1页	第14页	原件	
16	验收单	1份2页	第15页	原件	
17	工程结算工作交接单	1份2页	第16-17页	原件	
18	开工通知书及铝锭价格	1份6页	第18-23页	原件	
19	竣工图	本	1		
20	施工单位报送资料	若干			
造价师： 		日期： 2024.11.7			

栾川山水文苑S1地块（1-11#楼）门窗制作及安装工程合同结算汇总表

合同编号：LCS1-JA-017

合同金额：4520000.00元

合同名称：栾川山水文苑S1地块（1-11#楼）门窗制作及安装工程合同

甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙 方：洛阳阳光铝业股份有限公司

序号	项目名称	土建（元）	安装（元）	合计（元）	总计（元）
一	结算总造价	0.00	0.00	0.00	4345000.00
1.10	合同价	0.00	0.00	0.00	4460973.57
1.20	价差调整	0.00	0.00	0.00	-80218.97
1.30	玻璃调整	0.00	0.00	0.00	-24725.10
1.40	垃圾清理	0.00	0.00	0.00	-10514.72
1.50	优惠取整	0.00	0.00	0.00	-514.78
二	其他费用合计	0.00		0.00	0.00
2.10	……	0.00		0.00	0.00
2.20	……	0.00		0.00	0.00
三	工程结算金额	(小写)	4,345,000.00元		
		(大写)	肆佰叁拾肆万伍仟元整		
四	应扣甲供材合计	0.00			
4.10	甲供材料一	0.00			
4.20	甲供材料二	0.00			
五	应扣水电费合计	0.00			
5.10	水费	无			
5.20	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	4,345,000.00元		
		(大写)	肆佰叁拾肆万伍仟元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	4,345,000.00元		
		(大写)	肆佰叁拾肆万伍仟元整		

甲方代表：张磊

乙方代表：张磊


日期：2024.11.7

日期：2024.11.7



栾川山水文苑S1地块（1-11#楼）门窗制作及安装工程合同结算明细

序号	名称	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
一	合同综合单价部分	项	1	4460973.57	4460973.57	详见工程量调整汇总表
二	铝锭价格调整	项	1	-80218.97	-80218.97	
三	玻璃厚度	项	1534.75	-16.11	-24725.10	
四	工程垃圾清理扣款	项	1	-10514.721	-10514.72	截止到2023.12
五	合计				4345514.78	
六	最终合同结算				4345000.00	

甲方 

日期 2024.11.7


乙方

日期



栾川山水文苑项目门窗工程造价汇总表(表1)

序号	型号	面积 (m2)	综合单价 (元/m2)	合价(元)	备注	单平方铝锭含量
1	内平开窗 55断桥铝合金内平开窗 5+12A+5LOW-E钢化玻璃	655.25	493.89	323621.66		6.864
2	内平开窗 55断桥铝合金内平开窗 5+12A+5LOW-E钢化玻璃 >2m2采用 6mm玻璃	905.87	476.49	431637.15		6.2666
3	内平开窗 55断桥铝合金内平开窗 5+12A+5LOW-E中空玻璃	1089.28	553.78	603220.27		8.632
4	内平开窗 55断桥铝合金内平开窗 5+12A+5中空玻璃	34.33	870.21	29870.20		15.6938
5	内平开窗 55普通铝合金内平开窗 5+12A+5中空玻璃	117.51	490.86	57679.83		7.3259
6	内平开窗 55普通铝合金内平开窗 5+12A+5中空玻璃 >2m2采用6mm玻 璃	13.48	434.43	5856.07		5.4126
7	平开门 55断桥铝合金外平开门 5+12A+5LOW-E钢化玻璃	883.76	630.10	556861.51		10.3584
8	平开门 55断桥铝合金外平开门 5+12A+5LOW-E钢化玻璃 >2m2采用 6mm玻璃	153.97	542.07	83460.55		7.971
9	平开门 55普通铝合金外平开门 5+12A+5钢化玻璃	499.58	596.49	297996.52		9.5738
10	上悬窗 55断桥铝合金上悬窗 5+12A+5LOW-E中空玻璃	512.33	851.64	436321.03		14.8715
11	上悬窗 55断桥铝合金上悬窗 5+12A+5LOW-E中空玻璃 七层及以 上钢化玻璃	191.72	861.65	165194.58		14.936
12	上悬窗 55断桥铝合金上悬窗 5+12A+5中空玻璃	15.15	738.23	11187.62		12.7547
13	推拉窗 80断桥铝合金推拉窗 5+12A+5LOW-E中空玻璃	178.85	590.35	105583.99		10.1097



14	推拉窗 80断桥铝合金推拉窗 5+12A+5中空玻璃	376.04	616.32	231761.81		11.1738
15	推拉窗 80普通铝合金推拉窗 5+12A+5中空玻璃	123.32	475.64	58655.19		7.7058
16	推拉门 80普通铝合金推拉门 5+12A+5钢化玻璃	1073.99	376.75	404621.19		3.895
17	推拉门 80普通铝合金推拉门 5+12A+5钢化玻璃 >2m2采用6mm玻 璃	1534.75	393.15	603379.71		4.2375
18	推拉内平开窗 80普铝推拉内平开 窗 5+12A+5中空玻璃	44.70	644.98	28829.69		11.3023
19	外平开窗 55断桥铝合金外平开窗 5+12A+5LOW-E中空玻璃	3.92	711.08	2786.48		12.4328
20	外平开窗 55断桥铝合金外平开窗 5+12A+5中空玻璃	31.23	718.72	22448.54		12.4741
21	合计	8439.02	528.61	4460973.57		

说明：1、此工程量统计以设计部签字下发的纸制版方案为依据进行统计，综合单价包含人工、材料、机械、运输、安装、税金、利润等所有费用；
2、详见后附各楼栋工程量计算表；3、清单未尽事宜详见图纸，均考虑在报价内。

张磊
2024.11.7




刘静利
2024.11.7

栾川山水文苑S1地块（1-11#楼）门窗制作及安装工程合同结算明细

序号	项目名称	铝锭价格调差（元）	备注
1	1#铝锭价格调差	7825.80	
2	2#铝锭价格调差	9616.66	
3	3#铝锭价格调差	11535.30	
4	5#铝锭价格调差	9003.15	
5	6#铝锭价格调差	8372.49	
6	7#铝锭价格调差	8887.89	
7	8#铝锭价格调差	5686.60	
8	9#铝锭价格调差	6079.67	
9	10#铝锭价格调差	6806.71	
10	11#铝锭价格调差	6404.70	
11	合计	80218.97	

张静
2024.11.7



附件 3：

工程竣工结算申请报告

栾川县浩德颐康文旅有限 公司：

兹有我司与贵司签订的栾川山水文苑 S1 地块门窗制作及安装工程合同，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 ¥4520000 元；合同执行过程中发生签证 0 份，增（减）造价为 0 元；合同执行过程中发生设计变更 0 份，增（减）造价为 0 元。


合同核减造价合计为 122290.25 元，申报合同结算造价为 ¥ 4397709.75 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺陷、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2024 年 4 月 25 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 3607000 元（金额大写：叁佰陆拾万零柒仟元整）。

（结算明细见附件）

申请单位：（盖章）
申请日期： 年 月 日



结算工作联系人：邓静利

手机号码：15503797240

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

工程结算通知书

洛阳阳光铝业有限公司：

我公司与贵公司签订的栾川山水文苑 S1 地块门窗制作及安装工程施工合同，目前该工程已竣工验收，现通知贵公司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作进行顺利，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在_____年_____月_____日之前派专业人员与我公司成本部门张磊接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章，将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整的公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于_____年_____月_____日前提交我公司成本部门张磊签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方已上报结算资料出现违规合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时，此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若贵公司上报结算书出现“漏项”、“漏量”情形，贵公司承诺不要求增补资料，视为优惠。

6、若在结算资料准备过程中有审核疑问，请致电我公司成本部门张磊 电话：15303898917，我们将尽力协助贵公司的工作。

附：《工程结算资料清单》

1、工程结算资料核对确认表；2、结算通知书；3、结算申请报告；34、工程验收单；5、授权委托书；6、往来账目明细；7、水电费结清证明；8、合同复印件；9、工程结算工作交接单；10、合作方报送的结算金额证明资料；

工程总签发：



项目总签发：

签发日期：_____年_____月_____日

签收人签字：

签收日期：_____年_____月_____日

授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本授权委托书声明：我 王丽君（姓名）系 洛阳阳光铝业有限公司（单位名称）的法定代表人，现授权委托 洛阳阳光铝业有限公司（单位名称）的 邓静利（姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义办理 栾川山水文苑 S1 地块门窗制作及安装工程 结算事宜。代理人在办理结算过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

单位名称（加盖公章）：洛阳阳光铝业有限公司

授 权 人：王丽君（签字）

被授权代理人：邓静利（签字）

日期：



工程结算资料核对确认表

项目名称	栾川山水文苑 S1 地块门窗制作及安装工程		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1 份 页	原件	
2	结算申请报告	1 份 页	原件	
3	单项工程验收单	1 份 页	原件	
4	授权委托书	1 份 页	原件	
5	往来账目明细	1 份 页	原件	
6	水电费结清证明	1 份 页	原件	
7	合同复印件	1 份 页	复印件	
8	工程签证单	0 份 0 页	原件	
9	设计变更	0 份 0 页	复印件/原件	
10	本合同竣工图纸	1 份 页	原件	
11	施工方报送的结算资料	1 份 页	原件	
相关部门签字栏	施工单位：  (签字盖章)	项目工程部： 秦 楠 (签字盖章)	成本部门： 张 磊 (签字盖章)	

注：


- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

工程往来账目明细


合同名称：栾川山水文苑 S1 地块门窗制作及安装工程合同

合同编号：LCS1-JA-017

日期	请款金额 (元)	财务收款日期	财务实收款 金额 (元)	实际已开发 票金额 (元)	开票税点	备注
2022.11.10	387000	2022.12.2	200000	270900	13%	3#5#楼 框
		2023.1.5	450000	116100	9%	
2022.12.8	388000	2023.1.17	120000	271600	13%	3#5#楼 扇
		2023.3.28	400000	116400	9%	
2023.3.22	510000	2023.4.13	110000	357000	13%	8#9#11# 楼框
		2023.4.19	5000	153000	9%	
2023.4.26	510000	2023.5.11	140000	357000	13%	8#9#11# 楼扇
		2023.5.11	170000	153000	9%	
2023.5.11	570000	2023.5.24	163200	399000	13%	1#2#7# 楼框
		2023.5.30	290000	171000	9%	
2023.6.10	570000	2023.5.30	50000	399000	13%	1#2#7# 楼扇
		2023.6.9	220000	171000	9%	
2023.7.3	336000	2023.6.15	97200	235200	13%	6#10#楼 框
		2023.7.12	450000	100800	9%	
2023.7.22	336000	2023.7.28	401400	235200	13%	6#10#楼 扇
		2023.8.4	100000	100800	9%	
		2023.8.16	120000			
		2023.8.25	60000			
		2023.11.15	60200			
			3607000	3607000		



张磊 2024.5.17



水电费结清证明


栾川县浩德颐康文旅有限公司：

我单位在栾川山水文苑 S1 地块（1#-11#楼）门窗制作及安装工程过程中产生的水电费用均已与相关单位结清。此证明开具后相关第三方因水电产生的纠纷均由我单位承担相应的民事、经济责任，与贵单位无任何关系。

特此证明

洛阳阳光铝业有限公司



年 月 日



2024.5.9

单项工程验收单

年 月 日

合同名称	栾川山水文苑 S1 地块门窗制作及安装工程合同				
施工单位	洛阳阳光铝业有限公司				
建设单位	栾川县浩德颐康文旅有限公司				
工程开工日期	年 月 日	工程竣工日期	年 月 日		
工程内容： 栾川山水文苑 S1 地块 1#-3#楼、5#-11#楼图纸所示门窗制作、运输、安装、验收等。					
验收结论： 验收合格。					
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B：未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量：A：优良		B：合格 ✓	C：不合格	
3	安全：A：未出事故 ✓		B：出现轻微事故	C：出现中、特大事故	
4	现场：A：整洁、无浪费 ✓		B：一般	C：差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 郭建伟		
	监理单位验收人员签字或盖章		 李乃光		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部	项目营销	物业公司
	秦江楠		张弘	/	李修宇



附件 5 :

工程结算工作交接单

记录编号 :

工程项目名称	栾川山水文苑 S1 地块门窗制作及安装工程
施工单位	洛阳阳光铝业有限公司
实际施工范围简述	S1 地块 1-11#楼门窗已按合同施工完成
按合同执行情况	1、验收情况： <input checked="" type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 未验收（或未通过），原因：_____
	2、工期：合同工期： 年 月 日 ~ 年 月 日 实际工期： 年 月 日 ~ 年 月 日 工期延误/缩短： 天，奖/罚： 元
	2、质量奖/罚：奖金合计 元，索赔合计 元
	4、其它：
合同及图纸内容完成情况	<input checked="" type="checkbox"/> 已全部完成 <input type="checkbox"/> 未完成情况说明：_____
	该项目施工使用的施工图为_____设计院（公司） 年 月 版。 施工和材料使用与施工图不相同部分说明（若全部相同不须填写，可另附页）：
变更内容及签证完成情况	<input checked="" type="checkbox"/> 无变更签证 <input type="checkbox"/> 有变更签证并已全部完成，其中属于设计变更_____份，现场

开 工 通 知 书

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	通知书编号	202302-T001
合同名称	栾川山水文苑 S1 地块门窗制作及安装工程合同	合同编号	LCS1-JA-017
主送单位	洛阳阳光铝业有限公司(阳光铝业)		
抄送单位	建基工程咨询有限公司（建基咨询）；		
事由	开工通知		
<p>内容：</p> <p>根据贵司与我单位签订的《栾川山水文苑 S1 地块门窗制作及安装工程合同》约定，项目 1#、2#、6#、7#、10#楼现已初步具备施工条件，经前期沟通，现通知贵司于 <u>2023 年 2 月 7 日</u> 开始排产加工，并于 <u>2023 年 3 月 20 日</u> 前进场施工；请贵司接到本通知书后做好入场准备，按期开工。</p> <p>贵司应在接到通知后：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、组织型材排产加工、玻璃排产加工。 2、对施工人员进行技术、安全交底。 3、在通知的节点时间组织施工所需物料、人员、设备进场。 5、严格按照施工规范及合同约定施工。 			
责任工程师：（签字）		项目工程总：（签字）	
			
日期：2023 年 2 月 7 日			

← 长江有色-A00铝

—2024—

07/08

20240

-20↓

20220~20260 (元/吨)

前3日均价: 20313 前5日均价: 20254 本周均价: 20240

近30


上周

上月

近一

自选时



当前区间: 2023/02/01 至 2023/02/07 交易日均价: 18920

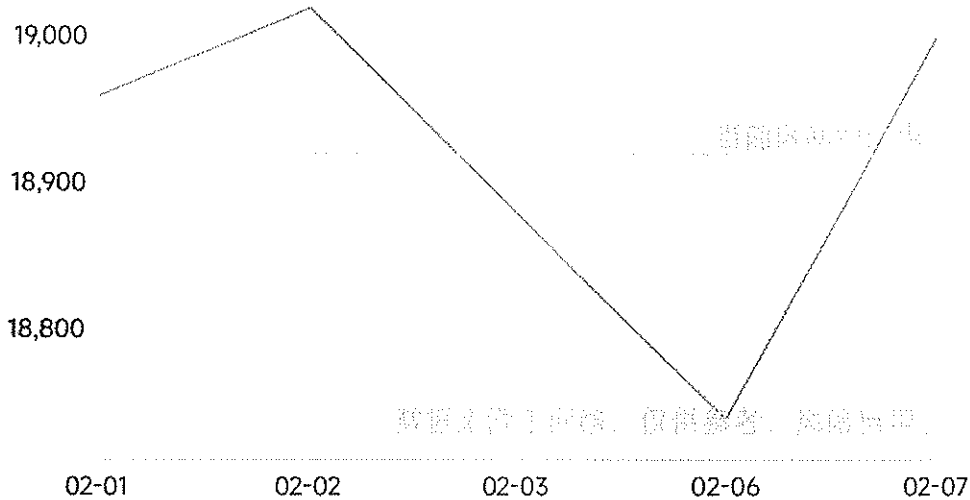

单日均价

日期	价格区间	单日均价	涨跌
2023-02-01	18940~18980	18960	+240
2023-02-02	19000~19040	19020	+60
2023-02-03	18860~18900	18880	-140
2023-02-06	18720~18760	18740	-140
2023-02-07	18980~19020	19000	+260

开 工 通 知 书

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	通知书编号	202209-T001
合同名称	栾川山水文苑 S1 地块门窗制作及安装工程合同	合同编号	LCS1-JA-017
主送单位	洛阳阳光铝业有限公司(阳光铝业)		
抄送单位	建基工程咨询有限公司（建基咨询）；		
事由	开工通知		
<p>内容：</p> <p>根据贵司与我单位签订的《栾川山水文苑 S1 地块门窗制作及安装工程合同》约定，项目 3#、5#楼现已具备施工条件，经前期沟通，现通知贵司于 <u>2022 年 9 月 9 日</u> 开始排产加工，并于 <u>2022 年 10 月 15 日</u> 进场施工；请贵司接到本通知书后做好入场准备，按期开工。</p> <p>贵司应在接到通知后：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、编制施工组织设计、施工计划方案。 2、向项目监理部报审你单位现场管理人员名单、资质证书、电话号码及身份证复印件（带红章），并向项目工程部备案以上资料。 3、组织施工所需物料、人员、设备进场。对施工人员进行技术、安全交底，做好相关质量、安全重大事故应对的应急预案。 4、在通知的开工日期进场施工； 5、严格按照施工规范及合同约定施工。 			
责任工程师：（签字） 		项目工程总：（签字） 	
日期：2022 年 9 月 9 日			

← 长江有色-A00铝

—2024—

07/08

20240

-20↓

20220~20260 (元/吨)

前3日均价: 20313 前5日均价: 20254 本周均价: 20240

近30


上周

上月

近一

自选时



当前区间: 2022/09/05 至 2022/09/09 交易日均价: 18498

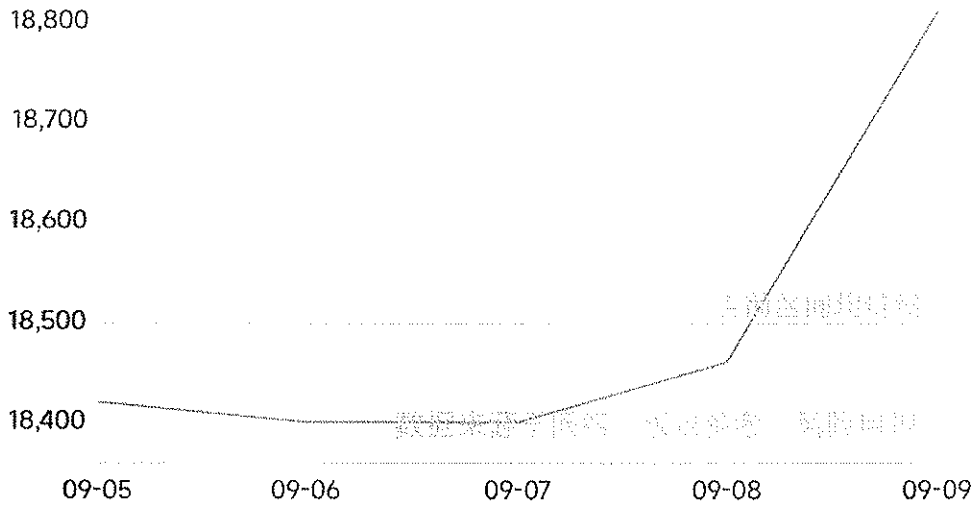

单日均价

日期	价格区间	单日均价	涨跌
2022-09-05	18400~18440	18420	+320
2022-09-06	18380~18420	18400	-20
2022-09-07	18380~18420	18400	0
2022-09-08	18440~18480	18460	+60
2022-09-09	18790~18830	18810	+350

开 工 通 知 书

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	通知书编号	202212-T001
合同名称	栾川山水文苑 S1 地块门窗制作及安装工程合同	合同编号	LCS1-JA-017
主送单位	洛阳阳光铝业有限公司(阳光铝业)		
抄送单位	建基工程咨询有限公司（建基咨询）；		
事由	开工通知		
<p>内容：</p> <p>根据贵司与我单位签订的《栾川山水文苑 S1 地块门窗制作及安装工程合同》约定，项目 8#、9#、11#楼现已具备施工条件，经前期沟通，现通知贵司于 <u>2022 年 12 月 9 日</u> 开始排产加工，同时考虑春节假期因素影响，并于 <u>2023 年 1 月 11 日</u> 进场施工；请贵司接到本通知书后做好入场准备，按期开工。</p> <p>贵司应在接到通知后：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、组织型材排产加工、玻璃排产加工。 2、对施工人员进行技术、安全交底。 3、在通知的节点时间组织施工所需物料、人员、设备进场。 5、严格按照施工规范及合同约定施工。 			
责任工程师：（签字） 		项目工程总：（签字）  2022.12.9	
日期：2022 年 12 月 9 日			

← 长江有色-A00铝

—2024—
07/08

20240

-20↓

20220~20260 (元/吨)

前3日均价: 20313 前5日均价: 20254 本周均价: 20240

近30


上周

上月

近一

自选时

前区间: 2022/12/01 至 2022/12/10 交易日均价: 19374.2

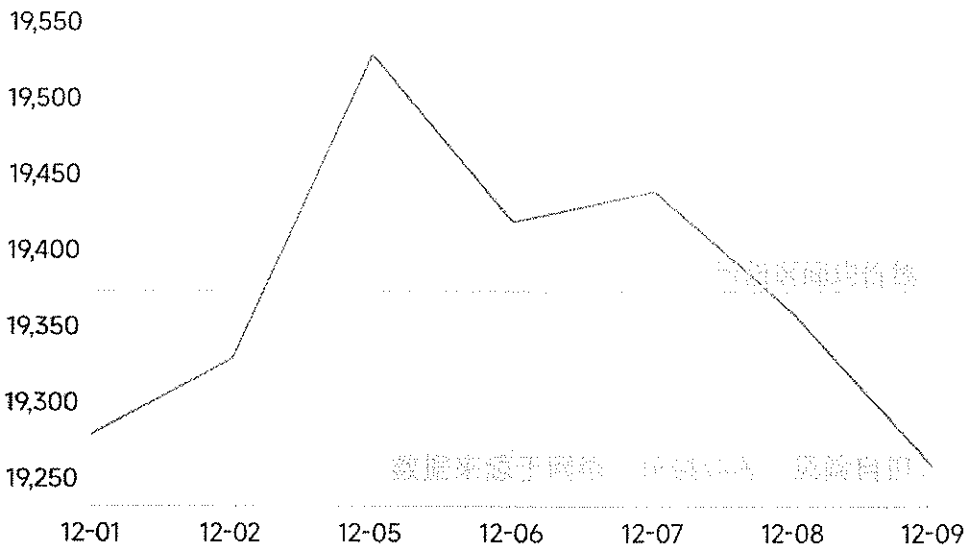

单日均价

日期	价格区间	单日均价	涨跌
2022-12-01	19260~19300	19280	+310
2022-12-02	19310~19350	19330	+50
2022-12-05	19510~19550	19530	+200
2022-12-06	19400~19440	19420	-110
2022-12-07	19420~19460	19440	+20
2022-12-08	19340~19380	19360	-80
2022-12-09	19240~19280	19260	-100

合同审批

项目名称	栾川山水文苑S1地块	合同名称	栾川山水文苑S1地块门窗制作及安装工程合同
合同价	4,520,000.00	币种/汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
暂估金额	0.00		
合作方	洛阳阳光铝业业有限公司 类型: 工程类		
进项税率	0.00%	是否可抵扣	是
招标计划	直接委托单		
合同附件	栾川山水文苑S1地块门窗制作及安装工程合同审批表.docx 栾川山水文苑S1地块门窗制作及安装工程合同.docx 栾川山水文苑S1地块门窗制作及安装工程合同清单表.xlsx		

合同款项明细: 1

款项明细

费用项: 55030204 直接成本->建安工程费->建筑工程费->门窗工程、幕墙 单位工程: 栾川S1地块

含税金额 (原币): 4,520,000.00 金额 (原币): 4,520,000.00 税额 (原币): 0.00

说明: 1.1. 采购金额占比 70% 为3164000.00元, 其中不含税金额为2800000.00元 (大写人民币贰佰捌拾万元整), 增值税税金为364000.00元 (大写人民币叁拾陆万肆仟元整), 税率 13%; 1.2. 安装金额占比 30% 为1356000.00元, 其中不含税金额为1244036.70元 (大写人民币壹佰贰拾肆万肆仟零叁拾陆元柒角整), 增值税税金为111963.30元 (大写人民币壹拾壹万壹仟玖佰陆拾叁元叁角整), 税率9%;

付款计划

序号	计划付款时间	含税金额 (原币)	金额 (原币)	税额 (原币)	工作项	付款条件
1	2023-12-14	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00	按合同执行	
合计		4,520,000.00	4,520,000.00	0.00		

经办人意见	《栾川山水文苑S1地块门窗制作及安装工程合同》请领导审批	签字: 赵萍 日期: 2022-07-14
经办人部门	集团公司->栾川县浩德颐康文旅有限公司->栾川山水文苑S1地块->招采成本部	

审 批 栏	PM法务意见 落章处空缺信息完善	签字: 刘冠璇 日期: 2022-07-16
	PM项目招采经理意见 合同清单已经修改	签字: 张磊 日期: 2022-07-18
	PM项目工程经理意见 同意	签字: 胡涛 日期: 2022-07-16
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2022-07-17
	PM项目财务经理意见 同意	签字: 李翔 日期: 2022-07-17
	PM项目总经理意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2022-07-18
	PM工程管理部总监意见 同意	签字: 张磊 日期: 2022-07-18
	PM成本管理部总监意见 同意按定标价格签订施工合同, 工程量双方已核对暂定合同总价452万元。	签字: 陈海民 日期: 2022-07-25
	PM招采合约部总监意见 同意	签字: 陈海民 日期: 2022-07-25
	PM大运营中心总监意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2022-07-25
	PM财务管理中心总监意见 同意	签字: 刘晓旭 日期: 2022-07-26
	PM地产集团总裁意见 同意	
