

八里堂地块临电施工工程合同
结算汇总表

合同编号: BLT-QQ-009

合同金额: 348000元

合同名称: 八里堂地块临电施工工程合同

甲方: 河南浩德龙瑞置业有限公司

乙方: 河南省埃思特建设工程有限公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算金额				317561.44
1.1	结算价				317561.44
1.2	变更				0.00
1.3	签证				0.00
1.4	扣款				0.00
1.5	协商优惠金额				0.00
二	其他费用合计				0.00
2.1	扣减税差				0.00
三	工程结算金额	(小写)	317,561.44元		
		(大写)	叁拾壹万柒仟伍佰陆拾壹元肆角肆分		
四	应扣甲供材合计	0.00元			
4.1	甲供材料一	0.00			
4.2	甲供材料二	0.00			
五	应扣水电费合计	0.00元			
5.1	水费	0.00			
5.2	电费	0.00			
六	工程最终付款金额	(小写)	317,561.44元		
		(大写)	叁拾壹万柒仟伍佰陆拾壹元肆角肆分		
七	工程最终发票金额	(小写)	317,561.44元		
		(大写)	叁拾壹万柒仟伍佰陆拾壹元肆角肆分		

甲方代表: 段美平

乙方代表: 徐金发

日期: 2024.12.16

日期:

八里堂地块临电施工工程合同结算明细表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	结算工程量	含税综合单价 (元)	含税合价 (元)	综合单价组成					
							损耗率	主材费		安装费及其它费用 (C)	增值税	
								不含税材料单价	不含税材料小价			
1	箱变	1.名称:箱变(低压侧至少保证2个630A断路器,4个400A断路器,2个100A断路器,并全部配置计量装置) 2.型号:630KVA,油浸式铜铝复合变压器,母线为铝排 3.含相关母线安装及调试 4.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用	台	1	117222.84	117222.84	0%	102658	102658.00	4885.89	9678.95	4个400A断路器少2个,每个扣除主材671元
2	箱变	1.名称:箱变(低压侧至少保证2个630A断路器,4个400A断路器,2个100A断路器,并全部配置计量装置) 2.型号:400KVA,油浸式铜铝复合变压器,母线为铝排 3.含相关母线安装及调试 4.其它:含相关调试、附件安装,满足设计及规范要求 5.含与之相关的一切费用	台	1	85299.90	85299.90	0%	73370.9	73370.90	4885.89	7043.11	4个400A断路器少2个,每个扣除主材671元
3	箱变基础	1.名称:箱变基础 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	2	7630.00	15260.00	0%	5000	5000.00	2000	630.00	
4	10KV架空导线	1.名称:10KV架空导线 2.型号,规格:JKLYJ-10-185 3.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	m	57	24.96	1422.56	0%	4.09	4.09	18.81	2.06	
5	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号,规格:ZC-YJV22-8.7/10KV-3*185mm2 3.材质:铝芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	m	64	125.35	8022.40	0%	95	95.00	20	10.35	

陈金波
2024.12.16

陈金波

6	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号,规格:ZC-YJLV22-8.7/10KV-3*120mm2 3.材质:铝芯 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	m	240	88.97	21352.22	0%	61.62	61.62	20	7.35
7	配管	1.名称:配管 2.型号,规格:CPVC Φ160 3.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	m	235	59.95	14088.25	0%	35	35.00	20	4.95
8	挖沟槽	1.名称:配管挖沟槽 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	m3	70.5	17.44	1229.52	0%	0.00	0.00	16	1.44
9	回填土	1.名称:配管回填土 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	m3	70.5	15.26	1075.83	0%	0.00	0.00	14	1.26
10	电缆头	1.名称:电缆头 2.型号,规格:3*185 3.材质:铝芯, 10KV 4.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	2	490.50	981.00	0%	250	250.00	200	40.50
11	电缆头	1.名称:电缆头 2.型号,规格:3*20 3.材质:铝芯, 10KV 4.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	2	394.76	789.51	0%	162.16216	162.16	200	32.59
12	围栏	1.名称:围栏 2.围栏门上加挂锁,颜色与箱变配合协调 3.其他详见图纸,满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	项	1	7957.00	7957.00	0%	4300	4300.00	3000	657.00
13	水泥线杆	1.名称:水泥线杆 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	根	1	401.39	401.39	0%	8.23	8.23	360.02	33.14
14	电杆上器 具	1.名称:包含横担、金具、绝缘子、避雷器、支架等 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	项	1	3488.00	3488.00	0%	1700	1700.00	1500	288.00
15	隔离开关	1.名称:隔离开关 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	1	1199.75	1199.75	0%	660	660.00	440.69	59.06
16	高压断路器	1.名称:高压断路器 2.满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	个	1	12919.27	12919.27	0%	11000	11000.00	852.54	1066.73

张笑平
2024.12.16

徐金岭

17	设计及图 纸审查费	1.名称:设计及图纸审查费 2.其他详见图纸,满足现场使用、设计、图集及相关规范要求	项	1	7412.00	7412.00	0%	0.00	0.00	6800.00	612.00	
18	协调费	1.包验收通过的协调费	项	1	17440.00	17440.00	0%	0.00	0.00	16000.00	1440.00	
19	合计(元)		元			317561.44						

段荣平

徐金发

2024.12.16


授权委托书

致：河南浩德龙瑞置业有限公司

本人韩旭行系河南省埃思特建设工程有限公司的法定代表人，现委托徐金发为我方代理人，并以本公司的名义办理浩德八里堂地块临电施工工程合同BLT.QQ.009工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）

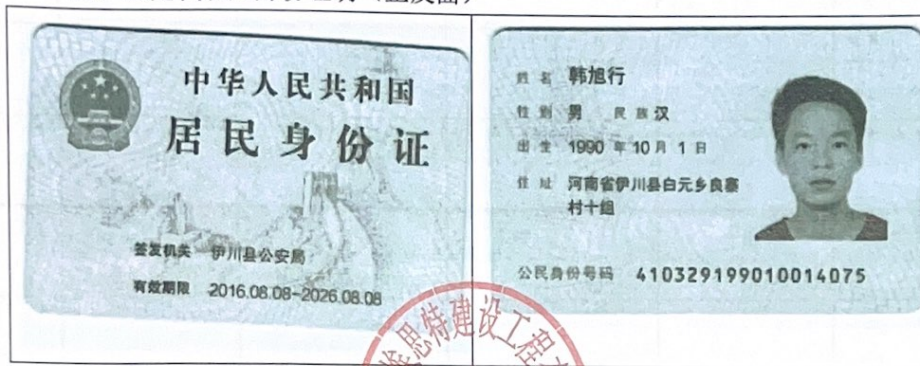

附：委托人身份证明（正反面）



河南省埃思特建设工程有限公司：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）韩旭行

委托代理人：（签字）徐金发

工程往来账目明细

合同名称：浩德八里堂地块临电施工工程合同

合同编号：BLT.QQ.009

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2023.11.9	266497.2	266497.2	278,400.00	9%	
小计		266497.2	278,400.00		



甲方财务： 应付款 266497.2元 (据收款266497.2元)
 阿 2023.11.14.

乙方财务： 白 2023.11.14
 (单位盖章)

单项工程验收单 (分包)

年 月 日

合同名称	浩德八里堂地块临电施工工程合同				
施工单位	河南省埃思特建设工程有限公司				
建设单位	河南浩德龙瑞置业有限公司				
工程开工日期	2023 年 1 月 20 日	工程竣工日期	2023 年 5 月 30 日		
工程内容: 按甲方提供资料进行优化设计, 包含从施工蓝图设计、竣工蓝图、电业局报装、电缆、箱变围栏、检查井、调试、验收、送电等一切费用。					
验收结论: 施工完成, 通电正常, 验收合格, 送电正常。					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良		B: 合格		C: 不合格
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故		C: 出现中、特大事故
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般		C: 差
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		徐金伟		
	监理单位验收人员签字或盖章		刘方波		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	监理单位专用章		
浩德八里堂地块临电工程, 电缆敷设, 检查井, 调试, 验收, 送电, 量方 240m. 2023.11.13		两台箱变 400A 的断路器各少 2 个 段安研 2023.11.13			

张明 2023.11.13

情况说明

因前期临电单位在施工过程中，经与供电局沟通确定现场供电方案由北侧永安大道处下线。经现场测算此方案与从项目西北角下线造价预计增加 10 万元。故临电单位与我司商议后决定从项目西北角下线，从而节约预算。由临电单位负责沟通次方案。在后续过程中，临电单位实际施工时间满足现场实际工期。但为与供电局沟通帮助此方案顺利通过，从而导致整体送电时间增加。并遇上夏季电力公司负荷检查，故使整体工期延长。



司总，特此说明


张景
2023.11.14


证明

由河南省埃思特建设工程有限公司施工的浩德八里堂地块临电施工工程不存在水电费用，特此证明。

河南浩德龙瑞置业有限公司

2023年11月13日

 2023.11.13

 2023.11.13

工程竣工结算申请报告

河南浩德龙瑞置业有限公司：

兹有我司与贵司签订的《浩德八里堂地块临电施工工程合同 BLT.QQ.009》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 348000 元；合同执行过程中发生 签证 0 份，增加造价为 0 元；合同执行过程中发生设计变更 0 份，减造价为 0 元。

合同增加造价合计为 (-14878.5) 元，申报合同结算造价为 333121.5 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前(2023 年 11 月 14 日)，我司已收到贵司支付的工程款共计 266497.2 元(大写：贰拾陆万陆仟肆佰玖拾柒元贰角整)。

(结算明细见附件)

河南省埃思特建设工程有限公司(盖章)



结算工作联系人：徐金发

手机号码：13703888286

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

工程结算通知书

河南省埃思特建设工程有限公司：

我公司与贵公司签订的《浩德八里堂地块临电施工工程合同》合同编号为：BLT.QQ.009 的施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 ____年__月__日之前派专业人员与我公司成本部门 陈向向 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 ____年__月__日前提交我公司成本部门的 陈向向 签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明

7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 陈向向 电话 15838881660，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字



浩德八里堂工程总签发：

浩德八里堂项目总签发：
