

栾川山水文苑项目S1地块栏杆百叶制作及安装合同结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑项目S1地块栏杆百叶制作及安装合同结算审批表	1份1页	第1页	原件	
2	资料存档目录	1份1页	第2页	原件	
3	结算协议书	1份1页	第3页	原件	
4	结算汇总表	1份1页	第4页	原件	
5	结算明细表	1份1页	第5页	原件	
6	结算申请单	1份1页	第6页	原件	
7	结算通知书	1份1页	第7页	原件	
8	授权委托书	1份1页	第8页	原件	
9	工程资料核对确认单	1份1页	第9页	原件	
10	工程往来账目明细	1份2页	第10-11页	原件	
11	验收单	1份1页	第12页	原件	
12	工程结算工作交接单	1份2页	第13-14页	原件	
13	水电费证明	1份1页	第15页	原件	
14	工作派发单及确认单	1份10页	第16-25页	原件	
15	栾川山水文苑项目S1地块栏杆百叶制作及安装合同及审批表	1份19页	第26-44页	原件	
16	竣工图	若干			
造价师： 		日期： 2025.6.10			

栾川山水文苑项目S1地块栏杆百叶制作及安装合同结算汇总表

合同编号: LCS1-JA-051

合同金额: 1945276.84元

合同名称: 栾川山水文苑项目S1地块栏杆百叶制作及安装合同

甲方: 栾川县浩德颐康文旅有限公司


乙方: 河南邦丰装饰工程有限公司

序号	项目名称	土建 (元)	安装 (元)	合计 (元)	总计 (元)
一	结算总造价	0.00	0.00	0.00	1963000.00
1.10	合同价	0.00	0.00	0.00	1891190.00
1.20	变更	0.00	0.00	0.00	90071.23
1.30	签证	0.00	0.00	0.00	
1.40	扣款	0.00	0.00	0.00	-17966.27
1.50	优惠取整				-294.97
二	其他费用合计	0.00		0.00	0.00
2.10	0.00		0.00	0.00
2.20	0.00		0.00	0.00
三	工程结算金额	(小写)	1,963,000.00元		
		(大写)	壹佰玖拾陆万叁仟元整		
四	应扣甲供材合计	0.00			
4.10	甲供材料一	0.00			
4.20	甲供材料二	0.00			
五	应扣水电费合计	0.00			
5.10	水费	无			
5.20	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	1,963,000.00元		
		(大写)	壹佰玖拾陆万叁仟元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	1,963,000.00元		
		(大写)	壹佰玖拾陆万叁仟元整		

甲方代表:



乙方代表:



日期:

2025.6.10

日期:

2025.6.10

1	阳台栏杆 高1100mm L≤4M	m	2246.55	107.40	13%	224.75	2471.30	
2	阳台栏杆 高1100mm L>4M	m	303.28	75.23	13%	85.00	378.51	
3	阳台栏杆 高900mm L≤4M	m	119.64	75.23	13%	85.00	184.67	
4	阳台栏杆 高1100mm L>4M	m	1382.52	106.19	13%	119.99	1498.71	
5	阳台栏杆 高1100mm L≤4M	m	1135.63	101.76	13%	114.99	1250.63	
6	阳台栏杆 1100高 L>4m 80*80*1.5大立柱,大立柱焊接于底部钢板上底部钢板用4个膨胀螺丝与主体结构固定牢固	m	246.24	113.27	13%	128.00	31517.51	
7	阳台栏杆 高800mm L>4M	m	1729.44	97.34	13%	109.99	190228.37	
8	阳台栏杆 高800mm L≤4M	m	792.12	95.57	13%	107.99	85544.29	
9	阳台栏杆 高900mm L≤4M	m	2.66	99.11	13%	111.99	297.90	
10	阳台栏杆 高900mm L>4M	m	9.64	97.34	13%	109.99	1060.34	
11	飘窗栏杆 高900mm	m	1739.29	75.22	13%	85.00	147837.21	
12	楼梯栏杆 塑木扶手栏杆	m	2201.869	159.00	13%	179.67	395609.80	
13	空调板栏杆 600高	m	2274.30	68.00	13%	76.84	174757.21	
14	靠墙楼梯扶手	m	118.80	43.36	13%	49.00	5820.62	
15	不锈钢楼梯栏杆	m		146.02	13%	165.00	0.00	调整了
16	不锈钢无障碍坡道栏杆 950mm高	m		160.00	13%	180.80	0.00	调整了
17	车库栏杆 1100mm高 L>4M	m	87.88	106.19	13%	119.99	10545.13	
18	车库栏杆 1100mm高 L>4M (80*80*1.5大立柱,大立柱焊接于底部钢板上底部钢板用4个膨胀螺丝与主体结构固定牢固)	m	34.98	113.27	13%	128.00	4477.27	
19	车库栏杆 1100mm高 L≤4M	m	34.58	101.76	13%	114.99	3976.83	
20	人防出入口楼梯栏杆 钢扶手代替塑木扶手	m	33.50	150.00	13%	169.50	5677.40	参照楼梯栏杆,调减9元/m
21	小计						1891190.00	
二	合同外增加							
1	S1地块1-20#号楼风井百叶	m2	197.67	197.46	13%	223.13	44105.13	
2	S1地块 20#号楼周边风井防火玻璃及周边百叶窗	m2	19.55			800	15640.00	协商价格
3	S1地块地下车库消防栓封堵铁栏杆5个	m2	16.92			240	4060.80	现场协商价格,后期车库增加
4	S7地块22#楼东单元一层、二层样板间阳台栏杆 高1100mm L>4M	m	28			119.99	3359.85	参照合同价
5	S7地块22#楼东单元一层、二层样板间百叶	m2	7.38			223.125	1646.66	参照合同价
6	S7地块22#楼东单元一层、二层样板间百叶拆除扇	m2	8.28			111.563	923.74	着急展示,洞口没有粉刷就安装了,后期粉刷拆除重做.5折
7	S7地块22#楼东、西单元楼梯栏杆	m	113.18			179.67	20335.05	参照合同价
8	小计						90071.228	
三	应扣费用							
1	第三方垃圾分摊等						-16710.268	
2	水电费(2023年4月-2023年9月)						-1256	
3	小计						-17966.268	
四	合计						1963294.965	
五	最终结算金额						1963000	

甲方

张磊
2025.6.10

乙方

王同红
2025.6.10

附件3：

工程竣工结算申请报告

栾川县浩德颐康文旅有限公司：

兹有我司与贵司签订的《栾川山水文苑项目 S1 地块栏杆百叶制作及安装合同》，2022 年 9 月-2024 年 9 月现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 1945276.84 元；合同执行过程中发生签证份，增（减）造价为 元；合同执行过程中发生设计变更 份，增（减）造价为 元。

合同增（减）造价合计为 95000 元，申报合同结算造价为 2040000 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺陷、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。


截至目前（ 年 月 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 元（大写： ）。

（结算明细见附件）

河南邦丰装饰工程有限公司（盖章）

年 月 日

结算工作联系人：王刚 手机号码：18638212603



备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

工程结算通知书

栾川县浩德颐康文旅有限公司：

我公司与贵公司签订的《栾川山水文苑项目 S1 地块栏杆百叶制作及安装合同》，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 _____ 年 _____ 月 _____ 日之前派专业人员与我公司成本部门 _____ 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于 _____ 年 _____ 月 _____ 日前提交我公司成本部门的 _____ 签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

6、若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 张磊 电话 15303898917，我们将尽力协助贵公司的工作。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请报告 3、零星工程派发单，零星工程确认单，4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

施工单位签收人签字：

工程总签发：

项目总签发：



一、授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人 孙凤玲 (姓名)系 河南邦丰装饰工程有限公司 的法定代表人,现委托 王国灿 (姓名) 为我方代理人,并以本公司的名义参加 栾川山水文苑项目 S1 地块栏杆百叶制作及安装合同。的结算事务,合同结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务,我均予以承认,其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权,特此委托。

附: 委托人身份证明(正反面)



附: 受托人身份证明(正反面)



投 标 人: 河南邦丰装饰工程有限公司 (盖章)

法定代表人: 孙凤玲 (签字)

委托代理人: 王国灿 (签字)

2025年3月25日

工程结算资料核对确认表

项目名称	栾川山水文苑项目 S1 地块栏杆百叶制作及安装 合同		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1 份 1 页	原件	
2	结算申请报告	1 份 1 页	原件	
3	单项工程验收单	2 份 2 页	原件	
4	授权委托书	1 份 1 页	原件	
5	往来账目明细	1 份 2 页	原件	
6	水电费结清证明	1 份 1 页	原件	
7	合同复印件	1 份 1 页	复印件	
8	工程签证单	份 页	原件	
9	设计变更	份 页	复印件/原件	
10	本合同竣工图纸	份 页	原件	
11	施工方报送的结算资料	0 份 0 页	原件	
相关部门签字栏	施工单位：  (签字盖章)	项目工程部： 秦一南 (签字盖章)	成本部门： (签字盖章)	

注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认确认后，~~施工方增补单据~~一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。


工程往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑项目S1地块栏杆百叶制作及安装合同

合同编号：LCS1-JA-051

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金 额(元)	开票税点	备注
2022.11.14	32000		32000	13%	
2022.12.27	96000		96000	13%	
2023.03.17	59000		59000	13%	
2023.04.13	109995.22		109995.22	13%	
2023.04.13	5004.78		5004.78	13%	
2023.05.13	84000		84000	13%	
2023.06.02	63000		63000	13%	
2023.06.08	100000		100000	13%	
2023.07.21	125000		125000	13%	
2023.09.27	130000		130000	13%	
2023.10.14	90000		90000	13%	
2023.12.04	110000		110000	13%	
2024.01.12	101000		101000	13%	

Handwritten signature




2024.05.17	89000		89000	13%	
2024.07.1	118000		118000	13%	
2024.09.02	78000		78000	13%	
2024.9.12	158000		158000	13%	
			1548000		
小计					

甲方财务：合同累计已付148.2万









乙方财务：

(单位盖章)



单项工程验收单 (S1 地块栏杆百叶)

年 月 日

合同名称	栾川山水文苑项目 S1 地块栏杆百叶制作及安装合同						
施工单位	河南邦丰装饰工程有限公司						
建设单位	栾川县浩德颐康文旅有限公司						
工程开工日期	年	月	日	工程竣工日期	年	月	日
工程内容： S1 地块栏杆百叶制作与安装							
验收结论： 初验问题整改完成，后续客诉质量缺陷执行合同保修条款。							
工程评价结果：在评价结果后打√							
1	工期：A：超计划天数			B：未超计划			
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护		
	符合	符合	符合	符合	符合		
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合		
质量：A：优良 <input checked="" type="checkbox"/> B：合格 C：不合格							
3	安全： <input checked="" type="checkbox"/> A：未出事故		B：出现轻微事故		C：出现中、特、重大事故		
4	现场： <input checked="" type="checkbox"/> A：整洁、无浪费		B：一般				
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章						
	监理单位验收人员签字或盖章						
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章						
	工程部	设计部	成本部	项目营销	物业公司		
				/			

2025.3.20

12

附件 5 :

工程结算工作交接单

记录编号 :

工程项目名称	栾川山水文苑项目 S1 地块栏杆百叶制作及安装合同
施工单位	河南邦丰装饰有限公司
实际施工范围简述	栾川山水文苑项目 S1 地块栏杆百叶制作及安装
按合同执行情况	1、验收情况： <input type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 未验收（或未通过），原因：_____
	2、工期：合同工期： 年 月 日 ~ 年 月 日 实际工期： 年 月 日 ~ 年 月 日 工期延误/缩短： 天，奖/罚： 元
	2、质量奖/罚：奖金合计 元，索赔合计 元
	4、其它：
合同及图纸内容完成情况	<input type="checkbox"/> 已全部完成 <input type="checkbox"/> 未完成情况说明：_____
	该项目施工使用的施工图为_____设计院（公司） 年 月 版。 施工和材料使用与施工图不相同部分说明（若全部相同不须填写，可另附页）：
变更内容及签证完成情况	<input type="checkbox"/> 无变更签证 <input type="checkbox"/> 有变更签证并已全部完成，其中属于设计变更_____份，现场

	签证_____份 <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明：_____ <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明：_____
结算资料齐备情况	1、施工方报送结算： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 竣工图纸： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3、其它：
甲供材料设备	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，材料/设备简称：_____ 汇总清单附后，共计_____页
三方材料设备采购	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，材料/设备名称：
工程进行中索赔与扣款情况(包括但不限于：合同签订变更之外的增减款事项、工程遗留、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题)	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 水费 元 <input type="checkbox"/> 电费 元 <input type="checkbox"/> 水电费、管理费按合同比例扣款 <input type="checkbox"/> * 索赔通知编号： <input type="checkbox"/> 其他扣款情况说明(扣款经办人需签字确认)：
项目工程部对本表格以上内容核对无误，符合办理结算的条件，同意转交至成本部门办理结算。	
项目工程经理：秦百春	日期：2015年3月27日
项目总经理意见：	日期： 年 月 日

注：1、填表人在“□”内划勾即为确认，注明“*”内容可选填，其余内容均需做必要说明。

证 明

河南邦丰装饰工程有限公司施工的《浩德·山水文苑 S1 地块》栏杆、百叶制作安装工程与我单位水电费已经结清！

河南诚鹏建设工程有限公司
中浩德·山水文苑
技术资料专用章
2025年03月23日



栾川山水文苑 派发工程验收确认单 (001)

派发时间:

完工时间:

派发部门: 工程部

施工任务位置: 1、S1 地块。 2、S7 地块 22#楼样板间及公共部位。

任务形式: 零星借工; 综合施工 (可多选)

派发任务完成情况:


- 1、S1 地块 1-20#号楼风井百叶已安装完成。
- 2、S1 地块 20#号楼周边风井防火玻璃已安装完成。
- 3、S1 地块地下车库消防栓封堵铁栏杆 5 个已安装完成。
- 4、S7 地块 22#楼东单元一层、二层样板间阳台栏杆、百叶已安装完成。
- 5、公区楼梯栏杆 (2 个单元负一层—顶层) 已安装完成。
- 6、所有工程量详见附件。

验收意见:

- 1、验收合格。
- 2、质保金按合同要求预留。

相关验收人 (签字):

王同斌 秦江奔 郭子光



工程部负责人 (签字):

胡江


注: 1. 工程派发单与派发工程完工确认单应配套使用作为一套完整工程结算资料 (任务单号应一致)

2. 零星借工按工日计入 (技术工种 200 元/工日, 普工力工 120 元/工日), 综合施工按照合同中《零星工程计价清单》计价方式结算。


3. 此单据一式伍份, 施工方、物业、工程、地产、成本部、监理各留存一份。

栾川山水文苑风井百叶


名称	位置	宽	高	数量	平方	备注
固定百叶窗	2#楼	2.48	1.45	1	3.596	
		0.85	1.45	1	1.2325	
	3#楼	2.31	1.07	1	2.4717	
		0.72	1.07	1	1	
	5#楼	4.43	1.44	1	6.3792	
		0.68	1.36	1	1	
	6#楼	2.65	1.18	1	3.127	
		0.56	1.08	1	1	
	7#楼	2.62	0.8	1	2.096	
		0.85	0.77	1	1	
		0.56	0.56	2	2	
	8#楼	2.65	0.72	1	1.908	
	10#楼	2.56	0.72	1	1.8432	
		0.65	0.72	1	1	
		0.65	0.72	1	1	
	11#楼	2.65	0.49	1	1.2985	
		0.7	0.49	1	1	
	12#楼	0.81	2.72	1	2.2032	
		0.46	0.86	1	1	
		0.81	3.14	1	2.5434	
		1.05	1.48	1	1.554	
		1.37	1.47	1	2.0139	
		1.05	1.47	3	4.6305	
		1.38	1.49	1	2.0562	
		1.87	0.38	1	1	
		1.19	0.35	1	1	
		0.96	0.68	1	1	
		0.38	0.68	1	1	
		3.18	0.97	1	3.0846	
		0.48	0.44	2	2	
		0.95	0.44	2	2	
		1.02	0.64	1	1	
	13#楼	0.35	0.64	1	1	
		0.64	0.57	1	1	
		0.65	2.64	1	1.716	
		0.96	1.57	1	1.5072	
	15#楼	0.56	0.56	2	1	
		0.96	1.62	1	1.5552	
		0.96	1.57	1	1.5072	
		0.93	1.57	1	1.4601	
0.72		2.54	1	1.8288		
	0.65	1.00	1	1		



固定百叶窗	16#楼	0.82	2.65	1	2.173
		0.57	0.82	1	1
		0.7	1.05	1	1
		2.58	0.78	1	2.0124
		0.38	0.62	1	1
	17#楼	3.13	1.18	1	3.6934
		0.89	1.49	1	1.3261
		3.42	1.48	1	5.0616
		0.68	1.00	1	1
		1.04	0.73	1	1
		2.66	1.00	1	2.66
	18#楼	3.15	1.2	1	3.78
		0.68	0.65	1	1
		1.27	0.65	1	1
		0.68	0.67	3	1.3668
		1.27	0.65	2	1.651
		0.67	0.63	1	0.4221
		3.15	1.18	1	3.717
	19#楼	3.16	1.15	1	3.634
		0.68	0.66	1	1
		1.27	0.66	1	1
		0.68	0.62	1	1
		0.68	0.68	2	2
		1.27	0.6	1	1
		3.12	1.17	1	3.6504
				1	0
	20#楼	0.8	1.21	1	1
		1.22	2.32	1	2.8304
		1.22	3.12	1	3.8064
		2.95	1.00	1	2.95
		1.77	0.75	1	1.3275
		1.95	1.87	1	3.6465
		2.53	1.18	1	2.9854
		1.87	1.96	1	3.6652
		1.1	2.96	1	3.256
		0.55	4.42	1	2.431
		0.55	2.34	1	1.287
		0.75	1.77	1	1.3275
		2.85	1.77	1	5.0445
		0.55	2.24	1	1.232
		0.55	4.15	1	2.2825
		2.85	1.77	1	5.0445
		1.44	2.55	1	3.672
	风井1	1.04	0.73	1	1
		1.55	0.73	1	1.1315
		1.05	0.73	1	1
		1.55	0.73	1	1.1315
	风井2	2.48	0.46	1	1.1408
		0.7	0.46	1	1
		2.48	0.46	1	1.1408
风井3	0.7	0.46	1	1	
	2.48	0.46	1	1.1408	
	2.48	0.46	1	1.1408	
	0.7	0.46	1	1	
	2.48	0.46	1	1.1408	



风井4	0.7	0.46	1	0.322	
	2.48	0.46	1	1.1408	
	0.7	0.46	1	1	
居民配电室	0.58	0.47	1	1	
	0.94	0.47	1	1	
公共配电室	1.06	0.38	1	1	
	0.48	0.38	2	2	
东玻璃雨棚坡道	0.7	1.05	1	1	
	2.45	1.1	1	2.695	
	0.67	1.02	1	1	
消防控制室	0.65	0.85	1	1	
合计:				197.6734	




以上百叶未在栏杆合同内，现由栏杆单位（邦丰装饰）进行制作安装，规格型号颜色按主楼百叶施工。不足一平方按一平方计算，超一平方按实际平方计算

栾川山水文苑20#楼防火玻璃					
位置	宽	长	数量	平方米	备注
20#楼周边	1	2.6	1	2.6	
	1	2.28	1	2.28	
	1	2.25	1	2.25	
	1	1.55	1	1.55	
	1	3.37	1	3.37	
	1	1.68	1	1.68	
	1	2.96	1	2.96	
	1	2.86	1	2.86	
合计				19.55	

施工前和成本确定800元/平方米

栾川山水文苑地下室栏杆					
位置	宽	高	数量	平方米	备注
16、17、18 、20#楼 (消防管道 、排污泵控 制箱)	1.9	1.8	1	3.42	
	1.5	1.8	1	2.7	
	2.2	1.8	1	3.96	
	1.9	1.8	1	3.42	
	1.9	1.8	1	3.42	
小计				16.92	


施工前和成本确定240元/平方米














S7地块22#楼栏杆百叶工程量



名称	规格	高	单位	工程量	位置
楼梯栏杆	同S1楼梯栏杆	900	m	113.18m	楼梯间
	阳台栏杆	1100	m	28m	一层、二层样板间
名称	规格	数量	单位	工程量	位置
铝合金百叶	1.2*2.3	1	m ²	2.72m ²	一层、二层样板间
	1*2.3	2	m ²	4.6m ²	一层、二层样板间
	1.2*2.3	3	m ²	8.28m ²	已拆除

(2个单元)



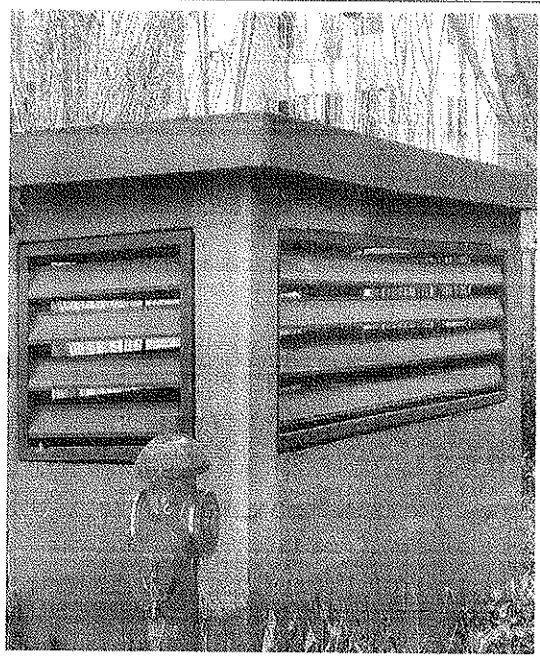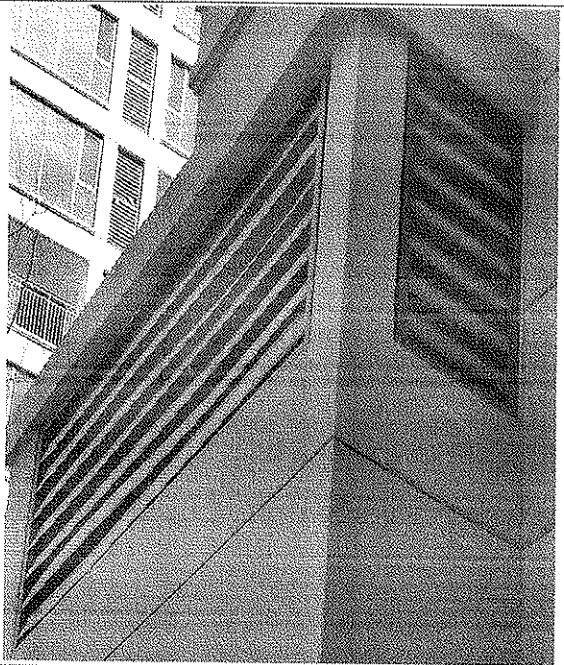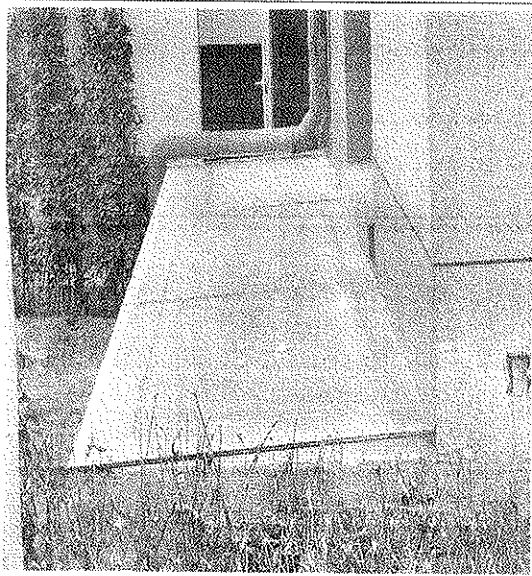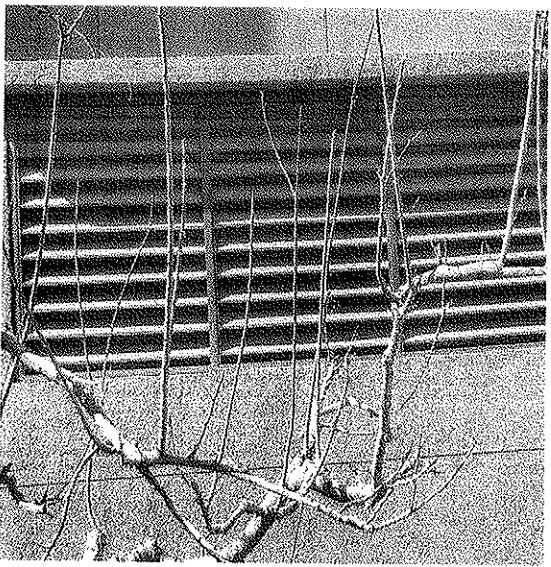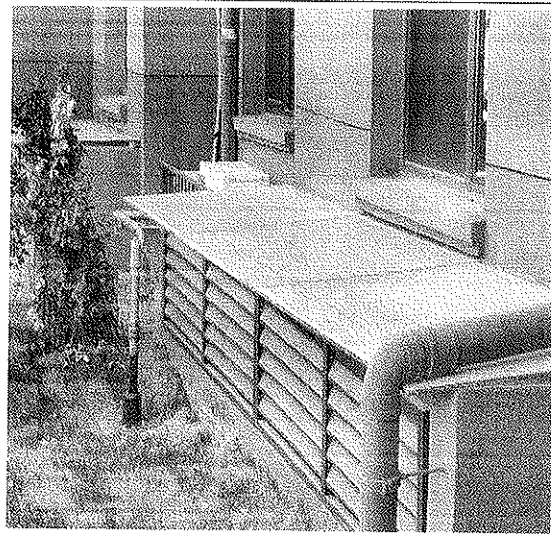

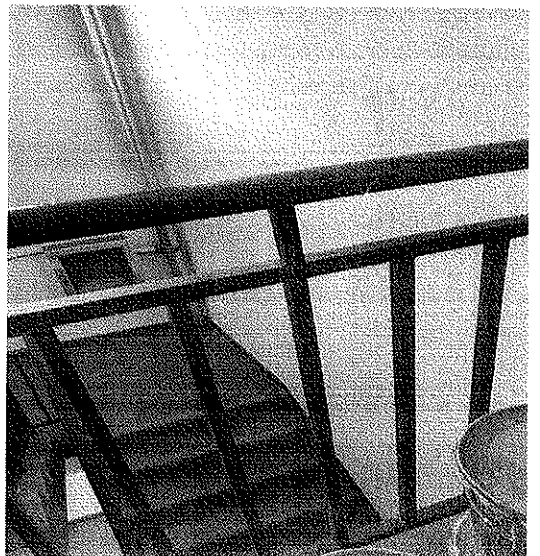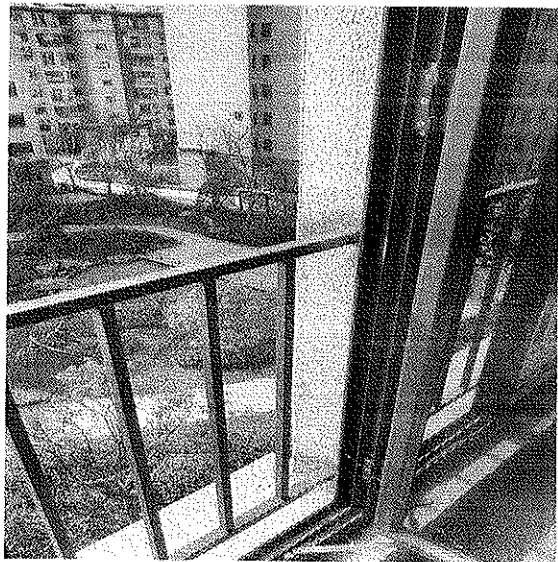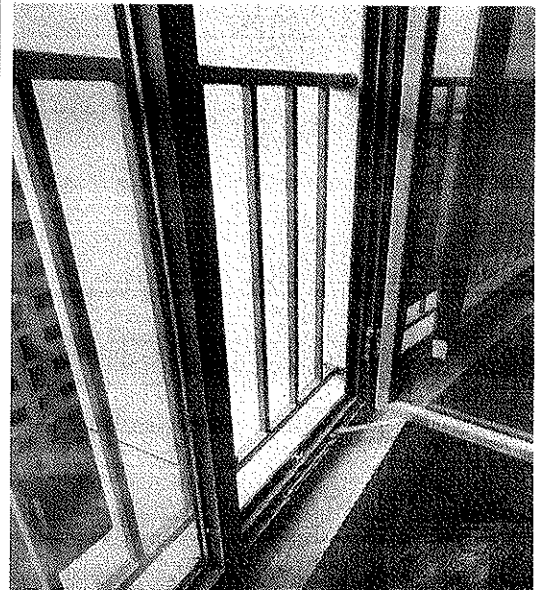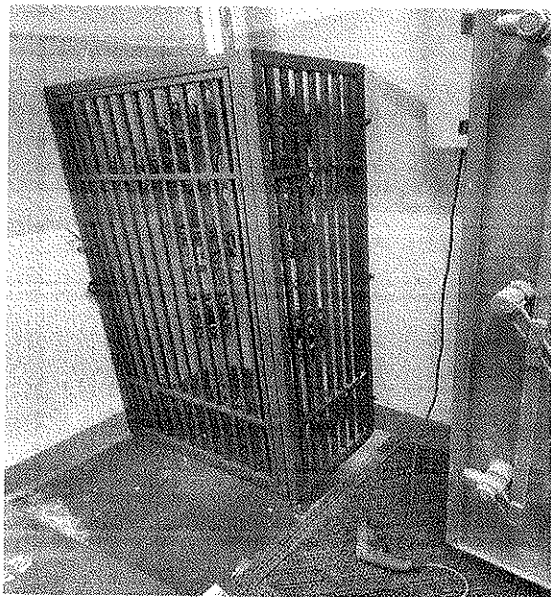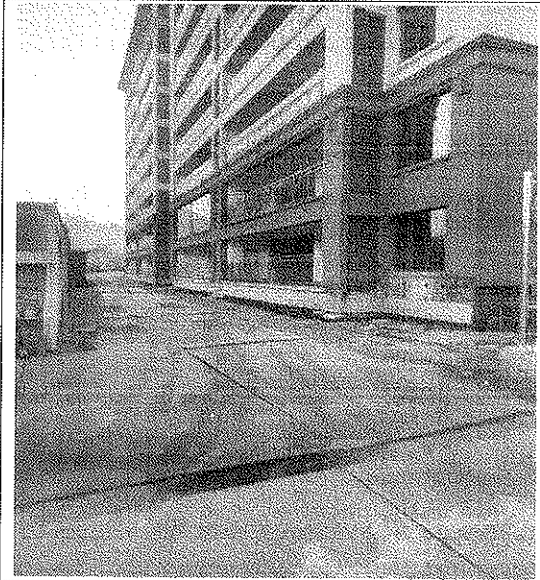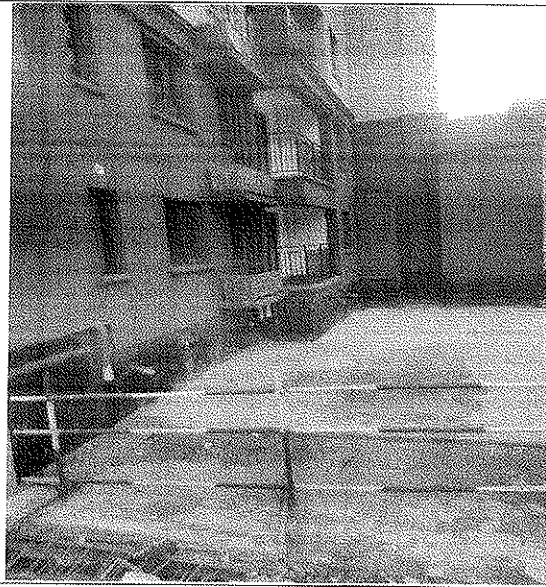

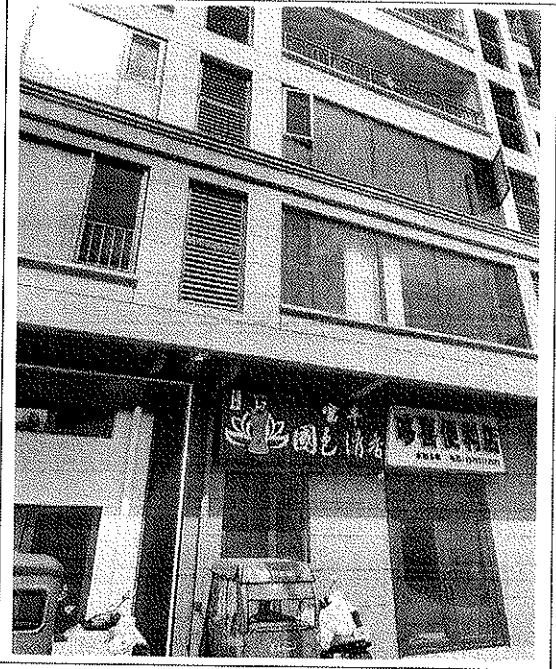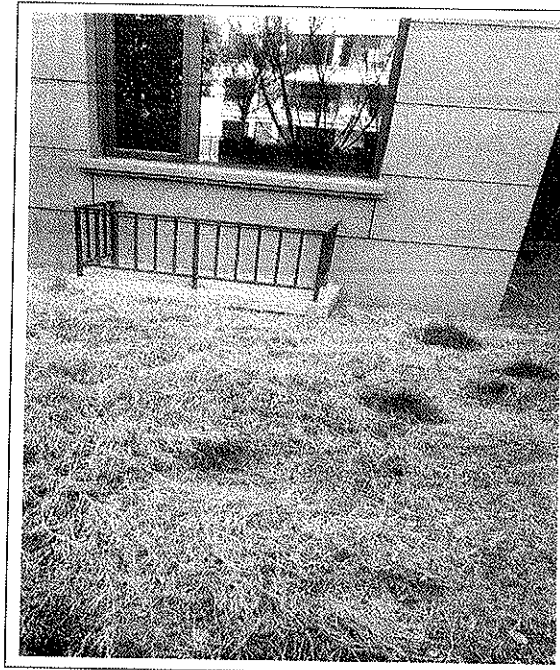

签字: 日期:

PM 申请人意见
同意

签字: 毛政辉 日期: 2022-10-14

PM 监督执行意见
同意

签字: 郭利好 日期: 2022-10-14

PM 申请人意见

签字: 日期:

27
