

宜阳项目给排水及采暖管材管件供货合同结算汇总表

合同编号：SSWY.01-JA-078

合同金额：746744.02元


合同名称：宜阳项目给排水及采暖管材管件供货合同

甲方：洛阳莘子园置业有限公司


乙方：洛阳佰祥商贸有限公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算总造价	0	0	0	703450.00
1.1	合同价	0	0	0	746744.02
1.2	合同内调整项小计	0	0	0	0.00
1.3	签证	0	0	0	0.00
1.4	设计变更	0	0	0	0.00
1.5	协商优惠金额				0.00
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	0		0	0
2.2	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	703,450.00元		
		(大写)	柒拾万叁仟肆佰伍拾元整		
四	应扣甲供材合计	0元			
4.1	甲供材料一	0元			
4.2	甲供材料二	0元			
五	应扣水电费合计	0元			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	703,450.00元		
		(大写)	柒拾万叁仟肆佰伍拾元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	703,450.00元		
		(大写)	柒拾万叁仟肆佰伍拾元整		

甲方代表： 

乙方代表： 

日期： 

日期： 

宜阳项目给排水及采暖管材管件供货合同结算明细表

序号	名称	规格	单位	数量 合计	单价 (元)	小计 (元)	生产 厂家	报送工程 量	汇总工程量合 计	合计 (元)
一	排水 (元) 小计					600983.94				
1	PVC-U管	De110	m	9806	16.03	157180.37	保利	7864	7864	126052.06
2	PVC-U管	De75	m	1412	8.72	12314.05	保利	1744	1744	15209.42
3	PVC-U管	De50	m	15140	5.03	76169.34	保利	7500	7500	37732.50
4	PVC-U实壁螺旋管	De110	m	3612	18.32	66186.29	保利	5064	5064	92792.74
5	H管	De110	个	548	42.12	23081.76	保利	532	532	22407.84
6	伸缩节	De110	个	3220	11.66	37558.08	保利	3095	3095	36100.08
7	伸缩节	De75	个	460	5.17	2376.36	保利	460	460	2376.36
8	伸缩节	De50	个	180	3.38	609.12	保利	140	140	473.76
9	检查口	De110	个	2606	11.52	30021.12	保利	2618	2618	30159.36
10	检插口	De75	个	132	5.90	778.14	保利	136	136	801.72
11	检查口	De50	个	58	3.63	210.37	保利	65	65	235.76
12	45°弯头	De110	个	680	6.04	4106.52	保利	1264	1264	7633.30
13	45°弯头	De75	个	584	2.72	1587.31	保利	130	130	353.34
14	45°弯头	De50	个	2444	1.56	3805.31	保利	2185	2183	3398.93
15	90°弯头	De110	个	1016	7.36	7479.79	保利	1490	1490	10969.38
16	90°弯头	De75	个	40	4.00	159.84	保利	80	80	319.68
17	90°弯头	De50	个	3524	1.99	7009.24	保利	3785	3785	7528.37
18	90°弯头(带检)	De110	个	40	9.15	366.12	保利		0	0.00
19	90°弯头(带检)	De75	个	40	4.80	191.88	保利		0	0.00
20	90°弯头(带检)	De50	个	40	2.98	119.16	保利		0	0.00
21	45°弯头(带检)	De110	个	40	8.51	340.20	保利		0	0.00
22	45°弯头(带检)	De75	个	40	4.47	178.92	保利		0	0.00
23	45°弯头(带检)	De50	个	40	2.80	111.96	保利		0	0.00
24	斜四通	De110	个	40	25.80	1032.12	保利		0	0.00
25	斜三通	De110	个	136	13.36	1816.42	保利	68	68	908.21
26	斜三通	De75	个	40	6.11	244.44	保利		0	0.00
27	斜三通	De50	个	40	2.90	115.92	保利		0	0.00
28	顺水三通	De110	个	1920	12.16	23345.28	保利	1445	1445	17569.76
29	顺水三通	De110*50	个	1690	7.84	13247.91	保利	3032	3032	23767.85
30	顺水三通	De75*50	个	460	4.93	2268.72	保利	510	510	2515.32
31	顺水三通	De50	个	110	2.67	294.03	保利	2322	2322	6206.71
32	顺水四通	De110	个	30	14.56	436.86	保利	90	90	1310.58
33	瓶口三通	De110*50	个	1774	12.75	22623.82	保利	1519	1519	19371.81
34	异径三通	De110*50	个	30	7.84	235.17	保利		0	0.00
35	透气帽	De110	个	194	3.56	689.67	保利	225	225	799.88
36	透气帽	De75	个	24	1.99	47.74	保利	30	30	59.67
37	P弯	De50	个	1480	5.54	8191.80	保利	2518	2518	13937.13
38	S弯	De50	个	4829	6.85	33073.82	保利	4427	4427	30320.52
39	偏芯补芯	De110*50	个	40	3.20	128.16	保利		100	320.40
40	补芯	De110*50	个	40	5.20	208.08	保利	360	260	1352.52
41	带检封口	De75	个	40	8.20	327.96	保利		0	0.00
42	洗衣机地漏	De50	个	730	6.40	4671.27	保利	853	853	5458.35
43	无水封地漏	De50	个	3653	6.02	21994.71	保利	3675	3675	22127.18
44	铸铁地漏	DN100	个	4	54.00	216.00	保利		0	0.00
45	阻火圈	DN100	个	2008	5.85	11746.80	保利	2455	2455	14361.75
46	管卡	De110	个	1500	3.42	5130.00	保利		0	0.00
47	管卡	De75	个	1500	1.94	2916.00	保利		0	0.00
48	管卡	De50	个	1500	1.46	2187.00	保利		0	0.00
49	吊卡	De110	个	1500	3.79	5683.50	保利		0	0.00
50	吊卡	De75	个	1500	2.31	3469.50	保利		0	0.00
51	吊卡	De50	个	1500	1.80	2700.00	保利		0	0.00
二	给水 (元) 小计				0.00	51012.49	保利		0	0.00
1	PPR给水管, S5	De25	m	8050	3.21	25864.65	保利	10566	10566	33948.56
2	PPR内丝直接	De25	个	731	4.59	3355.29	保利		0	0.00
3	PPR弯头	De25	个	2193	1.00	2190.81	保利	6140	6140	6133.86
4	PPR直接	De25	个	1343	0.62	834.00	保利	3456	3456	2146.18

5	PPR截止阀	De25	个	731	21.33	15592.23	保利	882	882	18813.06
6	PPR三通	De25	个	419	1.27	531.71	保利		0	0.00
7	PPR过桥通	De25	个	419	2.42	1014.40	保利		0	0.00
8	带锁水龙头	De25	个	26	5.40	140.40	保利		0	0.00
9	内丝弯头	De25	个	26	5.35	139.00	保利		0	0.00
10	管卡	De25	个	3000	0.45	1350.00	保利		0	0.00
三	采暖(元)小计				0.00	94747.59	保利		0	0.00
1	PB管, S5	De25	m	11090	7.16	79348.95	保利	9896	9896	70805.88
2	内丝直接	De25	个	1440	9.23	13284.00	保利		0	0.00
3	堵头	De25	个	1440	0.53	764.64	保利	3014	3014	1600.43
4	管卡	De25	个	3000	0.45	1350.00	保利		0	0.00
四	合计(元)					746744.02			0	0.00
	合同外约谈部分								0	0.00
1	空调装饰盖	De110	个		0.90			500	500	450.00
2	空调装饰盖	De75	个		0.60			2600	2600	1560.00
3	立体四通	De110	个		18.00			64	64	1152.00
4	直接	De110	个		3.53			980	980	3459.40
5	直接	De75	个		1.67			260	260	434.20
6	透气帽	De50	个						15	0.00
7	PPR-90度外丝弯头	De25	个		9.50				330	3135.00
8	45度PPR弯头	De25	个		0.95				200	190.00
9	直接	De50	个		1.04				30	31.20
10	PPR外丝直接	De25	个		7.80				600	4680.00
五	实际结算金额(元)									703471.97
六	协商后结算金额(元)									703450

张静

2022.9.29

王瑞晓 2022.9.29

结算资料核对确认单

项目名称	宜阳山水文苑项目给排水及采暖管材管件供货合同		核对时间	2022.8.23
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1份1页	原件 ✓	
2	结算申请报告	1份1页	原件 ✓	
3	单项工程验收单	/ /	原件	
4	授权委托书	1份1页	原件 ✓	
5	往来账目明细	1份1页	原件 ✓	
6	水电费结清证明	1份1页	原件 ✓	
7	合同复印件	1份16页	原件	
8	工程签证单	/ /	原件	
9	设计变更	/ /	复印件	
10	供货工程量清单明细	1份1页	原件	
11	四方签字验收单	1份20页	原件	
相关部门 签字	施工单位： (签字盖章)	项目工程部 (签字盖章)	成本部门： (签字盖章)	

- 1、本确认单在合作方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目营销策划部和合作单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

工程结算通知书

洛阳佰祥商贸有限公司：

我公司与贵公司签订的宜阳项目给排水及采暖管材管件供货合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2022 年 9 月 20 日之前派专业人员与我公司成本部门 赵京阁 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于 2022 年 9 月 20 日前提交我公司成本部门的 赵京阁 签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。


5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 赵京阁 电话 13525985079，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：



宜阳山水文苑工程总签发：



宜阳山水文苑项目总签发：



工程竣工结算申请报告

洛阳莘子园置业有限公司：

兹有我司与贵司签订的《宜阳项目给排水及采暖管材管件供货合同编号：SSWY.01-JA-078》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为746744.02元；合同执行过程中发生签证 份，增（减）造价为 元；合同执行过程中发生设计变更 份，增（减）造价为 元。

合同增（减）造价合计为 43067.69 元，申报合同结算造价为703676.33元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2020年11月3日），我司已收到贵司支付的工程款共计508000元（大写：伍拾万零捌仟圆整）。

（结算明细见附件）

洛阳佰祥商贸有限公司

2022年8月23日



结算工作联系人：王瑞晓

手机号码：13523633008

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

授权委托书

致：洛阳莘子园置业有限公司

本人胡龙斐系洛阳佰祥商贸有限公司的法定代表人，现委托王瑞晓为我方代理人，并以本公司的名义办理山水文苑给排水及采暖管材管件供货合同工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）胡龙斐

委托代理人：（签字）王瑞晓



工程往来账目明细

合同名称：宜阳项目给排水及采暖管材管件供货合同

合同编号：SSWY.01-JA-078

日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	税率 (%)	备注
2021.8.9	257000.00	257000.00	257423.14	13%	
2021.12.1	251000.00	251000.00	251074.39	13%	
小计		508000.00	508497.53		

甲方财务： *李*



乙方财务：

(单位盖章)



水电费情况说明

洛阳佰祥商贸有限公司为甲供材（给排水管材）供应商，在宜阳项目给排水及采暖管材管件供货合同履行过程中无水电费产生，不存在水电费争议，特此说明。




王承祥 2022.8.23

洛阳莘子园置业有限公司工程项目部

工程部部长
2022年8月23日






供应商约谈记录

第 1 次约谈

约谈的供应商名称	洛阳佰祥商贸有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input checked="" type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	宜阳山水文苑管件认价		
约谈日期	2022 年 9 月 29 日		
约谈地点	电话约谈		
约谈的内容			
1. PPR-90 度外丝弯头 De25, 含税综合单价: 9.5 元/个; 2. 45 度 PPR 弯头 De25, 含税综合单价: 0.95 元/个; 3. Pvc 直接 De50, 含税综合单价: 1.04 元/个; 4. PPR 外丝直接 De25, 含税综合单价: 7.8 元/个.			
最终报价:	大写:	税率: 13%	
签字确认栏			
供应商代表	签字: 	电话: 13523633008	日期: 2022.9.29
我司代表	签字:  2022.9.29  2022.9.29		




供应商约谈记录

第 1 次约谈

约谈的供应商名称	洛阳佰祥商贸有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	宜阳山水文苑空调洞内外装饰盖、燃气排烟洞内外装饰盖、卫生间排气洞内外装饰盖价格谈判		
约谈日期	2021 年 9 月 4 日		
约谈地点	地产公司三楼审计办公室		
约谈的内容			
<p>1. 样品工程部已确认。</p> <p>2. 价格(单价)(含税综合单价)</p> <p>2.1、$\phi 80$: 0.6元</p> <p>2.2、$\phi 110$: 0.9元</p> <p>3. 含税综合单价</p> <p>4. 具体数量以实际供货为准。</p>			
最终报价:	$\phi 80$: 0.6元/个	大写:	税率: 13%
	$\phi 110$: 0.9元/个		
签字确认栏			
供应商代表	签字: 	电话: 15237945644	日期: 2021.9.4
我司代表	签字:    		
	2021.9.4	2021.9.4	2021.9.4

供应商约谈记录

第 1 次约谈

约谈的供应商名称	洛阳佰祥商贸有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施工分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	宜阳山水文苑 De 直接供货价格谈判		
约谈日期	2021 年 9 月 4 日		
约谈地点	地产公司三楼审计办公室		
约谈的内容			
<p>供货综合单价如下(含税另含运费):</p>			
最终报价:	475	4110	
供应商代表	签字:	日期:	
我司代表	签字:	日期:	

供应商约谈记录

第 2 次约谈

约谈的供应商名称	洛阳佰祥商贸有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	宜阳山水文苑立体四通 De110 供货价格谈判
约谈日期	2021 年 9 月 27 日
约谈地点	电话约谈

约谈的内容




1. 立体四通 De110 供货综合单价 (含税 13%, 含运费): 18 元/个;
2. 暂定数量 64 个, 后期按综合单价固定, 工程量以实结算。

最终报价: 1152 元 (暂定价)

大写: 壹仟壹佰伍拾贰元

税率: 13%

签字确认栏

供应商代表	签字:  电话: 15237945644 日期: 2021-9-27
我司代表	签字:  2021.9.27  2021.9.27

给排水及采暖管材管件验收单 (四方签字单)







序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	PVC顺水三通	110*50	个	400	✓
2	PVC顺水三通	50	个	582	✓
3					
4					
5					
甲方签字	范天舒 2021.7.9			质量验收结果:	合格
乙方签字	赵培 2021.7.9			质量验收结果:	合格
监理签字	高峰 2021.6.29			质量验收结果:	合格
施工签字	王博 2021.7.9			质量验收结果:	合格




给排水及采暖管材管件验收单（四方签字单）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	PVC顺水三通	110	个	50	
2	PVC伸缩节	110	个	158	
3	PVC立检口	110	个	158	
4					
5					
甲方签字	 质量验收结果： 2021.8.19 合格				
乙方签字	 质量验收结果： 2021.8.19 合格				
监理签字	 质量验收结果： 2021.8.19 合格				
施工签字	 质量验收结果： 合格				





给排水及采暖管材管件验收单（四方签字单）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	阻火圈	110	个	800	
2					
3					
甲方签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>志天祥</p> <p>2021.9.6</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>				
乙方签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>胡右军</p> <p>2021.9.6</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>质量验收结果: 合格</p> <p>2021.9.6</p> </div> </div>				
监理签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>冯峰</p> <p>2021.9.6</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>				
施工签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>王博</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>质量验收结果:</p> </div> </div>				

给排水及采暖管材管件验收单（四方签字）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	空调装饰盖	110	个	1000	
2	空调装饰盖	75	个	2800	
甲方签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>范云竹</p> <p>2021. 9. 10</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>大同置业有限公司 质量验收结果： 合格</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>范云竹</p> </div> </div>				
乙方签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>胡龙斐</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>山西佰祥商贸有限公司 质量验收结果： 合格</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>胡龙斐</p> <p>2021. 9. 10</p> </div> </div>				
监理签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>李实行</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>山西工程咨询有限公司 中浩德山水文苑 项目监理部 质量验收结果： 合格</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>李实行</p> <p>2021. 9. 10</p> </div> </div>				
施工签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p>张彦华</p> <p>陈扬飞</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>质量验收结果：</p> </div> <div style="text-align: right;"> </div> </div>				





给排水及采暖管材管件验收单（四方签字）✓

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	PVC-立体四通	D110	个	64	
甲方签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>2021.9.28</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>质量验收结果: <u>合格</u></p> </div> </div>				
乙方签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>2021.9.28</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>质量验收结果: <u>合格</u></p> </div> </div>				
监理签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>李实行、2021.9.28</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>质量验收结果: <u>同意验收</u></p> </div> </div>				
施工签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>2021.9.28</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>质量验收结果: <u>合格</u></p> </div> </div>				

给排水及采暖管材管件验收单（四方签字单）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	PPR阀门	D25	个	250	
2	PPR弯头	D25	个	600	
3	PPR直接	D25	个	1000	
4	PB堵头	D25	个	1200	
5	PVC弯头	D50	个	900	90°
6	PPR水管	D25	米	1000	S5级
7	PB管材	D25	米	700	S5盘管
8	PVC直接	D110	个	100	
9	PVC实壁管	D110	米	900	
10	PVC S弯	D50	个	600	
甲方签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>董永峰</p> <p>2021.11.9</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>质量验收结果: 合格</p> <p>工程部</p> </div> </div>				
乙方签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>胡有林</p> <p>2021.11.9</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>质量验收结果: 合格</p> </div> </div>				
监理签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>刘石进</p> <p>2021.11.9</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>质量验收结果: 合格</p> <p>中冶德信文苑 项目监理部</p> </div> </div>				
施工签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>魏敬如</p> <p>2021.11.9</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>质量验收结果: 合格</p> </div> </div>				

给排水及采暖管材管件验收单（四方签字单）

序号	物资名称	规格型号	数量	单位	单价	金额	备注
1	PVC实壁管	D50	700	米			
2	PVC S弯	D50	600	个			
3	PVC实壁管	D75	260	米			
4	PB管材（S5级）	D25	300	米			
5	PPR水管S5	D25	480	米			
6	PVC直接	D110	200	个			
7	地漏	D50	80	个			
8	检查口	D110	180	个			
9	伸缩节	D110	50	个			
10	顺水三通	D110*50	200	个			
甲方签字:	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  2024.11.19 工程部 </div> <div style="text-align: center;"> 质量验收结果: 合格 </div> </div>						
乙方签字:	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  2024.11.19 </div> <div style="text-align: center;"> 质量验收结果: 合格 2024.11.19 </div> </div>						
监理签字:	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  2024.11.19 项目监理部 </div> <div style="text-align: center;"> 质量验收结果: 同意验收 </div> </div>						
施工签字:	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  2024.11.19 项目部 </div> <div style="text-align: center;"> 质量验收结果: 合格 2024.11.19 </div> </div>						




给排水及采暖管材管件验收单（四方签字单）

序号	物资名称	规格型号	数量	单位	备注
1	PVC-实壁管	D50	300	米	
2	PVC-实壁管	D110	400	米	
3	PVC-螺旋管	D110	180	米	
4	PVC-顺水三通	D50	400	个	
5	PVC-90度弯头	D50	480	个	
6	PVC-45度弯头	D50	400	个	
7	PVC-直接	D110	200	个	
8	PVC-P弯	D50	400	个	
9	PVC-顺水三通	D110*50	280	个	
甲方签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  质量验收结果: <u>合格</u> 2021.11.30 </div> <div style="text-align: center;">  质量验收结果: <u>合格</u> </div> </div>				
乙方签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  质量验收结果: <u>合格</u> </div> <div style="text-align: center;">  质量验收结果: <u>合格</u> </div> </div>				
监理签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  质量验收结果: <u>合格</u> </div> <div style="text-align: center;">  质量验收结果: <u>合格</u> </div> </div>				
施工签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  质量验收结果: <u>合格</u> 2021.11.30 </div> <div style="text-align: center;">  质量验收结果: <u>合格</u> </div> </div>				




给排水及采暖管材管件验收单（四方签字单）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	PVC实壁管	110	米	400	
2	PVC实壁管	75	米	60	
3	PVC90度弯头	50	个	90	
4	PVC45度弯头	110	个	140	
5	异径顺水三通	75*50	个	50	
6	PVC透气帽	110	个	45	
7	PVC透气帽	75	个	6	
8	PVC透气帽	50	个	15	
9	瓶型三通	110*50	个	50	
10	PVC管箍	110	个	180	直拖
11	PVC管箍	50	个	30	
12	PVC45度弯头	75	个	50	
13	PVC45度弯头	50	个	150	

甲方签字:   质量验收结果:  合格 2022.3.30

乙方签字:   质量验收结果:  合格 2022.3.30

监理签字:   质量验收结果:  合格 2022.3.30

施工签字:   质量验收结果:  合格 2022.3.30





给排水及采暖管材管件验收单（四方签字）

序号	物资名称	规格型号	数量	单位	备注
1	PVC-实壁管	D50	500	米	
2	PVC-P弯	D50	320	个	
甲方签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <p>质量验收结果: 合格</p> <p>2022.4.22</p> </div> </div>				
乙方签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <p>质量验收结果: 合格</p> </div> </div>				
监理签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <p>质量验收结果: 合格</p> </div> </div>				
施工签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> <p>质量验收结果: /</p> </div> </div>				

给排水及采暖管材管件验收单（四方签字）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	PPR-管材（S5级）	D25	1000	米	
2	PPR-外丝直接	D25*1/2	800	个	
3	PPR-90度弯头	D25	2000	个	
甲方签字	 <p style="text-align: center;">质量验收结果： 合格</p> <p style="text-align: center;">2022.5.12</p>				
乙方签字	 <p style="text-align: center;">质量验收结果： 合格</p> <p style="text-align: center;">2022.5.12</p>				
监理签字	 <p style="text-align: center;">质量验收结果： 合格</p> <p style="text-align: center;">2022.5.12</p>				
施工签字	 <p style="text-align: center;">质量验收结果： 合格</p> <p style="text-align: center;">2022.5.12</p>				

给排水及采暖管材管件验收单（四方签字）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	PPR-外丝弯头	D25*1/2	330	米	
2	PPR-45度弯头	D25	200	个	
3	PPR-90度弯头	D25	1000	个	
4	PPR-管箍	D25	800	个	
甲方签字	 质量验收结果: 合格 2022.5.16				
乙方签字	 质量验收结果: 合格 2022.5.16				
监理签字	 质量验收结果: 合格 2022.5.16				
施工签字	 质量验收结果:				

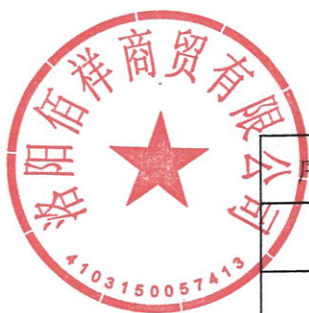
给排水及采暖管材管件退货清单（四方签字）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	PVC三通	110	个	90	
2	PVC H管	110	个	14	
3	PPR外丝直接	25*1/2	个	200	
4	空调装饰盖	110	个	500	
5	空调装饰盖	75	个	200	
甲方签字	<p>范云伟 2022.6.29</p> <p>质量验收结果： 合格</p> <p>项目部</p>				
乙方签字	<p>胡有东 2022.6.29</p> <p>质量验收结果： 合格</p>				
监理签字	<p>刘万进 2022.6.29</p> <p>质量验收结果： 合格</p> <p>中浩德山水文苑 项目部</p>				
施工单位签字	<p>李金友 2022.6.29</p> <p>质量验收结果： 合格</p> <p>中浩德山水文苑 项目部</p>				


给排水及采暖管材管件验收单（四方签字单）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	PVC顺水三通	110*50	个	300	
2	PVC顺水三通	110	个	50	
3	PVC伸缩节	110	个	100	
4	PVC伸缩节	50	个	40	
5	PVC检查口	110	个	100	
6	PVC检查口	50	个	40	
甲方签字	 质量验收结果： 合格				
乙方签字	 质量验收结果：				
监理签字	 质量验收结果： 合格				
施工签字	 质量验收结果：				

给排水及采暖管材管件验收单（四方签字单）



序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	螺旋管	110	米	1100	
2	伸缩节	110	个	562	
3	检查口	110	个	562	
4	45度弯头	110	个	450	
5	顺水三通	110	个	700	
6	顺水三通	110*50	个	550	
7	P弯	50	个	1238	
8	S弯	50	个	1500	
9	45度弯头	50	个	760	
10	90弯头	110	个	520	
11	瓶口三通	110*50	个	520	
12	PVC45度弯头	75	个	80	
13	PVC弯头	75	个	80	
14	pvc90度弯头	50	个	1000	
15	pvc直接	110	个	150	
16	透气帽	110	个	80	
17	pvc直接	75	个	160	
18	顺水三通	50	个	840	
19	伸缩节	50	个	70	
20	正四通	110	个	90	
21	PPR管道, S5	25	米	2670	
22	PPR直接	25	个	818	
23	PPR弯头	25	个	800	



胡龙斐

李博


李实行

24	PB管道, S5	25	米	3600	
25	PB管堵头	25	个	560	
26	地漏	50	个	984	
27	洗衣机地漏	50	个	216	
28	PPR截止阀门	25	个	340	
29	变径 (补芯)	110*50	个	100	
甲方签字	 质量验收结果: 合格 2021.9.1				
乙方签字	 质量验收结果: 合格 2021.9.1				
监理签字	 质量验收结果: 合格 2021.9.1				
施工签字	 质量验收结果:				

给排水及采暖管材管件验收单 (四方签字单)






序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	pvc实壁管	D75	米	740	
2	pvc实壁管	D110	米	1400	
3	螺旋管	D110	米	1600	
4	H管	D110	个	272	
5	伸缩节	D110	个	1000	
6	检查口	D110	个	700	
7	45度弯头	D110	个	160	
8	检查口	D75	个	70	
9	伸缩节	D75	个	230	
10	顺水三通	D110*50	个	700	
11	地漏	D50	个	1400	
12	洗衣机地漏	D50	个	254	
13	PPR弯头	D25	个	200	
14	90弯头	D110	个	700	
15	瓶口三通	D110*50	个	270	
16	45度弯头	D110	个	98	
17	透气帽	D75	个	12	
18	顺水三通	D75*50	个	230	
19	检查口	D50	个	15	
20	pvc直接	D110	个	150	
21	透气帽	D110	个	40	
22	pvc直接	D75	个	100	
23	PPR-给水管材	D25	米	1000	



胡龙斐



李实行

李博

24	PPR-90度弯头	D25	个	500
25	PB-堵头	D25	个	200
26	PVC三通	D50	个	500
27	PVC-阻火圈	D110	个	400
甲方签字	<p>范元修 2021.10.28</p> <p>质量验收结果: 合格</p> 			
乙方签字	<p>刘... 2021.10.28</p> <p>质量验收结果: 合格</p> 			
监理签字	<p>李... 2021.10.28</p> <p>质量验收结果: 同意验收</p> 			
施工签字	<p>王... 2021.10.28</p> <p>质量验收结果: 合格</p> 			

给排水及采暖管材管件验收单（四方签字单）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	PVC实壁管	110	米	4764	保利
2	PVC实壁管	75	米	684	保利
3	PVC螺旋管	110	米	2184	保利
4	PVC实壁管	50	米	6000	保利
5	H管	110	个	274	保利
6	伸缩节	110	个	1225	保利
7	检查口	110	个	918	保利
8	45度弯头	110	个	416	保利
9	斜三通	110	个	68	保利
10	顺水三通	110	个	735	保利
11	顺水三通	110*50	个	602	保利
12	P弯	50	个	560	保利
13	S弯	50	个	1727	保利
14	45度弯头	50	个	873	保利
15	90度弯头	110	个	270	保利
16	瓶口三通	110*50	个	679	保利
17	顺水三通	75*50	个	230	保利
18	检查口	75	个	66	保利
19	90度弯头	50	个	1315	保利
20	伸缩节	75	个	230	保利
21	透气帽	110	个	60	保利
22	透气帽	75	个	12	保利
23	阻火圈	110	个	1255	鹰环
24	补芯	110*50	个	260	保利
25	PPR给水, S5	25	个	4416	保利
26	PPR直接	25	个	838	保利
27	PPR弯头	25	个	1040	保利



胡成斐
李实行
曹博
范祥

28	PPR截止阀	25	个	292	保利
29	暖气PB管, S5	25	个	5296	保利
30	堵头	25	个	1054	保利
31	无水封地漏	50	个	1211	昌盛
32	洗衣机地漏	50	个	373	昌盛
33	伸缩节	50	个	30	保利
34	检查口	50	个	10	保利
甲方签字	 质量验收结果: 合格 范天解 2021.6.29				
乙方签字	 质量验收结果: 合格 胡右建 2021.6.29				
监理签字	 质量验收结果: 合格 高峰 2021.6.29				
施工签字	 质量验收结果: 合格 王博文 2021.6.29				
