






罚 款 单

项目名称	中浩德·山水文苑	联系单编号	FK-92
合同名称	宜阳山水文苑项目供配电工程施工合同	合同编号	SSWY.01-JA-083
主送单位	洛阳龙羽电气设备有限公司		
抄送单位	河南海纳建设管理有限公司		
事由	关于桥架迟迟不进场的处罚的通知		
<p>内容：</p> <p>由你司承建的宜阳山水文苑项目供配电工程，自3月5日复工以来，桥架迟迟不能进场，多次催促仍不见效，已不能满足项目要求，进度严重滞后，导致后续工程无法进行。针对此种情况，现处于2000元的处罚以示警告，望你单位积极组织桥架及其施工人员进场施工，保证项目进度要求。</p> <p style="text-align: center;">下无正文。</p>			
责任工程师：（签字） 		工程经理：（签字） 	
日期：2022.3.11		 日期：2022年3月11日	

罚 款 单

项目名称	中浩德·山水文苑	联系单编号	FK-94
合同名称	宜阳山水文苑项目供配电工程施工合同	合同编号	SSWY. 01-JA-083
主送单位	洛阳龙羽电气设备有限公司		
抄送单位	河南海纳建设管理有限公司		
事 由	关于桥架迟迟不进场的处罚的通知		
<p>内容：</p> <p>由你司承建的宜阳山水文苑项目供配电工程，自3月5日复工以来，桥架迟迟不能进场，多次催促仍不见效，已不能满足项目要求，进度严重滞后，导致后续工程无法进行。针对此种情况，现处于2000元的处罚再次予以警告，望你单位积极组织桥架及其施工人员进场施工，保证项目进度要求，如不能有明显改观，将累计从重处罚。</p> <p style="text-align: center;">下无正文。</p>			
责任工程师：（签字） 		工程经理：（签字） 	
日期： 2022.3.12		日期： 2022年3月12日	

罚 款 单

项目名称	中浩德·山水文苑	联系单编号	FK-104
合同名称	宜阳山水文苑项目供配电工程施工合同	合同编号	SSWY.01-JA-083
主送单位	洛阳龙羽电气设备有限公司		
抄送单位	河南海纳建设管理有限公司		
事由	关于现场施工进度滞后的处罚通知		

内容:

由贵司承建的宜阳山水文苑项目供配电工程，按照贵司上报的工程进度计划，桥架安装、车库内电表箱、分接箱安装应于2022年3月20日施工完成，但截止3月29日桥架、电表箱、分接箱都未安装完成，且电缆、插接母线等材料尚未进场，施工进度已经严重滞后，多次催促仍不见效，已不能满足项目进度要求，针对此种情况，现对贵司处于2000元的处罚警告，望你单位积极组织施工，加班加点保证项目进度要求，如不能有明显改观，后续将从重处罚。

后附宜阳山水文苑项目供配电工程进度计划。

责任工程师：（签字）



苗天峰

日期：2022.3.29




工程经理：（签字）

山水文苑工程部
日期：2022年3月29日

工作联系单

项目名称	中浩德·山水文苑	联系单编号	410
合同名称	宜阳山水文苑项目供配电工程施工合同	合同编号	SSWY.01-JA-083
主送单位	洛阳龙羽电气设备有限公司		
抄送单位	河南海纳建设管理有限公司		
事由	关于宜阳山水文苑项目采光井材料吊装事宜		
<p>内容：</p> <p>由贵司承建的宜阳山水文苑项目供配电工程，因你单位从10号楼西南角采光井吊装电缆，将总包单位砂浆材料吊出来，且未放回原处，对施工现场管理协调造成恶劣影响，我方安排第三方将材料运回原处，产生所有费用800元，经与你方沟通，要求支付现场所发生费用，你方不予支付，此费用从你方工程款扣除！</p> <p>下无正文</p>			
责任工程师：（签字） 		工程经理：（签字）  日期：2022年4月21日	

工 作 联 系 单

项目名称	中浩德·山水文苑	联系单编号	461
合同名称	中浩德山水文苑	合同编号	/
主送单位	河南玖恒建设工程有限公司 郑州诺金装饰工程有限公司 淄博消防安全工程公司 洛阳坤宏建设集团有限公司 洛阳龙羽电气设备有限公司 河南安华金属制品有限公司		
抄送单位	建基工程咨询有限公司		
事由	关于山水文苑垃圾清理事宜		
<p>内容：</p> <p>由你单位承建的山水文苑项目，各楼栋室内遗留垃圾，严重影响分户验收工作，现场交房关门群内安排各单位垃圾清理，在清理过程中有个别单位人员不足，需安排第三方代清，以实际发生为准，所产生费用扣除。特此通知！</p> <p>下无正文</p>			
责任工程师：（签字）  日期：2022.4.28		工程经理：（签字）   日期：2022.4.28	

工 作 联 系 单

项目名称	中浩德·山水文苑	联系单编号	464
合同名称	/	合同编号	/
主送单位	以下各参建单位		
抄送单位	建基工程咨询有限公司		
事由	关于室内电梯使用过程中损坏部件及相关费用分摊事宜		

内容：

在室内电梯使用过程中，电梯轿厢灯具、电梯呼叫盒等被损坏以及其它相关费用共计 16450*1.2=19740 元，由所有使用过电梯的单位进行分摊，在工程进度款中扣除。相关费用明细及照片见附表，分摊单位及分摊比例如下：

中国建筑第七工程局有限公司（水电、防水、批白、屋面瓦、二次结构维修、墙地砖、垃圾清运等）	30%（5992 元）
河南玖恒建设工程有限公司（门窗）	30%（5992 元）
淄博消防安全工程公司（消防）	5%（987 元）
河南聚泰实业有限公司（防火门）	5%（987 元）
河南安华金属制品有限公司（栏杆、百叶）	5%（987 元）
浙江星月安防科技有限公司（入户门）	5%（987 元）
上海文宇建设集团有限公司（外墙漆）	5%（987 元）
郑州诺金装饰工程有限公司（外墙漆）	5%（987 元）
洛阳坤宏建设集团有限公司（大堂装修）	5%（987 元）
河南腾翔建筑工程有限公司（三方）	2.5%（493.5 元）
洛阳龙羽电气设备有限公司（电力）	2.5%（493.5 元）

下无正文

责任工程师：（签字）

工程经理：（签字）

范云峰

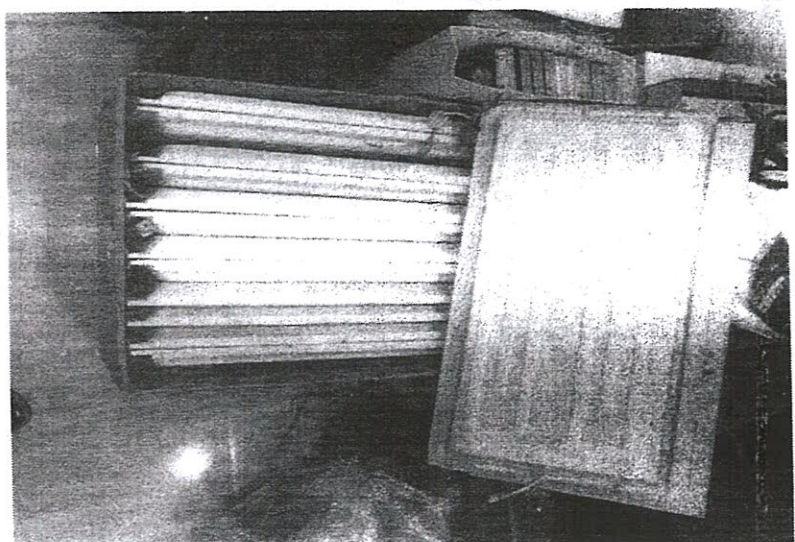
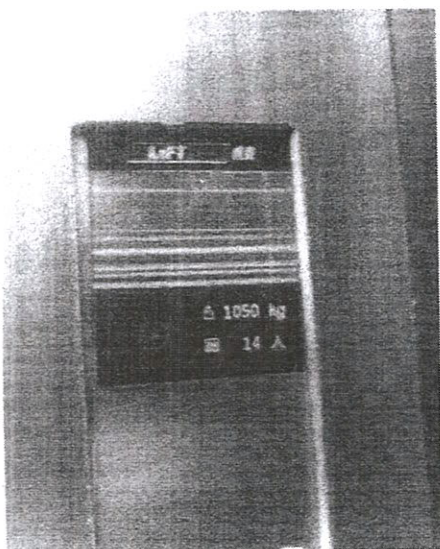
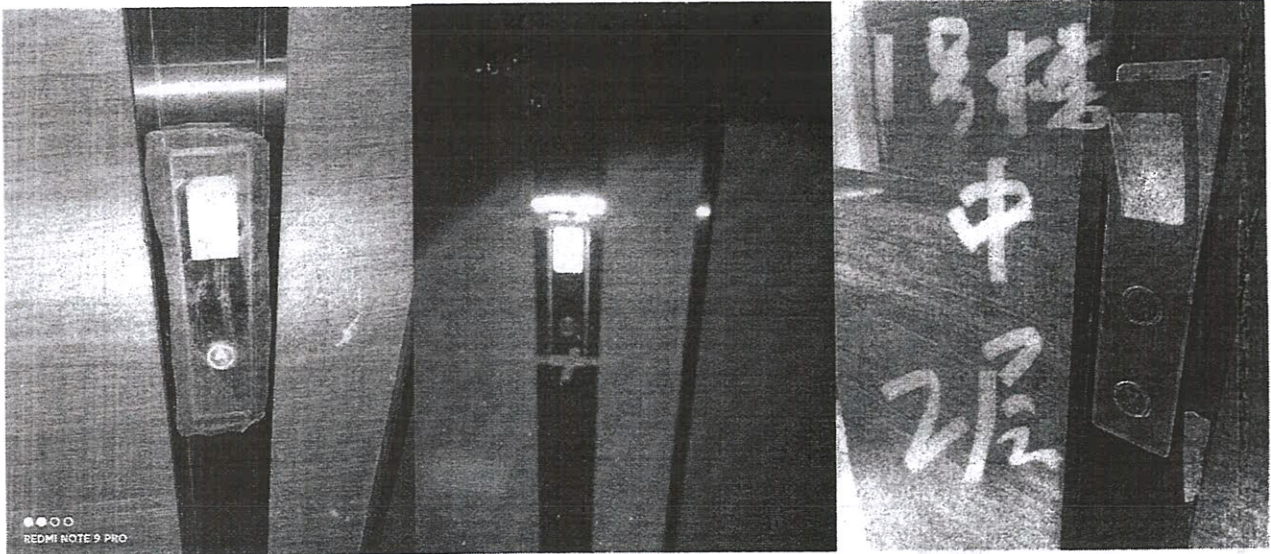
2022.6.24



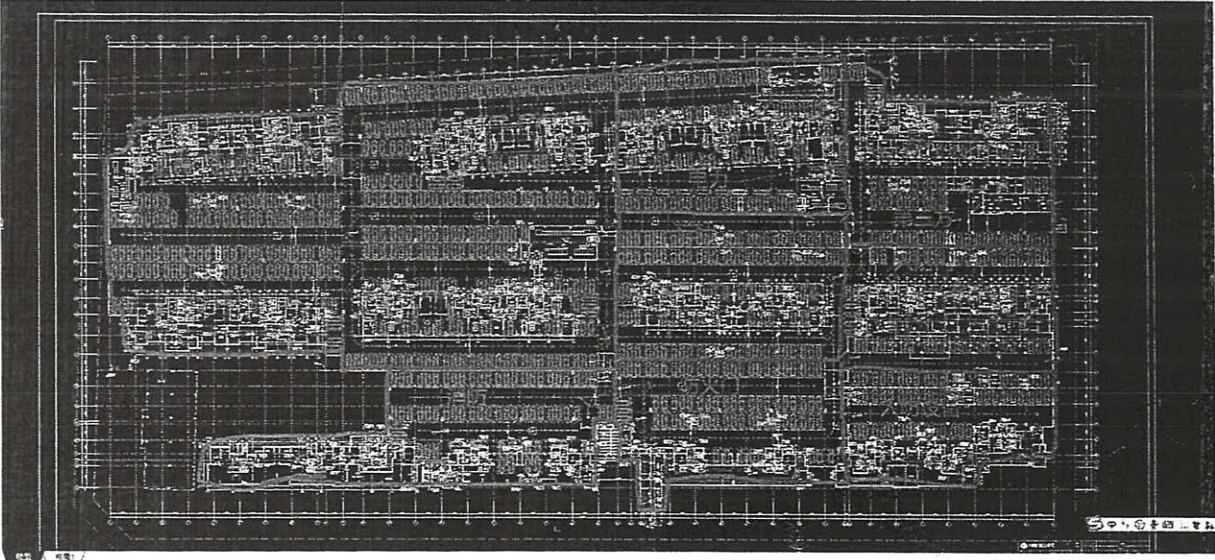

日期：2022 年 6 月 24 日

宜阳山水文苑电梯损坏配件及费用明细

零部件报价清单					
料号	品名	数量	单位	价格(元)	总价(元)
A820000089	LIOP-LUL11 中间层	8	个	780	6240
A820000091	LIOP-LUL11 底层	2	个	740	1480
A820000092	LIOP-LUL11 顶层	2	个	740	1480
A820000096	轿厢照明灯管	9	个	360	3240
	轿厢照明亚克力板	4	个	90	360
	轿厢 COP 显示屏	1	个	2400	2400
	基坑检修盒	2	个	360	720
	称重感应器	1	个	530	530
合计		16450 元 (壹万陆仟肆佰伍拾元整)			
以上价格为不含票、不含税价格。					



工作联系单

项目名称	中浩德·山水文苑	联系单编号	425
合同名称	中浩德山水文苑	合同编号	/
主送单位	中国建筑第七工程局有限公司 河南安华金属制品有限公司 河南聚泰实业有限公司 洛阳龙羽电气设备有限公司 河南腾翔建筑工程有限公司 淄博消防安全工程公司 河南省高星实业股份有限公司 河南赛福特防护设备有限公司		
抄送单位	建基工程咨询有限公司		
事由	关于山水文苑地下车库垃圾清理事宜		
<p>内容：</p> <p>由你单位承建的山水文苑项目，地下车库垃圾已影响下步工序施工，现已按施工作业面划分，要求2日内清理完毕，如不清理由第三方代清，费用扣除！</p> <p>下无正文</p>			
			
责任工程师：（签字） 	工程经理：（签字） 
