

考核单

工程名称：悠然居项目

编号：三贝-20250509


致：三贝建筑工程有限公司

内容：

在现场安全文明施工检查中，发现你单位现场临时配电箱存在以下问题：

- 1、5月份无巡检记录；
- 2、箱内无跨接线。

现根据《悠然居项目现场管理办法》，对你单位进行 300元（大写：贰佰元整）考核，请你单位高度重视此问题，抓紧时间落实整改，并尽快将考核金额缴至建设单位；如仍拒不整改，将继续考核。

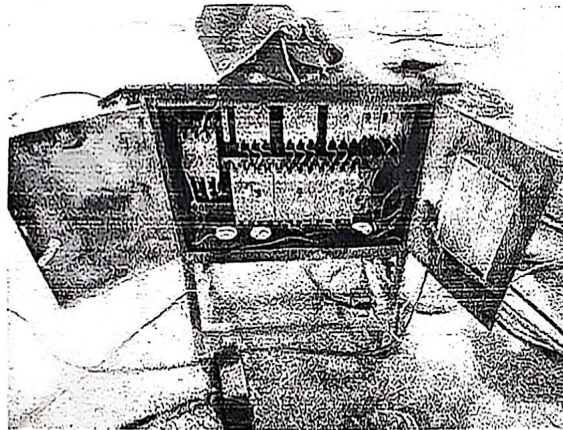

监理单位签字：

[Handwritten Signature] 2025.5.9

建设单位签字：

[Handwritten Signature] 2025.5.9

考核单

工程名称: 悠然居项目

编号: 三贝-20250511


致: 三贝建筑工程有限公司

内容:

在现场安全文明施工检查中, 发现你单位现场临时配电箱存在以下问题:

- 1、现场配电箱存在安全隐患, 监理部在 5 月 9 日已下单通知你单位进行整改, 至今未见整改, 且存在一级多闸现象;
- 2、配电箱巡检记录有造假情况。

现根据《悠然居项目现场管理办法》, 对你单位进行 300 元 (大写: 叁佰元整) 考核, 请你单位高度重视此问题, 抓紧时间落实整改, 并尽快将考核金额缴至建设单位; 如仍拒不整改, 将继续考核。

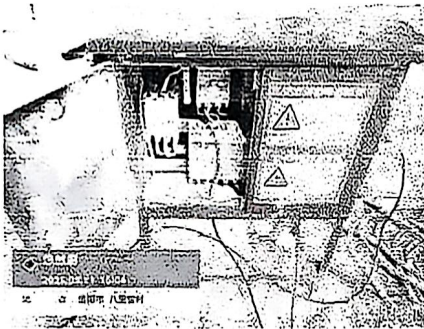

监理单位签字:

闫文超 2025.5.11

建设单位签字:

张 陈 2025.5.11

考核单


工程名称：悠然居项目

编号：三贝-20250512

致：三贝建筑工程有限公司

内容：

1、你单位现场 1#、2#楼之间地下车库临时配电箱存在存在一闸多机的问题，现根据《悠然居项目现场管理办法》，对你单位进行 300 元（大写：叁佰元整）考核，请你单位高度重视此问题，抓紧时间落实整改，并尽快将考核金额缴至建设单位；如仍拒不整改，将继续考核。

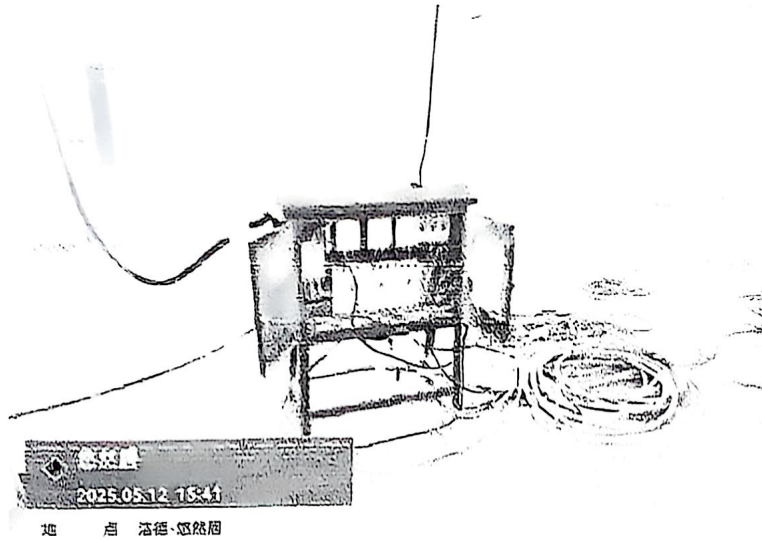

监理单位签字：




刘丁波 2025.5.12

建设单位签字：

张景浩

陈卓 2025.5.12

工 作 联 系 单

项目名称	悠然居	联系单编号	322
主送单位	郑州三贝建筑工程有限公司		
抄送单位	中机十院国际工程有限公司、集团成本管理部		
事由	关于车库地坪施工节点滞后考核事宜		
<p>内容：</p> <p>由贵司施工的悠然居项目车库彩石地坪工程，近期，车库水磨石地坪施工出现不同程度滞后问题，我司已于2025年5月7日下发贵司《关于车库地坪施工节点事宜》联系单，并要求车库剩余地坪浇筑需于2025年5月10日前浇筑完成，至今已2025年5月12日，车库地坪浇筑尚未完成，按照双方合同条款第十六条“3、乙方存在其他任何逾期违约行为但未达到甲方行使单方解除条件的，每逾期一日，按2000元/日向甲方支付违约金”，现对贵司进行4000元（人民币肆仟元整）考核，相关考核金额从贵司工程款中扣除。</p> <p>以上问题，请贵司落实材料、人员、设备加快施工，并于2025年5月15日前完成，逾期如未完成，将追加考核，谢谢合作。</p> <p>下无正文</p>			
责任工程师：（签字）		工程经理：（签字）	
			
		日期：2025 年 月 日	
