





工程签证审批单

编号:

项目名称	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部	工程名称	中浩德·山水文苑 S1 地块
归属合同	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部施工总承包合同	合同编号	LCS1-JA-016
签证部位	西大门地坪植筋、钢筋网片		
施工单位	河南诚鹏建设工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容:</p> <p>由我单位施工的中浩德·山水文苑西大门工程: 依据建设单位下发的工作联系单(联系单编号 20230918-001) 内容, 我单位已经完成西大门地面增加构造钢筋植筋、钢筋网片绑扎及 100 厚 C25 细石砼地面等全部工作内容, 其工程量及产生费用如下:</p> <p>1、三级钢 8 植筋: 572 根;</p> <p>2、三级钢 8@200 钢筋网片: $(3.8*20+20*0.6) *12+ (2.15*12+12+0.6) *4*2+ (7.7*40+40*0.6) *4+ (3.2*17+17*0.6) *2+ (4*21+21*0.6) *2=2970.4m$; 合计 $2970.4*0.395=1173kg$;</p> <p>3、100 厚 C25 细石混凝土地坪 99.45m²。</p> <p>以上产生费用金额共计 26,831.65 元, 大写: 贰万陆仟捌佰叁拾壹元陆角伍分(详见附件一预算书)</p> <p>请监理、建设单位对以上产生费用予以签证。</p> <p>附件: 附件一: 费用预算书 附件二: 建设单位下发的联系单(联系单编号 20230918-001) 附件三: 现场影像资料</p> <p>施工单位经办人(签字盖章)  日期: 2023.10.21</p>		
监理单位	<p>施工内容属实</p> <p>监理工程师: (签字盖章)  日期: 2023.10.22</p> <p> 栾川项目监理部</p>		
项目工程部	<p>施工内容属实, 请成本核算。</p> <p>专业工程师或经理: 秦亚南 日期: 2023.11.12</p> <p>工程总监:  日期: 2023.11.12</p>		
成本管理部	<p>合同预算价需扣除地坪预算, 按此签证计入结算</p> <p>专业成本管理岗: 此签证费用为 8800 元。 日期:</p> <p>部门经理: 张磊 2023.12.5 日期:</p>		

项目总经理意见	侯飞 日期: 2023.12.7
工程管理部意见	日期:
成本管理部意见	日期:
大运营中心意见	日期:
总裁意见	日期:
首席运营官意见	日期:
首席执行官意见	日期:
董事会/董事长意见	日期:

注: 1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份。


2、现场签证单<10万元, 由总裁审批; 现场签证单<30万元, 由首席执行官审批; 现场签证单≥30万元, 需董事长审批。

附件二：建设单位下发的工作联系单（联系单编号 20230918-001）

文川县浩德房地产开发有限公司

工程

工作联系单

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目	联系单编号	20230918-001
合同名称	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部施工总承包合同	合同编号	LCS1-JA-016
主送单位	河南诚鹏建设工程有限公司；成本部		
抄送单位	建基工程咨询有限公司		
事由	关于 S1 地块西大门及社区服务中心地坪事宜		
内容：	<p>根据现场施工情况，经与设计单位沟通，现联系你单位以下事宜：</p> <p>1、S1 地块西大门及 20#楼物业服务用房，因回填土土高度超 4 米，地面需增加构造钢筋网片，现场做 100 厚 c25 混凝土，三级钢 8@200 锚到梁内，以防止后期沉降。</p>		
责任工程师：（签字）	项目工程总：（签字）		
秦正南			
日期：2023年9月18日			

附件三：现场影像资料




活体·山水文苑

施工区域：S1-西大门 天气：雾 9℃
施工内容：地坪钢筋绑扎 地点：栾川县·鸿滩村
拍摄时间：2023.10.05
16:25:37


建设单位：栾川县浩德颐康文旅有限公司 施工单位：河南程鹏建设工程有限公司
监理单位：建基工程咨询有限公司



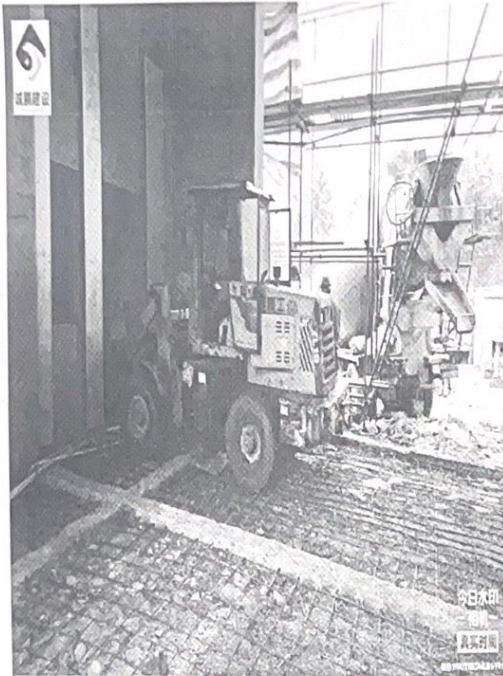

浩德·山水文苑

施工区域: S1-西大门
 天气: 大雨 7°C
 施工内容: 地坪找平
 地点: 栾川县·两湾村
 拍摄时间: 2023.10.06 08:33:19
 建设单位: 栾川县浩德康旅文化旅游有限公司
 施工单位: 河南程鹏建设工程有限公司
 监理单位: 建基工程咨询有限公司

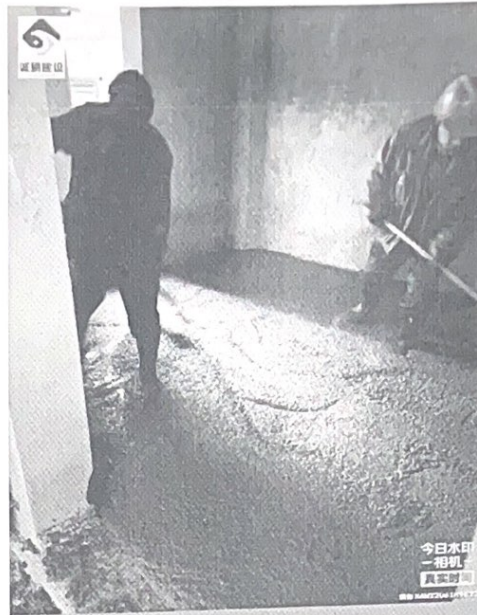

浩德·山水文苑

施工区域: S1-西大门
 天气: 大雨 7°C
 施工内容: 地坪找平
 地点: 栾川县·两湾村
 拍摄时间: 2023.10.06 08:33:48

建设单位: 栾川县浩德康旅文化旅游有限公司
 施工单位: 河南程鹏建设工程有限公司
 监理单位: 建基工程咨询有限公司

