


# 工程签证审批单

编号: 006

项目名称	伊河湾项目	工程名称	伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程
归属合同	伊河湾项目展示区景观停车场及EPDM地垫等零星工程合同	合同编号	YHW-JP-035
签证部位	伊河湾示范区抢工		
施工单位	郑州保民建筑材料有限公司		
签证内容	<p>内容:</p> <p>为保证售楼部按期开放,售楼部两侧景观区一、二及消防门等部位垫层合同漏项,根据贵公司工程部于2023年5月1日派发任务要求,施工以下内容及工程量:</p> <p>1、保民建筑材料有限公司综合施工明细表(合同漏项内容)。</p> <p>见附件:</p> <p>施工单位经办人:(签字盖章)  日期: 2024.6.26</p>		
监理单位意见	<p>组完拉上建完成2个号符合合同约定请建设单位审批为盼。</p> <p>监理工程师:(签字盖章)  日期: 2024.6.26</p>		
项目工程部意见	<p>情况属实</p> <p>专业工程师或经理:  日期: 2024.6.26</p> <p>工程总监:  日期: 2024.6.26</p>		

成本管理部 意见	<p>根据监理确认事故现场核对景观区一二消防门位置基层为合同漏项,委托三方单位施工,测算金额达263.53元</p> <p>专业成本管理岗: 胡叙杰 日期: 2024.6.28</p> <p>部门经理: 日期:</p>
项目总经理 意见	日期:
工程管理部 意见	日期:
成本管理部 意见	日期:
大运营中心 意见	日期:
总裁意见	日期:
首席运营官 意见	日期:
首席执行官 意见	日期:
董事会/董事 长意见	日期:

注: 1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元, 由总裁审批; 现场签证单<30万元, 由首席执行官审批; 现场签证单≥30万元, 需董事长审批。

保民建筑材料有限公司综合施工明细表（景观合同漏项内容）

日期	施工内容	单位	工程量	备注
2023年5月5日	平整压实空调基础周边土方，毛料	个	1.00	技工
		台班	1.00	60挖机1个台班
	平整压实售楼部景观区一、二垫层	个	5.00	技工
		台班	1.50	微挖机1个台班
2023年5月6日	浇筑售楼部东侧景观区一垫层，空调基础垫层	个	4.00	普工
		m3	8.93	c20混凝土，厚度15cm
2023年5月7日	浇筑景观区二混凝土垫层	个	2.00	普工
		m3	6.28	c20混凝土，景观区厚度15cm，围挡下方厚度6cm
		m2	12.00	4@150网片6张，2m2/张
2023年5月11日	停车场内翻运垃圾土，停车场垃圾土方外运	车	9.00	垃圾车（后八轮）291/8*20=727.5
		台班	3.00	150型皮轮挖
2023年5月12日	停车场南边市政绿化带拆除，挖机配合挖树，拉绿化带垃圾	台班	1.50	150型皮轮挖
		车	9.00	含垃圾归集、装车，运至垃圾场处理（垃圾运输车容积8m³）
	景观区二增加排水，剔凿排水沟	个	4.00	技工
		个	1.00	普工
2023年5月13日	景观区二增加排水，剔凿两人排水沟	个	4.00	技工
		个	1.00	普工
2023年5月22日	晚上打入口水景南边市政人行道垫层，售楼部消防门口垫层	m3	1.03	c30混凝土
2023年5月26日	售楼部东西消防门外侧混凝土垫层浇筑	m3	1.61	c20混凝土6cm

王保民

韩钢强



胡敏杰

平均宽度0.42m.

工地围挡西侧市政人行道中间垫层

长度219m.

平均厚度0.2m.


郭力

王磊 2023.12.22

毛志伟 2023.12.22

胡敏杰 2023.12.22

图示尺寸

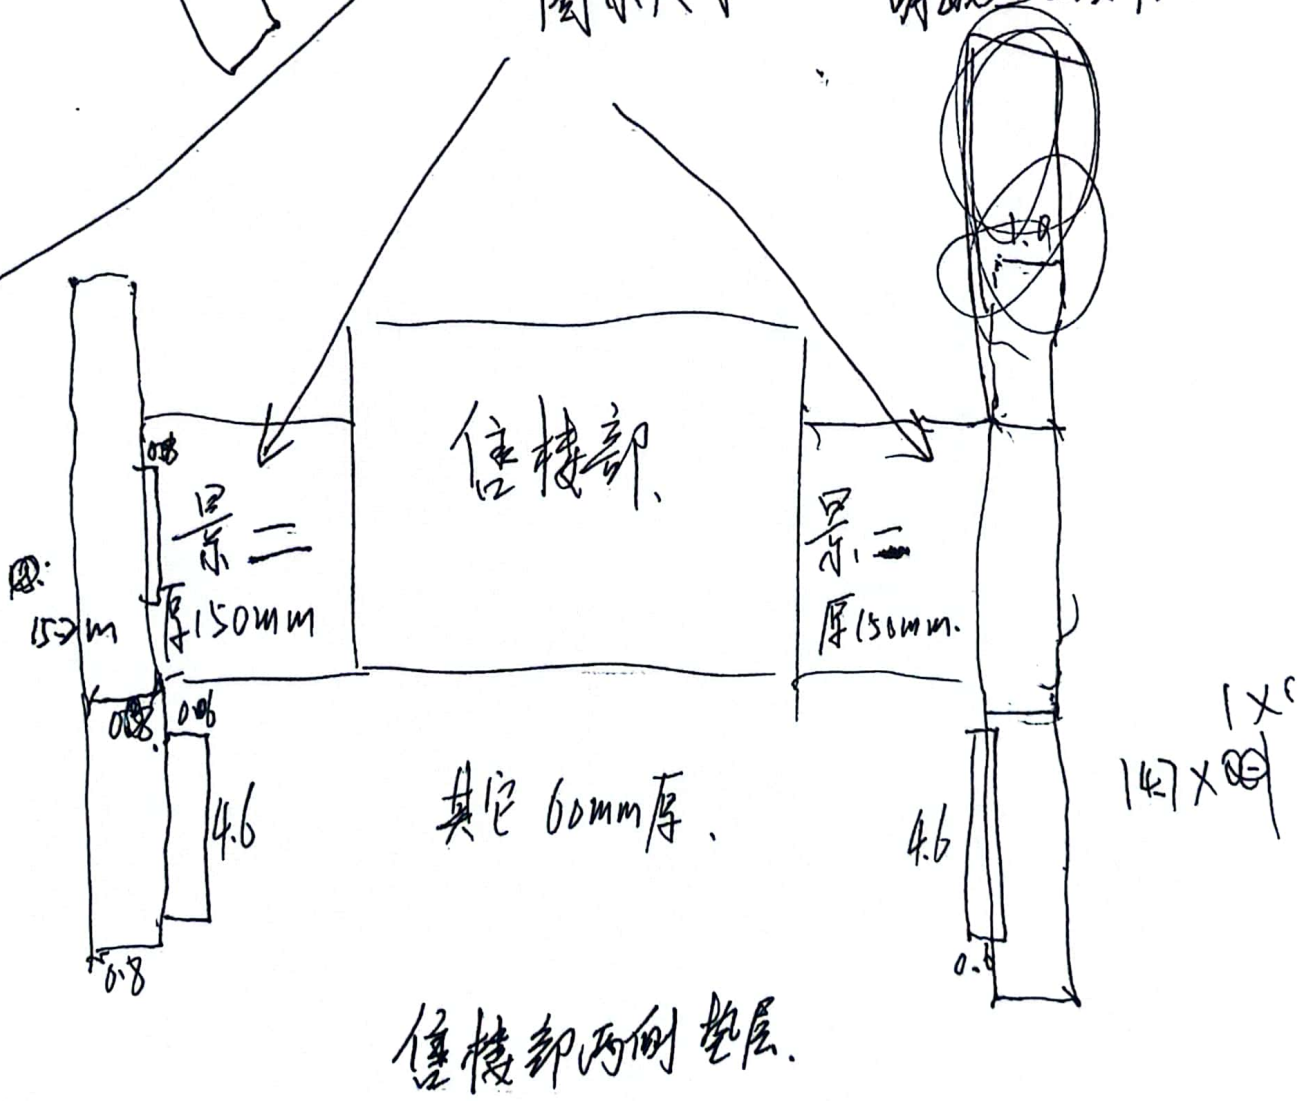

售楼部

厚150mm

厚150mm

15.2m

4.6

其它 60mm厚.

4.6

1x0  
1.47x0.8

售楼部两侧垫层.

# 售楼部消防门口垫层

