

工程签证审批单

编号：合同编号-001

项目名称	中浩德·山水文苑（棠川）	工程名称	棠川山水文苑项目 s1 地块 202 样板间露台景观
归属合同	棠川山水文苑项目 s1 地块 202 样板间露台景观合同	合同编号	LCS1-JP-112
签证部位	202 样板间露台		
施工单位	河南省臻景园林工程有限公司		
签证内容	<p>1、18mm 厚竹木平台增加工程量 2、应甲方要求竹木平台标高调整，已完成的竹木平台拆除重做 3、增加砾石</p> <p>施工单位经办人（签字/盖章）：王宝中  日期：2025.04.14</p>		
监理单位意见	<p>同意 监理工程师（签字/盖章）： 日期：2025.4.18 </p>		
项目工程部意见	<p>签证内容属实，请予审核。木作2计10个，土建2计5个。 专业工程师或经理： 日期：2025.4.18 项目工程总： 日期：</p>		
成本管理部意见	<p>经协商 2.25元 专业成本管理岗： 日期： 部门经理： 2025.6.18 日期：</p>		
项目总经理意见	<p> 日期：2025.7.15</p>		

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份；

2、现场签证单 < 10 万元，由总裁审批；现场签证单 < 30 万元，由首席执行官审批；现场签证单 ≥ 30 万元，需董事长审批。



屋顶花园景观签证报价清单

序号	分项名称	内容特征及工艺	单位	数量	单价	小计	备注
一 增加竹木							
1	18mm厚竹木饰面	1、100*18mm厚户外高耐竹木； 2、3厚50X50方钢管龙骨@500与角钢焊接 3、清理基层、试排弹线、竹木加工制作、安装、防护、清理等所有必要	m'	6.87	650	4466	
二 竹木拆除及安装							
1	工日	木作工	工	12	545	6540	不含税单价500，加9%税
2	工日	土建工	工	6	436	2616	不含税单价400，加9%税
3	工日	管理员	工	6	436	2616	不含税单价400，加9%税
4	住宿费		天	6	327	1962	不含税单价300，加9%税
5	材料损耗	竹木拆除损耗量	m'	6.91	327	2260	不含税单价300，加9%税
三 砾石							
1	砾石	砾石粒径10~20，滚圆、打蜡	项	1	4142	4142	不含税单价3800，加9%税
				合计(元)		24601	



$545 \times 2 + 436 =$
 $= 1090 + 436 = 1526$





工程记录

施工内容: 竹木地板拆改

拍摄时间: 2025.04.02 09:14

天气: 晴 13℃

地点: 栾川县·山水文苑

2025.04.14
王宇

真实时间

DRXR




工程记录

施工内容: 竹木地板拆完成, 开始
铺设

拍摄时间: 2025.04.03 09:24

天气: 晴 15°C

地点: 栾川县·山水文苑

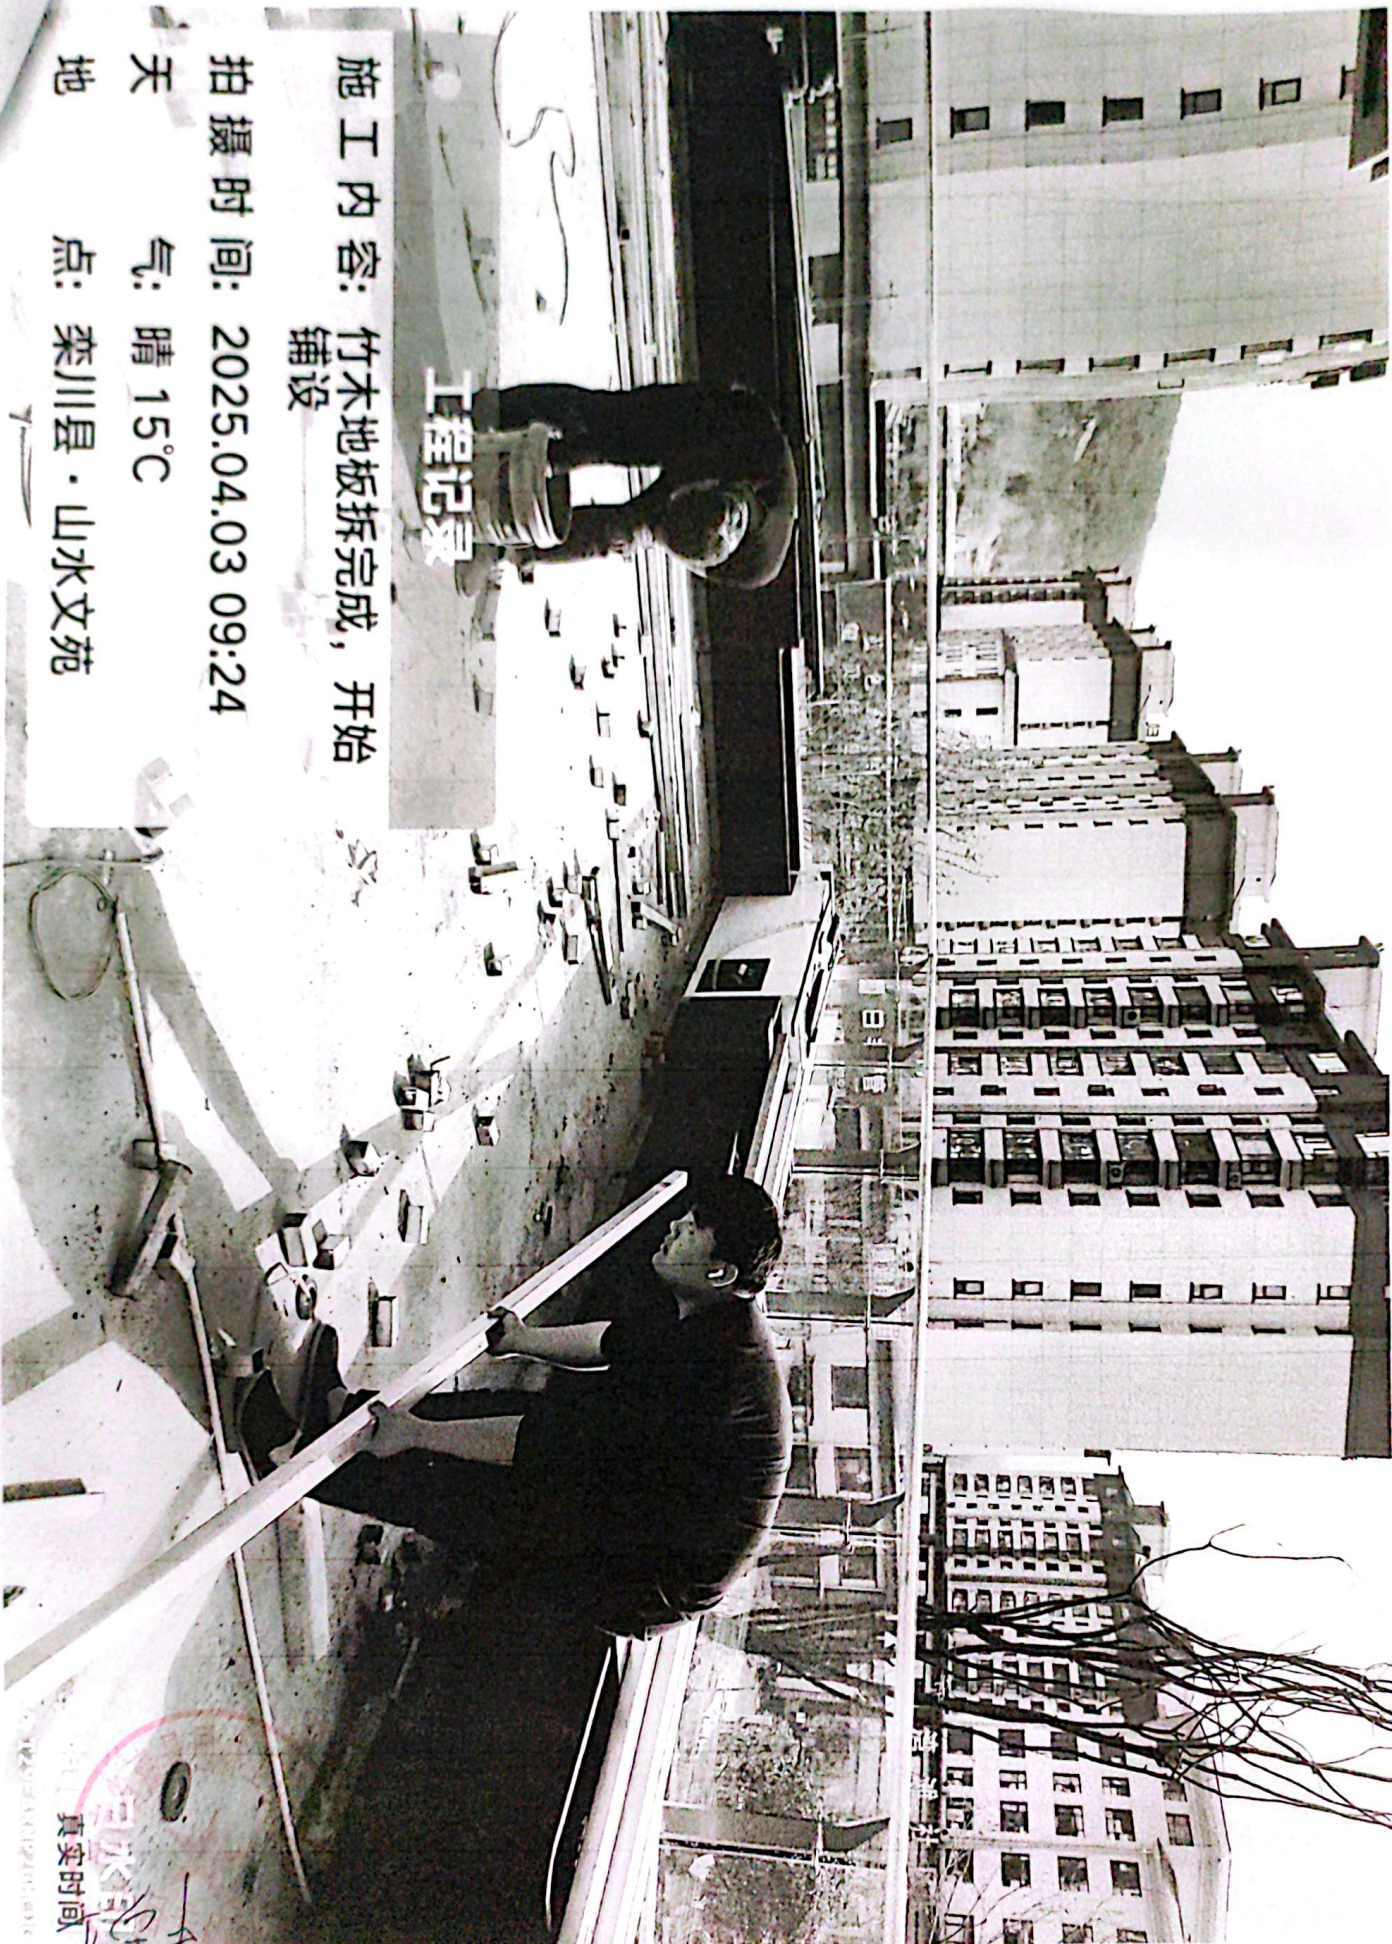

真实时间

2025.04.04



扫描全能王 创建



工程记录

施工内容: 水系抬高

拍摄时间: 2025.04.03 16:50

天气: 晴 21°C

地点: 栾川县·山水文苑


王宝中

2025.04.14

今日水印
相机 真实时间

防伪: EN258UKG1P18Y6



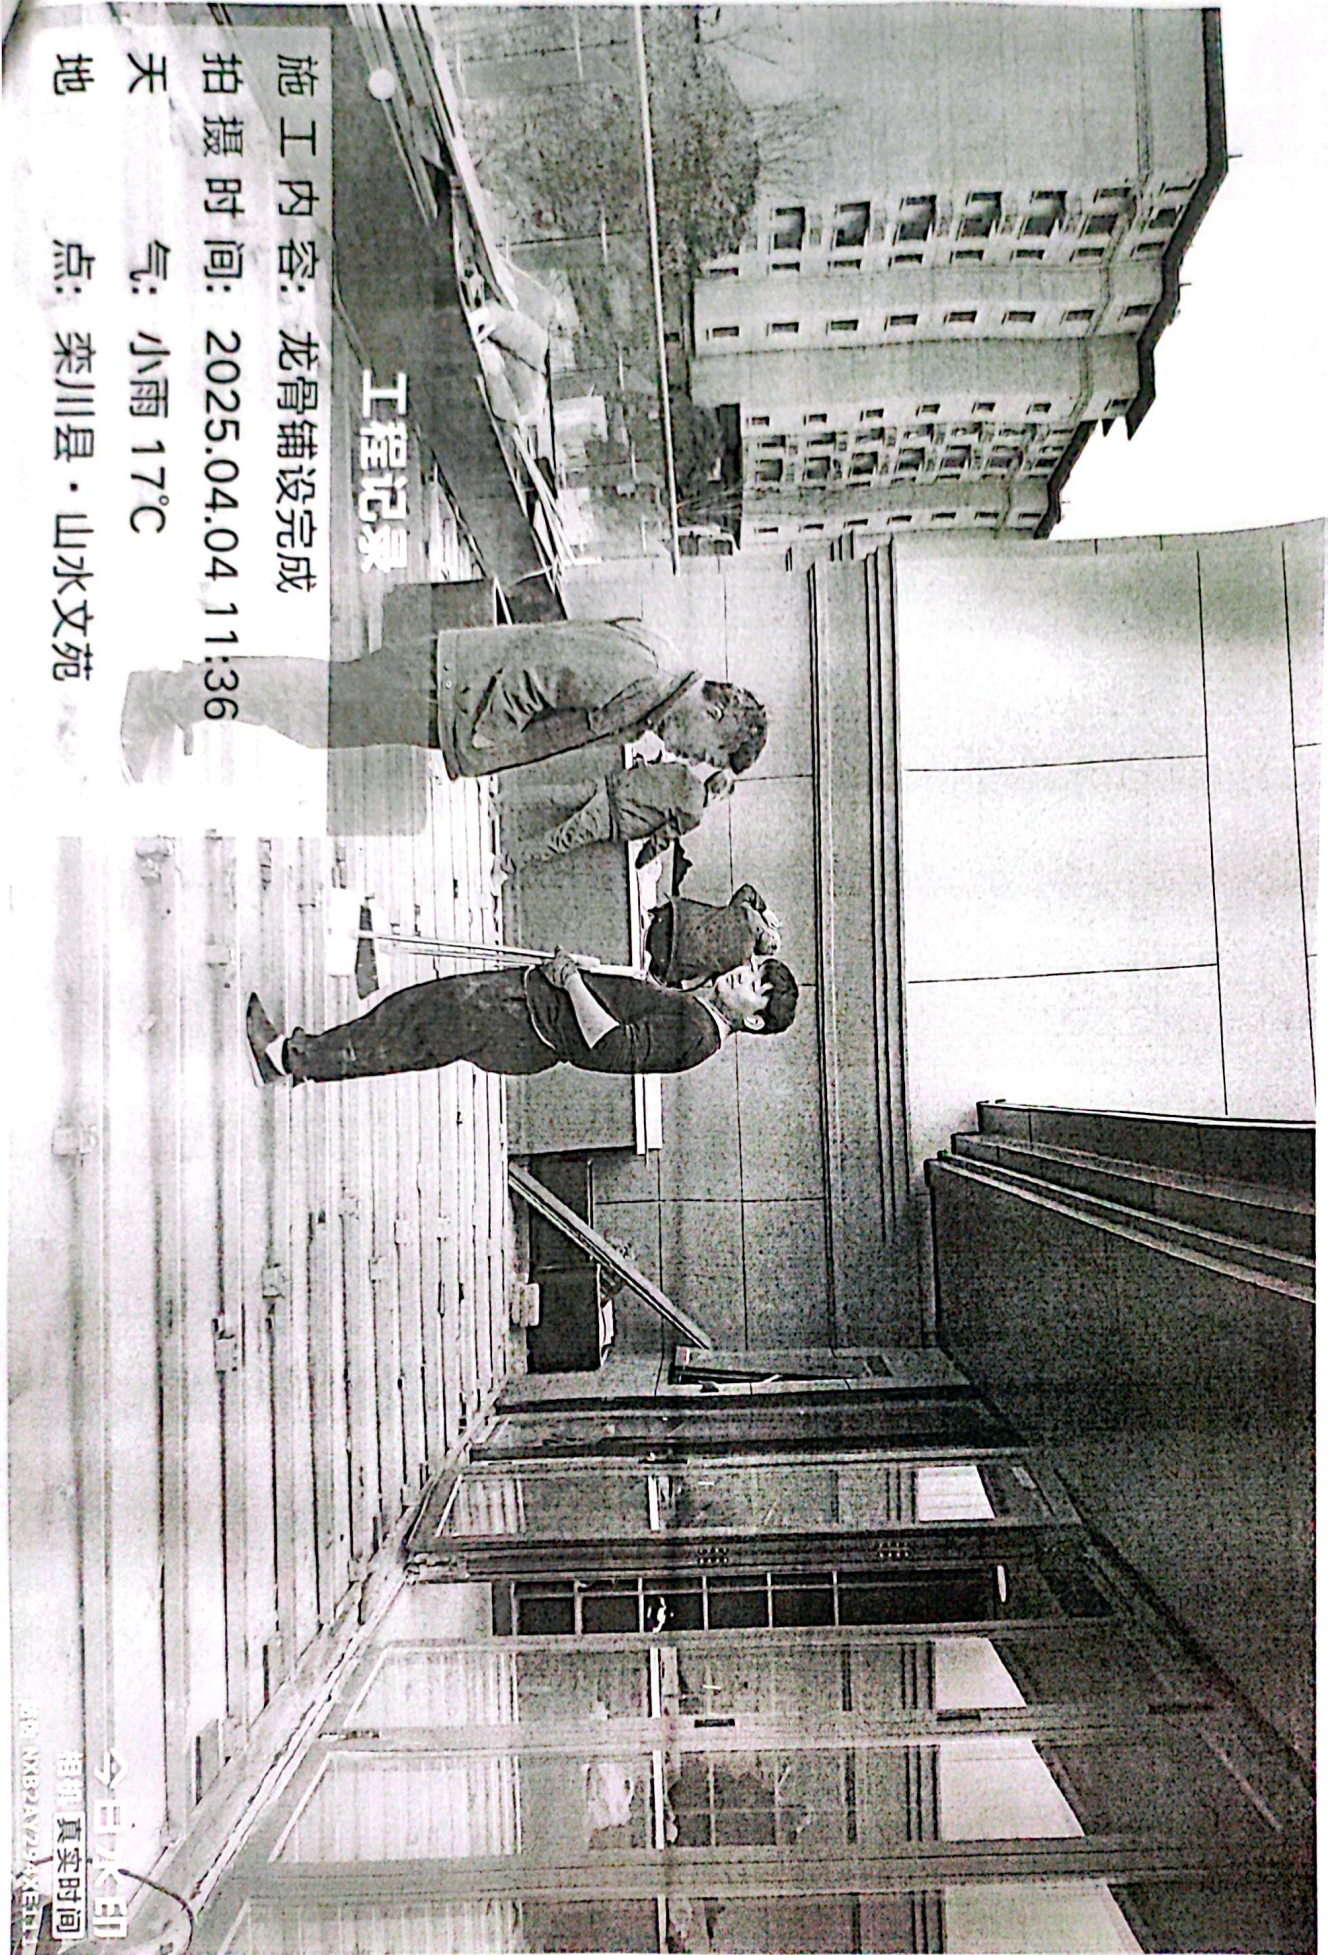

工程记录

施工内容: 龙骨铺设完成

拍摄时间: 2025.04.04 11:36

天气: 小雨 17°C

地点: 栾川县·山水文苑

今日水印

水印 真实时间

水印 1882A094XET11





工程记录

施工内容: 木作, 面层铺设。土建
灯带重新调试

拍摄时间: 2025.04.05 08:30

天气: 多云 9℃

地点: 栾川县·山水文苑


2025.04.14

真实时间

1678 on 2Y6U9974358871



扫描全能王 创建

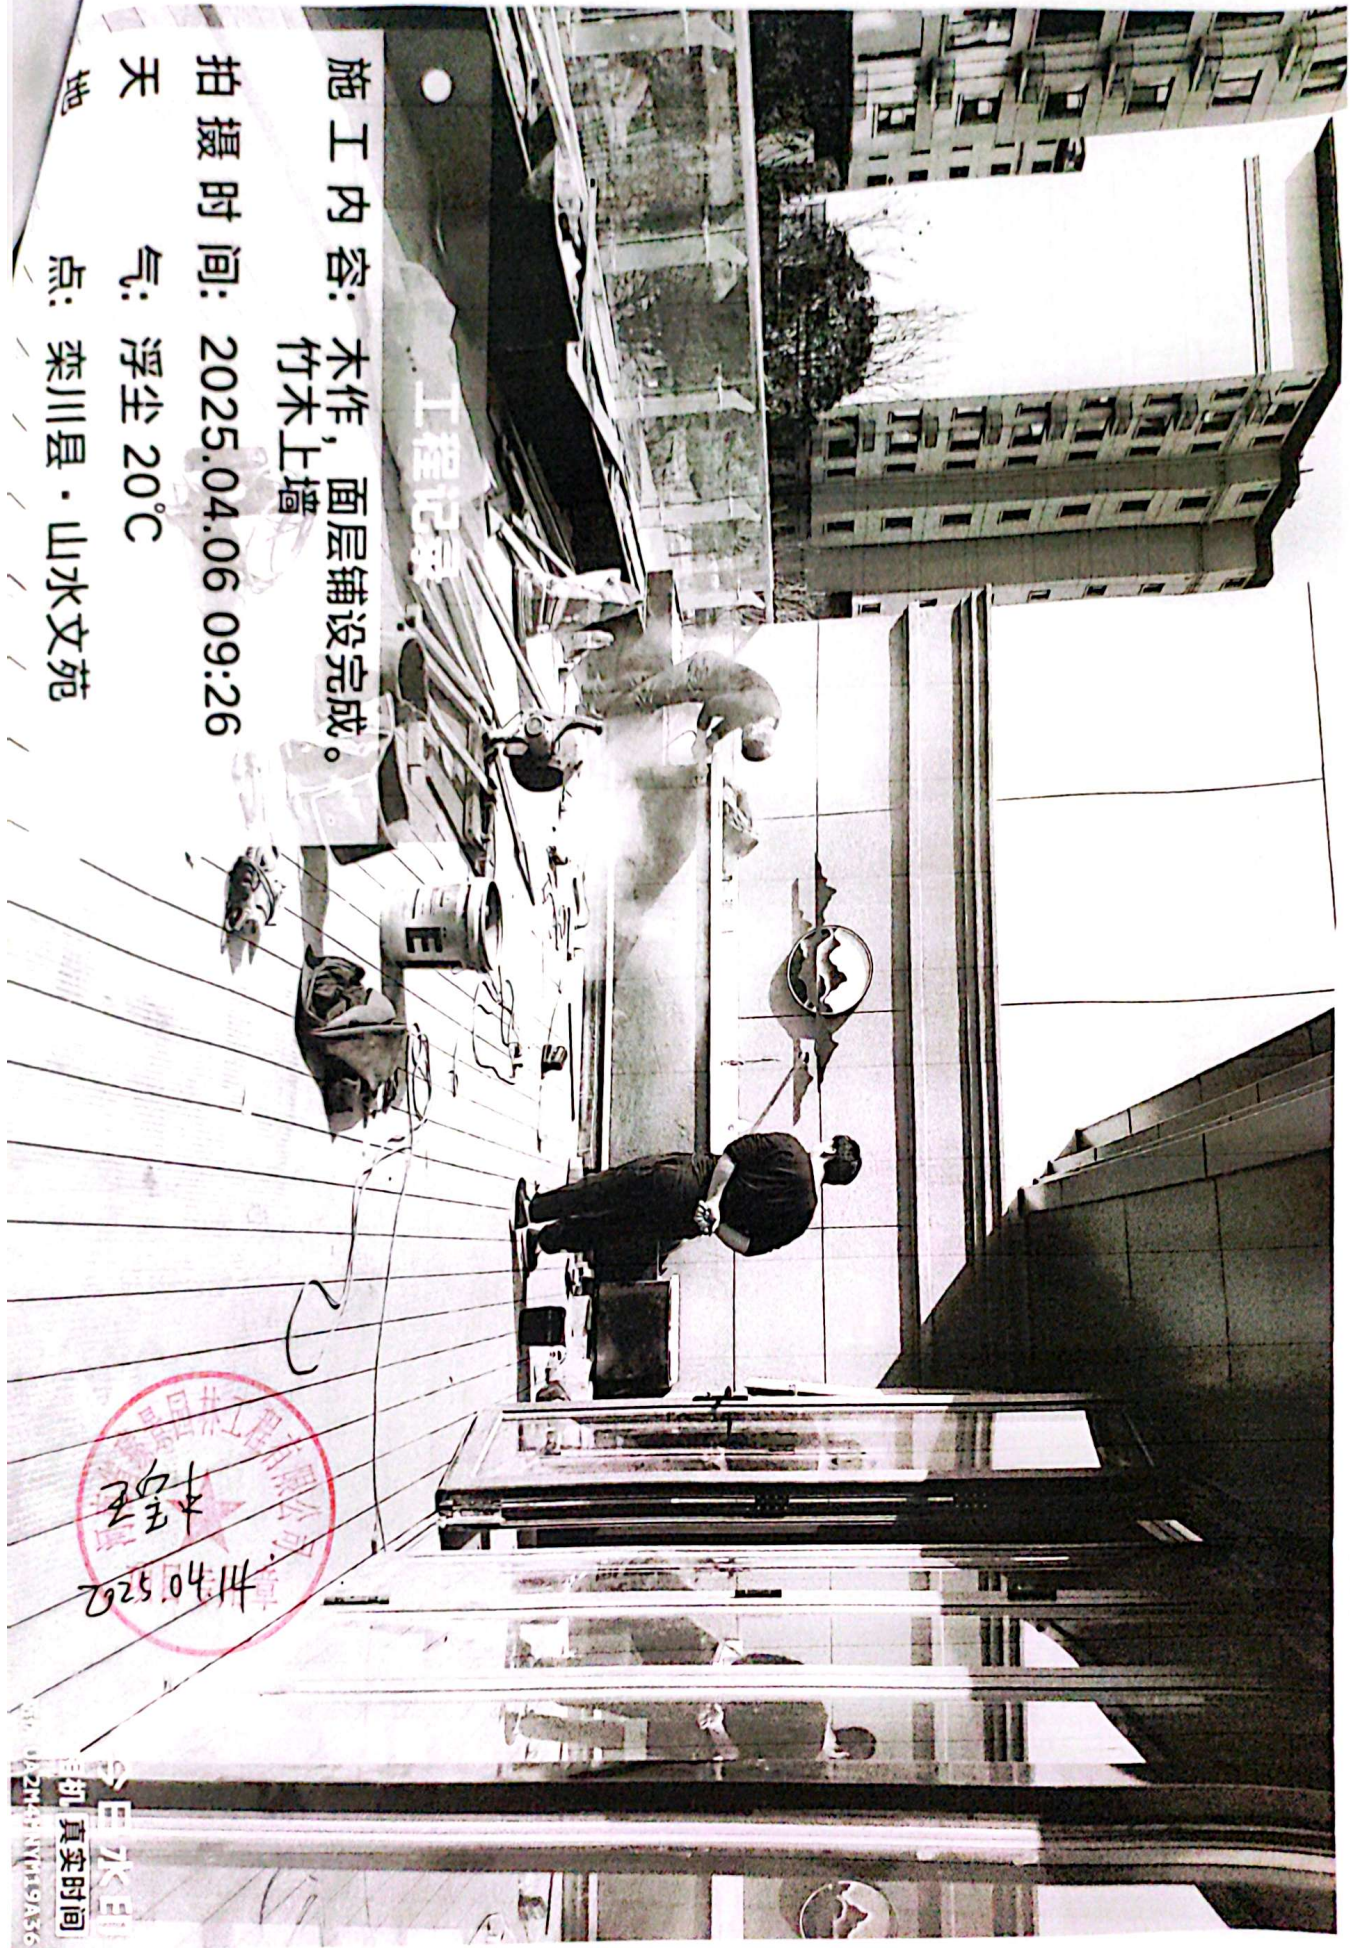

工程记录

施工内容: 木作, 面层铺设完成。
竹木上墙

拍摄时间: 2025.04.06 09:26

天气: 浮尘 20°C

地点: 栾川县·山水文苑

栾川县山水文苑工程
2025.04.06
程

今日水印
手机 真实时间
40 06-21-43 NY119A36



工程记录

施工内容: 木作, 面层铺设完成。
女儿墙竹木上墙

拍摄时间: 2025.04.07 09:11


天气: 浮尘 21℃

地点: 栾川县·山水文苑



全景水印
真实时间



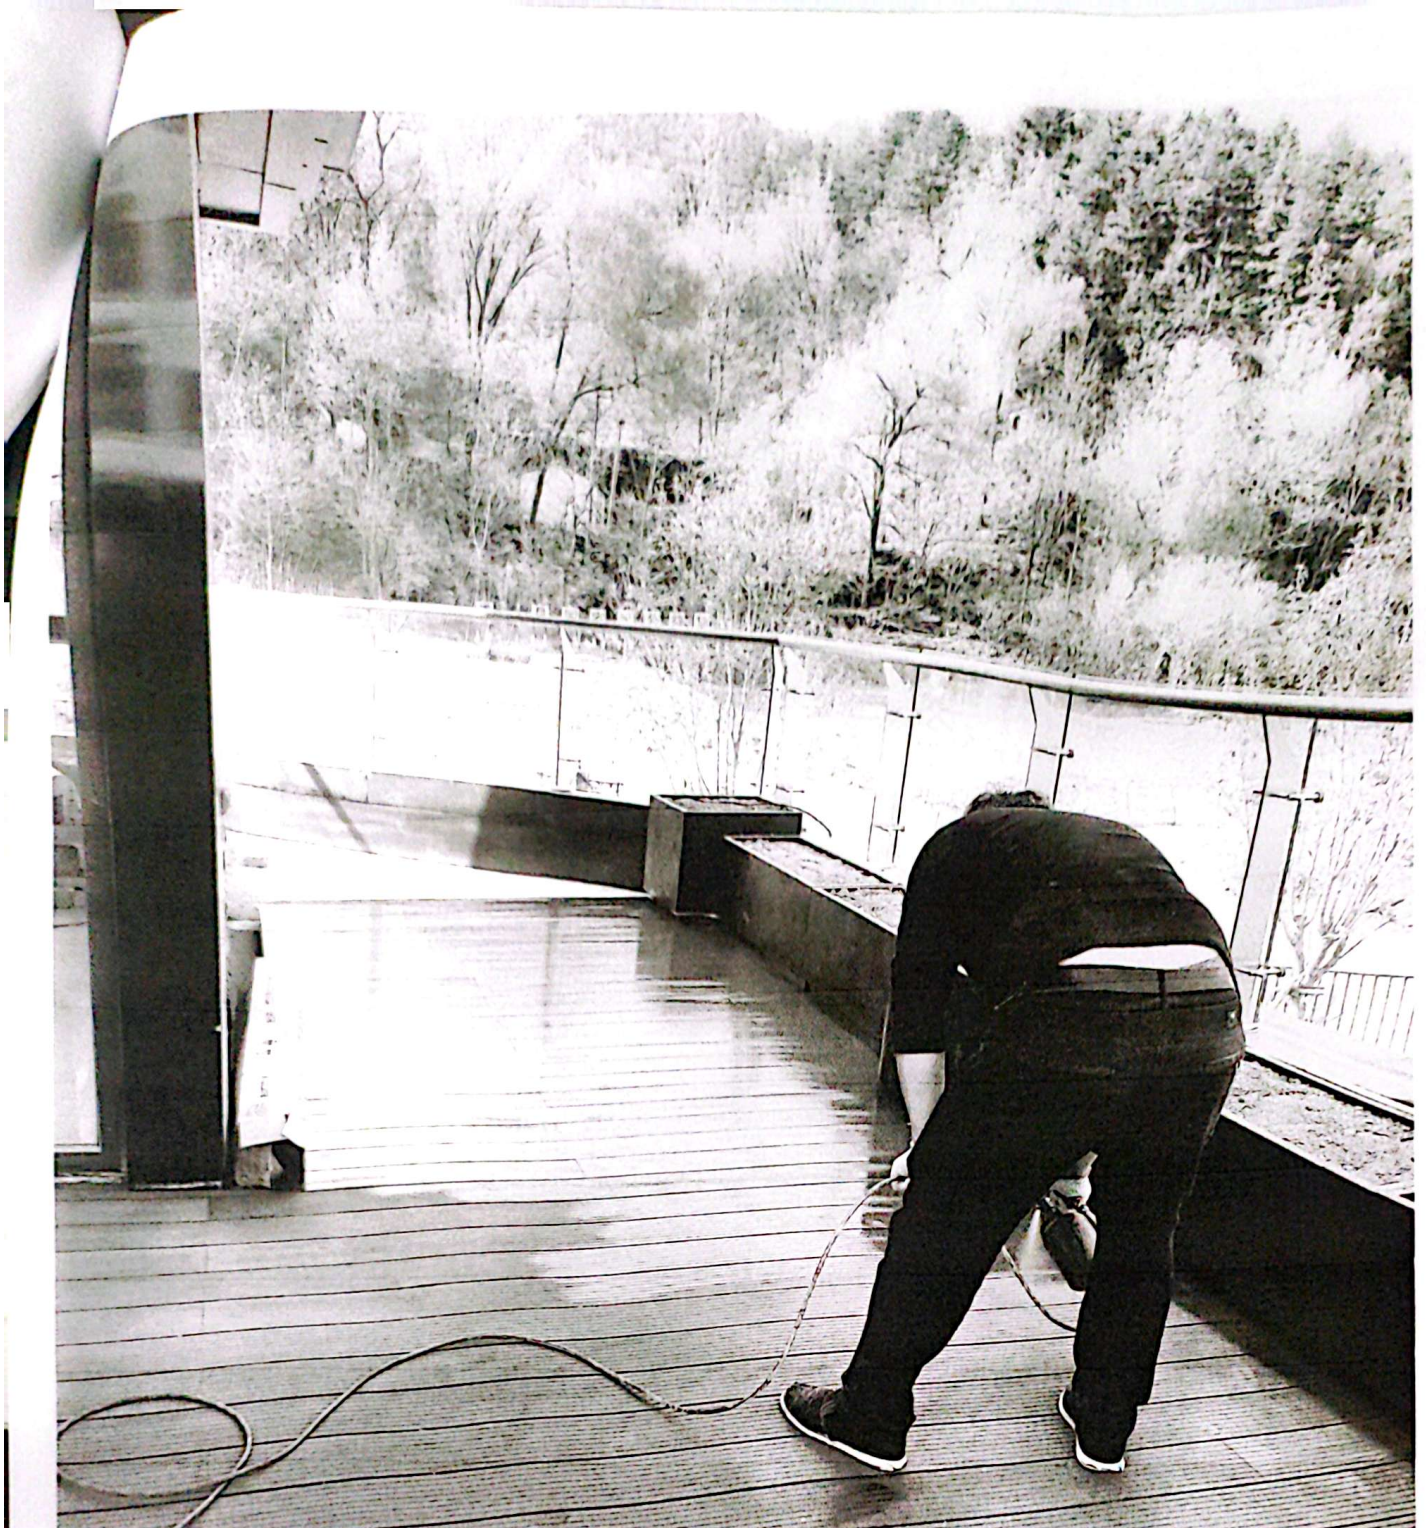

工程记录

施工内容: 木平台完成, 清理上清漆

拍摄时间: 2025.04.07 16:08

天气: 多云 24°C

地点: 栾川县·山水文苑

王宝中
2025.04.14

今日水印
相机真实时间





水印 P3XKC-NXPKN6V



扫描全能王 创建


No.
Date.

4.2m 竹木地板 完工收方单

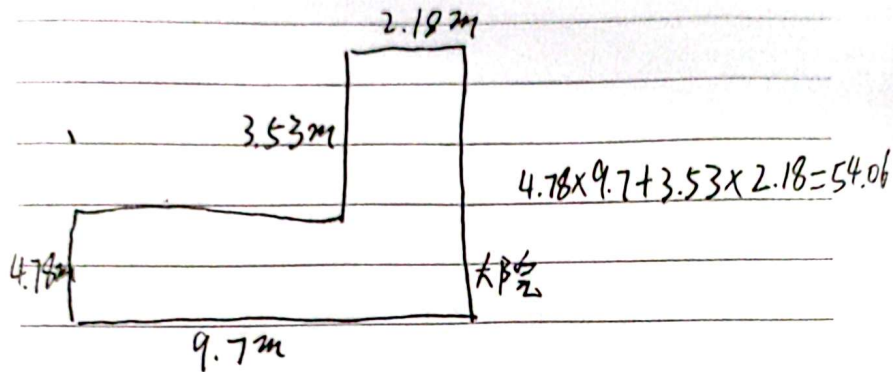

总面积: $3.192 + 1.1738 + 54.06 + 4.046 = 62.4718 \text{ m}^2$

收方人: 莫进 王宝中
2025.4.7



工程记录

施工内容: 木平台现场收方
62.47m²

拍摄时间: 2025.04.07 16:07

天气: 多云 24°C

地点: 栾川县·山水文苑

今日水印
相机 真实时间

防伪 DDP3HDBRX1TM1




扫描全能王 创建


No. _____
Date. _____

废料收方

2.13米



1.64米



$$2.13 \times 1.86 + 1.64 \times 0.9 \times 2 = 6.9138 \text{ 平方}$$

收方人: 李进 2025.4.3: 王坤

工程记录

施工内容: 木平台面层废料

拍摄时间: 2025.04.07 16:34

天气: 多云 24°C

地点: 栾川县·山水文苑



今日水印
相机 真实时间

防伪 GN3XKTPM6DWM2



扫描全能王 创建
