


工程签证审批单

编号： 60

项目名称	开元壹号项目	工程名称	开元壹号 60#地块公寓楼广场景观工程
归属合同	开元壹号 60#地块公寓楼广场景观工程施工合同	合同编号	KYYH.60B-JP-051
签证部位	城市展厅示范区范围内，临时道路、机械台班。		
施工单位	河南杰筑建筑工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容：</p> <p>1, 我方于 2020 年 8 月 14-15 日晚上，出动 60 铲车配合甲方回填位于示范区北侧围挡处的毛料，共计 2 个台班；每个台班 1000 元，合计 2000 元。</p> <p>2, 我方于 2020 年 8 月 12 日接甲方通知，对公寓楼东北侧临时道路进行施工；原有 C20 混凝土垫层加厚 0.1 米：长度 12.7 米，宽度 4 米。</p> <p>3, 我方于 2020 年 8 月 25 日接甲方通知，对公寓楼东北侧车库坡道以北临时道路进行施工；长度 15 米(7.5+7+0.5=15)，宽度 4 米，包含：素土夯实、0.2 米厚毛石料垫层、0.15 米厚 C20 混凝土垫层（内配Φ8@200 双层双向钢筋网）；后期破除。</p> <p>4, 我方于 2020 年 9 月 27 日接甲方通知，对公寓楼北侧景观铺装临时道路进行施工；原有 C20 混凝土垫层加厚 0.1 米：①长度 47.5 米，宽度 6.1 米（7.1+6.4+5.6+5.3=24.4；24.4+4=6.1）；②长度 11.6 米，宽度 7 米。</p> <p>图纸及工程量清单详见附件，请领导予以审核！</p>		
	施工单位经办人:(签字盖章)	 李伟	日期：2020.12.18
监理单位	意见	情况属实 监理工程师:(签字盖章) 申世同	日期：2020.12.18
项目工程部	意见	专业工程师或经理： 情况属实 李伟 工程总监： 申世同	日期：2020.12.18



扫描全能王 创建

<p>成本管理部 意见</p>	<p>该签证最终金额为34700.00元(叁万肆仟柒佰元整) 吉肖忠 2021.6.9</p> <p>专业成本管理岗： _____ 日期： _____</p> <p>部门经理： _____ 日期： _____</p>
<p>项目总经理意见</p>	<p>日期： _____</p>
<p>工程管理部意见</p>	<p>日期： _____</p>
<p>成本管理部意见</p>	<p>日期： _____</p>
<p>大运营中心意见</p>	<p>日期： _____</p>
<p>总裁意见</p>	<p>日期： _____</p>
<p>首席运营官意见</p>	<p>日期： _____</p>
<p>首席执行官意见</p>	<p>日期： _____</p>
<p>董事会/董事长意见</p>	<p>日期： _____</p>

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。



604B 地块景观东北侧道路墙地.

临时道路 C20 = $7.5m \times 4m \times 0.2m + 4.1m \times 4m \times 0.2m$.
此外后期不在回填毛石料垫层.

原有垫层加厚 C20 = $2.7m \times 4m \times 0.1m$.

成本部: 吉香总 2020.8.13

工程部: 李强 2020.8.13

监理方: 叶国 2020.8.13

施工方: 杜蒙 2020.8.13

南北方向



公寓楼东北侧 车库坡道以北临时道路

② 道路垫层长: $7.5+7+0.5$ m 相应做法参照后附图纸

宽: 4m

厚: 150mm

此部分在景观绿化带外, 后期需密封

成本部: 吉青燕

工程部: 李正

监理方: 李正

施工方: 李伟

2020年8月28日

②



情况说明

开元壹号60#地块公寓楼广场景观工程，公寓楼东北侧车库坡道以北临时道路，我方于2021年3月13日进行了破除及垃圾外运。

合计：8m³容积垃圾车两车，60挖机台班1个。

情况属实

魏艳歌 2021.3.15

河南杰筑建筑工程有限公司

刘奎杰

2021年3月15日



公寓楼景观铺装临时道路

20cm厚 下元毛石料回填

① 宽: 7.1 6.4 5.6 5.3

长: ~~4.5~~ 47.5m

② 长: 11.6m 宽: 7m

成本部: 吉青志 2020.9.28

工程部: 牟永生 2020.9.28

监理方: 叶月 2020.9.28

施工方: 杜文豪 2020.9.28

车行方向

(3)




开元壹号60#地块公寓楼广场景观工程
城市展厅示范区范围内，临时道路、机械台班---工程量增项价款

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	含税综合单价 (元)		合价 (元)	备注	品牌
						其中：主材			
1	回填毛料								
1.1	铲车台班	1. 60铲车 2. 配合甲方回填位于示范区北侧围挡处的毛料	个	2.00	1000	0	2000.00		
分部小计							2000.00		
2	公寓楼东北侧临时道路								
2.1	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土运距：自行考虑 3. 含模板	m ³	5.08	653.24	456.23	3318.46		
分部小计							3318.46		
3	公寓楼东北侧车库坡道以北临时道路								
3.1	素土夯实	1. 夯实密度大于93%	m ²	60.00	1.35	0	81.00		
3.2	200厚毛石料垫层	1. 拌和、摊铺 2. 找平压 (夯) 实	m ³	12.00	57.56	0	690.72		
3.3	150厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 混凝土运距：自行考虑 3. 含模板	m ³	9.00	653.24	456.23	5879.16		



3.4	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋Ⅲ级钢筋Φ10以内	kg	474.00	5.95	3.96	2820.30	
3.5	路面破除	1. 60挖机台班 2. 破除路面, 装载垃圾、地形整理恢复。	个	1.00	1000	0	1000.00	
3.6	垃圾外运	1. 渣土车 2. 建筑垃圾外运。	车	2.00	400	0	800.00	
分部小计							11271.18	
4	公寓楼北侧景观铺装临时道路							
4.1	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土运距: 自行考虑 3. 含模板	m³	37.10	653.24	456.23	24231.94	
分部小计							24231.94	
合计							40821.58	



 河南杰筑建筑工程有限公司

 年 月 日



扫描全能王 创建

开元壹号60#地块公寓楼外广场景观绿化工程-签证001

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	含税综合单价 (元)		合价 (元)	备注	
						其中: 主材			
60#B地块景观东北侧道路增加 (南北方向临时道路) 2020. 8. 13									
1	做法变更: 原设计做法100厚C20砼垫层+150厚毛石料垫层, 该范围新做法: 200厚C20砼垫层 (增加100厚砼垫层、扣除150厚毛石料垫层)								
2	挖土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 详见图纸设计 3. 弃土运距: 自行考虑	m ³	-2.54	12	0	-30.48		
3	150厚毛石料垫层	1. 拌和、摊铺 2. 找平压 (夯) 实	m ³	-7.62	57.56	0	-438.61		
4	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土运距: 自行考虑 3. 含模板	m ³	5.08	653.24	456.23	3318.46		
5	小计						2849.37		
60#B地块景观东北侧车库坡道、消防楼梯之间道路增加 (东西方向临时道路) 2020. 8. 28									
6	该范围做法: 150厚C20砼垫层 (内配c8@200双层双向钢筋) +200厚毛石料垫层。此范围在后期绿化带内, 后期拆除								
7	素土夯实	1. 夯实密实度大于93%	m ²	60.00	1.35	0	81.00		
8	200厚毛石料垫层	1. 拌和、摊铺 2. 找平压 (夯) 实	m ³	12.00	57.56	0	690.72		
9	150厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土运距: 自行考虑 3. 含模板	m ³	9.00	653.24	456.23	5879.16		
10	现浇构件钢筋	现浇构件钢筋III级钢筋Φ10以内	kg	474.00	5.95	3.96	2820.30		
11	60挖机	破除混凝土	台班	1.00	1000		1000.00	参照KYYH. 68-JA-115合同价	
12	垃圾外运	混凝土碎渣外运	车	2.00	300		600.00	参照KYYH. 68-JA-115合同价	
13	小计						11071.18		
60#B地块景观东北侧接2020. 8. 28日向西临时道路 (东西方向临时道路) 2020. 9. 28									
14	做法变更: 原设计做法100厚C20砼垫层+150厚毛石料垫层, 该范围新做法: 200厚C20砼垫层 (增加100厚砼垫层、扣除150厚毛石料垫层)								
15	挖土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 详见图纸设计 3. 弃土运距: 自行考虑	m ³	-18.55	12	0	-222.57		
16	150厚毛石料垫层	1. 拌和、摊铺 2. 找平压 (夯) 实	m ³	-55.64	57.56	0	-3202.78		
17	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土运距: 自行考虑 3. 含模板	m ³	37.10	653.24	456.23	24231.94		
18	小计						20806.59		
19	合计							34727.14	

签证最终金额为34700.00元



吉香蕊 2021.6.9

河南杰筑建筑工程有限公司
刘奎杰

2021.6.9



扫描全能王 创建

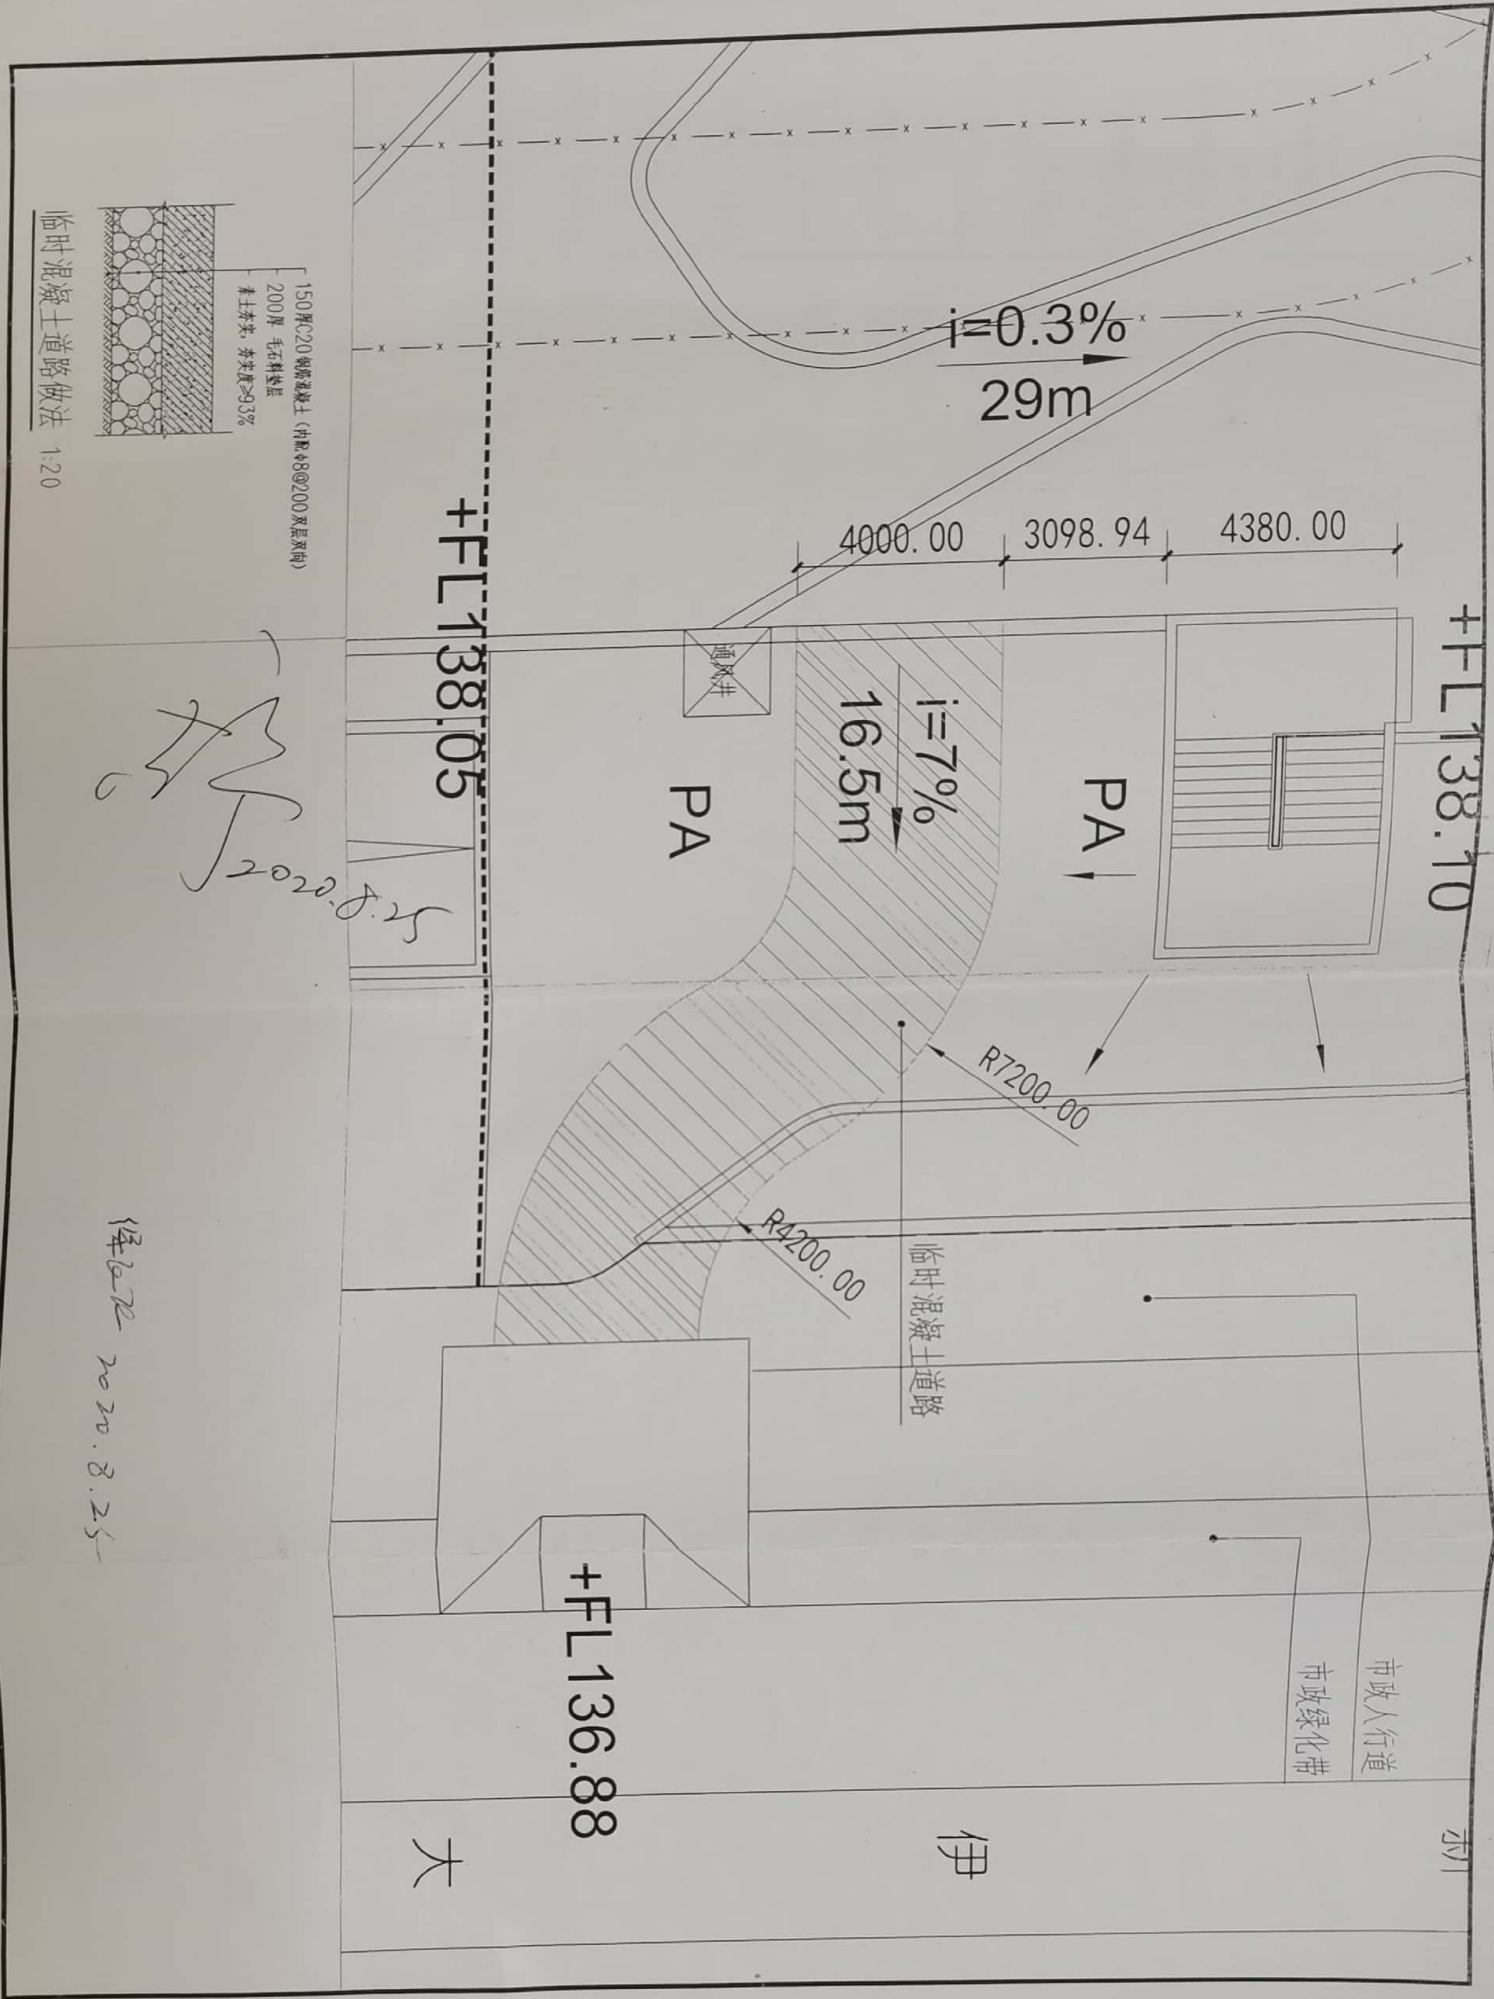

扫描全能王 创建
