

告知/联系函 Inform letter/Contact letter

关于《中浩德·山水文苑项目》 新增费用的情况说明

贵司和我司于 2019 年 10 月签订了《中浩德·山水文苑项目景观设计合同》。我司根据合同和贵司的要求启动了该项目设计工作，现已推进至现场服务阶段，且贵司已支付前期相应款项。现因贵司宜阳山水文苑项目 5 月 31 日交房，结合现场景观施工进度，对施工周期较长影响交房的部分铺装提出面层变更需求。

要求如下：

将环路的面层材质由 PC 砖调整为彩色沥青（厚度为 50mm 同铺装厚度），并考虑地面图案，基层已施工完成。

区域变更建议如下：

- 1、沥青与或其他铺地材料分割、收边关系表达明确，美化、美观不影响整体设计效果。
- 2、10#11#12#楼北侧消防扑救面较大，改为沥青路面过于单调，可考虑彩色沥青与图案结合。

3、4 米消防环道做 1.6 米彩色沥青跑道，2.4 米做沥青，增加变化同时弱化消防道。

以上设计内容，导致原景观设计部分成果不可用，我司已配合完成以下工作并提交对应成果文件：


- 1、变更区域铺装模型调整及地面铺装设计。
- 2、施工图图纸根据方案设计及甲方需求调整变更。

就重复的工作量，我司向贵司申请补偿款 20000 元。

故特此申请，望批复！



图纸设计 pc 砖、石材总面积 8736 m²，本次调整区域面积约：5115 m²

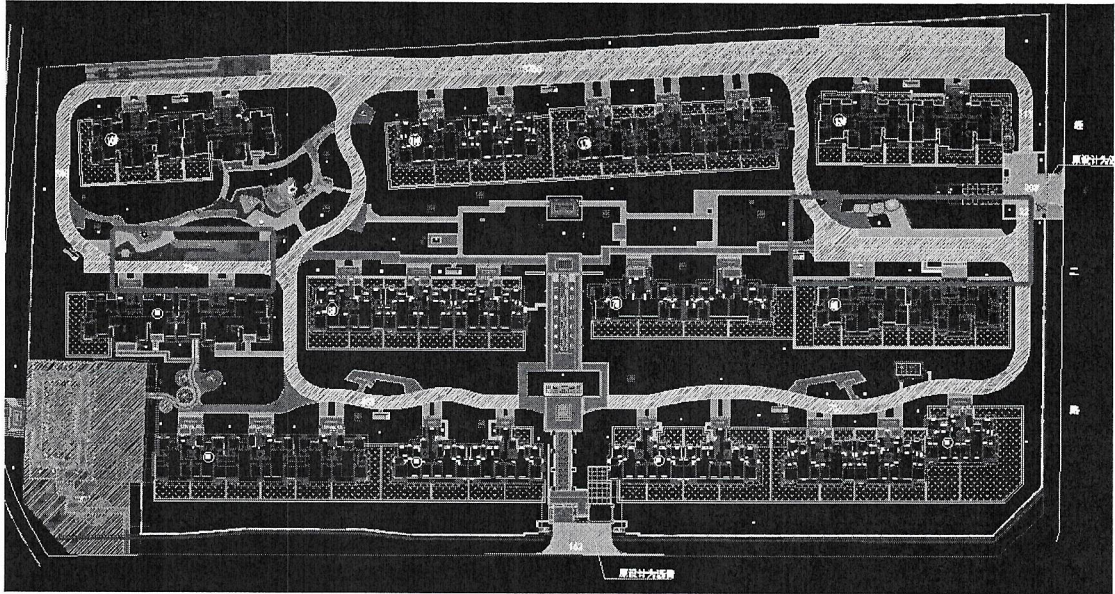

成都致澜景观设计有限公司西安分公司

2022年05月11日
