

工程竣工结算申请报告

洛阳莘子园置业有限公司：

兹有我司与贵司签订的《宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作与安装工程合同 SSWY.01-JA-102》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为310000元；合同执行过程中发生商务约谈1份，增加造价为5182元；合同执行过程中发生设计变更 / 份，增（减）造价为 / 元。

合同增加造价合计为5182元，申报合同结算造价为315182元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前(2024年3月1日)，我司已收到贵司支付的工程款共计213900元（大写：贰拾壹万叁仟玖佰元）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：班箫

手机号码：15238000729

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

工程结算通知书

河南德班实业有限公司:

我公司与贵公司签订的宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作与安装工程合同,为尽快推进结算的办理工作,提高结算效率,现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格,请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行,现将结算的相关程序和时间要求作以下说明:

一、结算申报程序:

1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认,需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认;

2、要求贵公司尽快准备结算资料,在2024年4月24日之前派专业人员与我公司成本部门陈向向接洽结算资料的核对工作,完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册,完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于2024年4月27日前提交我公司成本部门的陈向向签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时,若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的,必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算,不接受资料调整。

5、双方核对结算时,若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况,贵司承诺不要求增补资料,视为优惠。

附:《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问,请致电我公司成本部门陈向向电话1583881660,我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字: 陈向向

山水文苑项目工程总签发:

李坤 2024.4.28

山水文苑项目总签字:

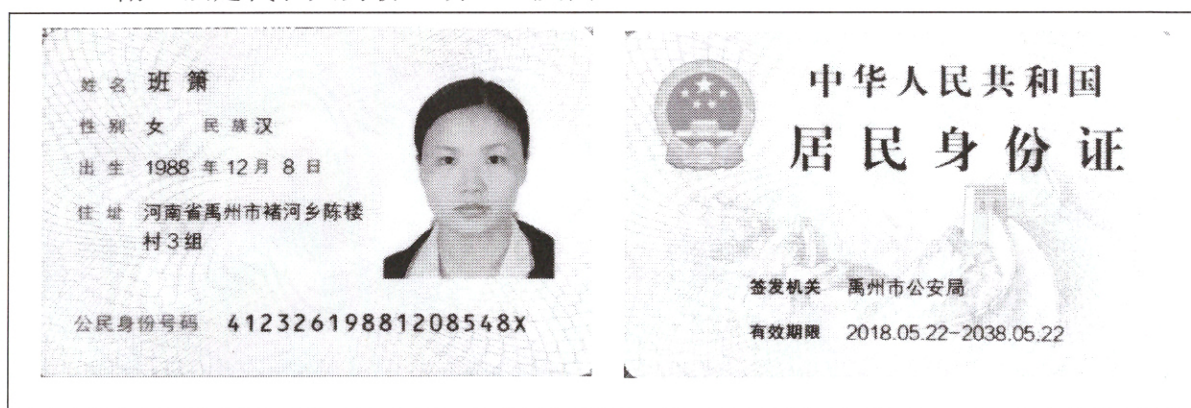
授权委托书

致：洛阳莘子园置业有限公司

本人班箫系河南德班实业有限公司的法定代表人，现委托班巧丽为我方代理人，并以本公司的名义办理宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作与安装工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：河南德班实业有限公司（盖章）

法定代表人：班箫（签字或盖章）

委托代理人：班巧丽（签字）

结算资料核对确认单

项目名称	宜阳山水文苑项目栏杆百叶制作安装工程		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1份1页	原件	
2	结算申请报告	1份1页	原件	
3	单项工程验收单	1份1页	原件	
4	授权委托书	1份1页	原件	
5	往来账目明细	1份1页	原件	
6	水电费结清证明	1份1页	原件	
7	合同复印件	1份	复印件	
8	工程签证单(商务约谈记录)	1份1页	复印件	
9	设计变更	0份0页	复印件	
10	竣工图	1套	原件	
11	施工方报送的结算资料	1份	原件	
相关部门签字栏	施工单位:  (签字盖章) 	项目工程部: (签字盖章) 	成本部门: (签字盖章)	

注:

- 1、本确认单在合作方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目营销策划部和合作单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

11

工程往来账目明细


合同名称：宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作与安装工程合同
合同编号：SSWY.01-JA-102

日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	税率 (%)	备注
2022.5.26	160000	160000.00	160000.00	9%	
2022.6.14	53900	53900.00	53900.00	9%	
小计		213900.00	213900.00		

甲方财务：  2024.4.24

乙方财务：

(单位盖章)



证明

由河南德班实业有限公司施工的宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作与安装工程施工过程中不存在水电费，特此证明。

洛阳莘子园置业有限公司

工程部

2019 年 4 月 24 日

单项工程验收单 (分包)

2023年5月24日

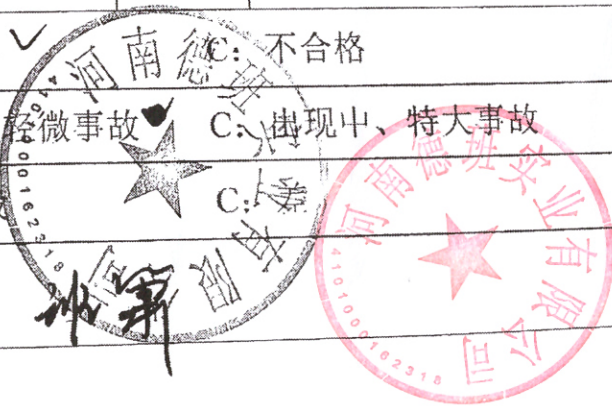
合同名称	宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作与安装工程合同		
施工单位	河南德班实业有限公司		
建设单位	洛阳莘了园置业有限公司		
工程开工日期	2022年4月14日	工程竣工日期	2022年6月10日

工程内容: 宜阳山水文苑标识标牌和信报箱制作及安装工程图纸所示园区景观标识、园区公告栏、指示牌、各类提示牌、提示牌、楼栋牌、楼层牌、信交门牌、管道井牌、物业用房门牌、设备门牌、车库龙门牌、垃圾桶、信报箱等。

验收结论: 地上主楼亚克力标识牌实测厚度为2.90mm, 地下室有部分亚克力标识牌实测厚度为2.40mm, 2.70mm。金属材质牌厚度符合要求, 信报箱已通过主管部门验收。

工程评价结果: 在评价结果后打√















1	工期: A: 超计划天数 10天	B: 未超计划			
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良	B: 合格 ✓	不合格		
3	安全: A: 未出事故 ✓	B: 出现轻微事故 ✓	C: 出现中、特重大事故		
4	现场: A: 整洁、无浪费 ✓	B: 一般	C: 差		





























验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		
	监理单位验收人员签字或盖章		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章		
	工程部	设计部	成本部
	范合峰	梁天	赵亨阁 结算时扣除!

林志强











宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作及安装工程结算清单


序号	图片	名称	参考规格 (mm)	数量	单位	含税 (9%) 固定综合单价 (元)	含税 (9%) 金额 (元)	材质	备注
1		总平面图导览	1860*2000*100	1	个	5850	5850	1.5mm不锈钢焊接造型, 汽车烤漆; 不锈钢立体图标志; 画面内容UV打印; 不锈钢焊接造型烤漆	包含总平面图
2		私家重地非请勿入	520*2000*80	2	个	1900	3800	1.5mm不锈钢焊接造型, 汽车烤漆; 不锈钢立体图标志	
3		访客请登记	800*400*40	1	个	208	208	1.5mm不锈钢焊接造型, 汽车烤漆; 文字丝网印刷	
4		多功能指示牌	520*2000*80	8	个	1900	15200	1.5mm不锈钢焊接造型, 汽车烤漆; 不锈钢立体图标志; 文字丝网印刷	
5		室外公告栏	1750*2000*100	4	个	5500	22000	1.5mm不锈钢焊接造型, 汽车烤漆; 不锈钢立体字; 8mm钢化玻璃, 画面亚克力	不含公告内容页
6		文明公约	520*2000*80	3	个	1750	5250	1.5mm不锈钢焊接造型, 汽车烤漆; 文字丝网印刷	
7		景观垃圾桶	400*900*650	20	个	1450	29000	1.5mm厚不锈钢折焊成型烤漆; 20*30mm矩管烤漆; 丝印LOGO (暗纹); 1.5mm不锈钢焊接造型, 汽车烤漆; 1.5mm厚不锈钢	
8		生活垃圾桶	120L	40	个	180	7200	最薄处厚度不小于5mm	
9		生活垃圾桶	240L	16	个	260	4160	最薄处厚度不小于5mm	
10		温馨提示牌	200*800、200*950、200*1200	1	组	1500	1500	1.5mm不锈钢焊接造型, 汽车烤漆; 文字丝网印刷	
11		物业服务中心	570*2000	1	个	1950	1950	1.5mm不锈钢焊接造型, 汽车烤漆; 不锈钢立体字	
12		物业服务中心门头	4000*1000	1	个	3700	3700	钢架+防火木工板打底, 不锈钢烤漆板饰面, 钛金包边。文字PVC雕刻烤漆	
13		停车场导视立牌	850*3000*120	2	个	3750	7500	不锈钢焊接造型做原木漆; 不锈钢立体字; 文字丝网印刷; 不锈钢焊接造型烤漆	
14		禁鸣限速	570*2000*80	2	个	1800	3600	不锈钢焊接造型做原木漆; LOGO丝网印刷; 反光贴; 不锈钢焊接造型烤漆; 文字丝网印刷	












15		健身提示	520*2000*80	1	个	1750	1750	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷	
16		草地坪	720*850	20	个	700	14000	1.5mm不锈钢板激光焊接成型表面汽车烤漆；图文油墨丝网印刷	
17		戏水牌	720*850	2	个	700	1400	1.5mm不锈钢板激光焊接成型表面汽车烤漆；图文油墨丝网印刷	
18		树铭牌	300*200	33	个	48	1584	1.2mm不锈钢激光切割折弯成型汽车烤漆，图文丝网印刷	
19		地库龙门牌	6200*800*120	1	个	4800	4800	1.2mm镀锌钢板烤漆焊接造型；激光镂空雕刻，内衬3mm亚克力面板；镀锌钢板折弯造型，汽车烤漆	
20		地库龙门牌	5500*800*120	1	个	4300	4300	1.2mm镀锌钢板烤漆焊接造型；激光镂空雕刻，内衬3mm亚克力面板；镀锌钢板折弯造型，汽车烤漆	
21		人字牌	220*600*300	56	个	257	14392	30厚，1.0mm不锈钢切割焊接，汽车烤漆，3mm亚克力喷漆印刷	“小心地滑”等
22		楼栋牌	1200*1200	24	个	1400	33600	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；不锈钢立体字，表面烤漆	
23		楼栋单元牌	400*200*20	28	个	80	2240	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷	
24		小心地滑	300*150	28	个	45	1260	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷	
25		消防通道提示牌	300*150	28	个	45	1260	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷	
26		电梯安全使用提示牌	400*200	36	个	23	828	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
27		客梯消防梯牌	200*100	610	个	10	6100	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
28		电梯轿厢尺寸标牌	270*200	36	个	50	1800	1.2mm不锈钢切割造型，烤漆，内容丝印	
29		楼层牌	250*600	462	个	40	18480	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
30		门牌	200*100	764	个	10	7640	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
31		水暖井牌	200*100	342	个	10	3420	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	

32		强弱电井牌	200*100	490	个	10	4900	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
33		设备间门牌	200*100	102	个	10	1020	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
34		电梯机房	200*100	9	个	10	90	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
35		单元宣传栏	720*560*15	28	个	450	12600	2.0mm不锈钢折弯焊接，表面进口汽车烤漆；logo文字丝网印刷；3+3mm亚克力插槽(A4)	
36		单元大堂管家介绍	600*800	28	个	150	4200	3mm亚克力切割造型，内容平板打印，3mm亚克力卡槽	
37		消防疏散图	200*300	140	个	30	4200	5mm亚克力切割造型，内容平板打印	
38		消防器材巡检卡	260*350	433	个	30	12990	3mm亚克力切割造型，内容平板打印，3mm亚克力卡槽	
39		鼠药投放处	180*300	28	个	20	560	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
40		天台标识	400*300	28	个	100	2800	1.2mm不锈钢切割造型，烤漆，内容丝印	
41	规格参照设备间	人防出入口	200*100	2	个	10	20	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
42	规格参照单元牌	非机动车库	400*200*20	3	个	80	240	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷	
43	规格参照设备间	末端试水	200*100	11	个	10	110	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
44	规格参照设备间	防火门	200*100	88	个	10	880	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
45		不锈钢信报箱	240*120*340	770	户	40	30800	1、不锈钢信报箱箱体、内层、门板均采用304不锈钢板材质，门板为镜光板厚度0.8mm，门板周边为砂光板厚度0.8mm、内层、隔板、背板为2B板厚度0.5mm，每户信报箱需暗装专用信箱锁（2把钥匙）。 2、反蚀刻，不锈钢材	已考虑10户备用箱
46	设计费	/	/	1	项	/	10000		
合计							315182		












《工程量清单计价表（宜阳山水文苑项目标识标牌和信报箱制作及安装工程）》

序号	图片	名称	参考规格 (mm)	数量	单位	材质	备注
1		总平面图导 览	1860*2000*100	1	个	1.5mm不锈钢焊接造型， 汽车烤漆；不锈钢立体图 标字；画面内容UV打印； 不锈钢焊接造型烤漆	包含总平 面图
2		私家重地 非请勿入	520*2000*80	2	个	1.5mm不锈钢焊接造型， 汽车烤漆；不锈钢立体图 标字	
3		访客请登记	800*400*40	1	个	1.5mm不锈钢焊接造型， 汽车烤漆；文字丝网印刷	
4		多功能指示 牌	520*2000*80	8	个	1.5mm不锈钢焊接造型， 汽车烤漆；不锈钢立体图 标字；文字丝网印刷	
5		室外公告栏	1750*2000*100	4	个	1.5mm不锈钢焊接造型， 汽车烤漆；不锈钢立体 字；8mm钢化玻璃，画面 亚克力	不含公告 内容页
6		文明公约	520*2000*80	3	个	1.5mm不锈钢焊接造型， 汽车烤漆；文字丝网印刷	
7		景观垃圾桶	400*900*650	20	个	1.5mm厚不锈钢折焊成型 烤漆；20*30mm矩管烤 漆；丝印LOGO（暗纹）； 1.5mm不锈钢焊接造型， 汽车烤漆；1.5mm厚不锈	
8		生活垃圾桶	120L	40	个	最薄处厚度不小于5mm	
9		生活垃圾桶	240L	16	个	最薄处厚度不小于5mm	
10		警示牌	400*200*20	0	个	1.5mm不锈钢焊接造型， 汽车烤漆；文字丝网印刷	



11		温馨提示牌	200*800、 200*950、 200*1200	1	组	1.5mm不锈钢焊接造型， 汽车烤漆；文字丝网印刷	
12		物业服务中心	570*2000	1	个	1.5mm不锈钢焊接造型， 汽车烤漆；不锈钢立体字	
13		物业服务中心 中心门头	4000*1000	1	个	钢架+防火木工板打底， 不锈钢烤漆板饰面，钛金 包边。文字PVC雕刻烤漆	
14		停车场导视 立牌	850*3000*120	2	个	不锈钢焊接造型做原木 漆；不锈钢立体字；文字 丝网印刷；不锈钢焊接造 型烤漆	
15		禁鸣限速	570*2000*80	2	个	不锈钢焊接造型做原木 漆；LOGO丝网印刷；反光 贴；不锈钢焊接造型烤 漆；文字丝网印刷	
16		健身提示	570*2000*80	1	个	1.5mm不锈钢焊接造型， 汽车烤漆；文字丝网印刷	
17		草坪	720*850	20	个	1.5mm不锈钢板激光焊接 成型表面汽车烤漆；图文 油墨丝网印刷	
18		戏水牌	720*850	2	个	1.5mm不锈钢板激光焊接 成型表面汽车烤漆；图文 油墨丝网印刷	
19		树铭牌	300*200	33	个	1.2mm不锈钢激光切割折 弯成型汽车烤漆，图文丝 网印刷	
20		车库龙门牌	6200*800*120/ 5500*800*120	2	个	1.2mm镀锌钢板烤漆焊接 造型；激光镂空雕刻，内 衬3mm亚克力面板；镀锌 钢板折弯造型，汽车烤漆	
21		人字牌	220*600*300	56	个	30厚，1.0mm不锈钢切割 焊接，汽车烤漆，3mm亚 克力喷漆印刷。	“小心地 滑”共56 个


班
 200811

22		楼栋牌	1200*1200	24	个	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；不锈钢立体字，表面烤漆	1-3/5-13
23		楼栋单元牌	400*200*20	28	个	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷	
24		小心地滑	300*150	28	个	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷	
25		消防通道提示牌	300*150	28	个	1.5mm不锈钢焊接造型，汽车烤漆；文字丝网印刷	
26		电梯安全使用提示牌	400*200	36	个	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
27		客梯消防梯牌	200*100	610	个	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	客梯462 消防梯148
28		电梯轿厢尺寸标牌	270*200	36	个	1.2mm不锈钢切割造型，烤漆，内容丝印	
29		楼层牌	250*600	462	个	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
30		门牌	200*100	764	个	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
31		水暖井牌	200*100	342	个	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	
32		强弱电井牌	200*100	490	个	3mm亚克力切割造型，内容平板打印	电井194 强电井148 弱电井148

实




23



26

33		设备间门牌	200*100	102	个	3mm亚克力切割造型, 内容平板打印	
34		电梯机房	200*100	9	个	3mm亚克力切割造型, 内容平板打印	电梯机房 8 水箱间 1
35		单元宣传栏	720*560*15	28	个	2.0mm不锈钢折弯焊接, 表面进口汽车烤漆; logo文字丝网印刷; 3+3mm亚克力插槽(A4)	
36		单元大堂管家介绍	600*800	28	个	3mm亚克力切割造型, 内容平板打印, 3mm亚克力卡槽	
37		消防疏散图	200*300	140	个	5mm亚克力切割造型, 内容平板打印	
38		消防器材巡检卡	260*350	433	个	3mm亚克力切割造型, 内容平板打印, 3mm亚克力卡槽	
39		鼠药投放处	180*300	28	个	3mm亚克力切割造型, 内容平板打印	
40		天台标识	400*300	28	个	1.2mm不锈钢切割造型, 烤漆, 内容丝印	
41		人防出入口	200*100	2	个	3mm亚克力切割造型, 内容平板打印	
42		非机动车库	400*200*20	3	个	1.5mm不锈钢焊接造型, 汽车烤漆; 文字丝网印刷	
43		末端试水	200*100	11	个	3mm亚克力切割造型, 内容平板打印	

44		防火门	200*100	88	个	3mm亚克力切割造型，内容平板打印
45		不锈钢信报箱	240*120*340	770	户	1、不锈钢信报箱箱体、内层、门板均采用不锈钢板材质，门板为镜光304板厚度0.8mm，门板周边为砂光板厚度0.8mm、内层、隔板、背板为2B板厚度0.5mm，每户信报箱需暗装专用信箱锁（2把钥匙）



以上已完成，无需安装已移交物业。




监理：刘万进
2022.6.10.

李学军
2022.6.10 2022.6.10

有限公司

供应商约谈记录

第 1 次约谈

约谈的供应商名称	河南德班实业有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	合同内变更项标识标牌谈价		
约谈日期	2022 年 11 月 12 日		
约谈地点	线上约谈		
约谈的内容			
因项目现场对合同清单内部分标识标牌尺寸、形状进行调整，故对变更项进行约谈确价。			
1、地库龙门牌：原尺寸 780mm*1000mm，现尺寸 6200mm*800mm 和 5500mm*800mm。修改后单价为 6200mm*800mm 为 4800 元/个，5500mm*800mm 为 4300 元/个；			
2、楼栋牌：样式修改、原款式尺寸 1600mm*1500mm，现尺寸 1200mm*1200mm。修改后单价为 1400 元/个；			
			
3、电梯轿厢尺寸标牌：原尺寸 400mm*300mm，现尺寸 270mm*200mm。修改后单价为 50 元/个；			
4、门牌：原尺寸 120mm*60mm，现尺寸 200mm*100mm。修改后单价为 10 元/个；✓			
5、消防疏散图：原尺寸 800mm*600mm，现尺寸 200mm*300mm。修改后单价为 30 元/个；✓			
6、消防器材巡检卡：原尺寸 300mm*400mm，现尺寸 260mm*350mm。修改后单价为 30 元/个。✓			
7、以上单价均为含税固定综合单价，包括但不限于设计费、人工费、材料费、机械费、安装费、措施费、窝工费、水电费、垃圾清运费、材料检测检验费、规费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、管理费、利润、税金（增值税专用发票）、验收、质保期服务等所需全部费用。含税固定综合单价不因任何因素的变化而调整。其他未注明事项同原合同。			
最终报价：以实结算	大写：以实结算		税率：9%
签字确认栏			
供应商代表	签字： 	电话：15238000729	日期：2022.11.13
我司代表	签字： 		

29
