


工程签证审批单 (I类项目)

编号: LNSSWY-JP-023-016

项目名称	洛宁山水文苑项目	工程名称	洛宁项目售楼部展示区景观工程
归属合同	洛宁项目售楼部展示区景观工程施工合同	合同编号	LNSSWY-JP-023
签证部位	增加雾森长度, 更换主机		
签证内容	<p>签证内容: 工程量、工日、签证部位 (此页附《工程预签证单》及相关内容)</p> <p>应甲方要求, 在中央水景回水沟上方增加一圈直径 10 雾森管道, 总长 60m; 新增红宝石雾森喷头 43 个, 主机由 5.5kw 调整为 7.5kw。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>经办人签字/日期: <i>陈金定</i> 2022.4.6</p>		
项目工程部门/景观工程技术部	<p>签证工程量复核说明: <i>情况属实</i></p> <p>工程质量验收结果: <input checked="" type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p> <p>专业工程管理岗签字/日期: <i>李东伟、曹润蔚</i></p> <p>部门经理签字/日期: <i>吴山</i> 2022.4.25</p>		
成本管理部门	<p>签证工程量复核结果:</p> <p>工程质量验收结果: <input checked="" type="checkbox"/>合格 <input type="checkbox"/>不合格</p> <p>该签证经双方协商, 最终金额为 7646.2 元 (大写: 柒仟陆佰肆拾陆元贰角) <i>段笑研</i> 2023.4.27</p>		

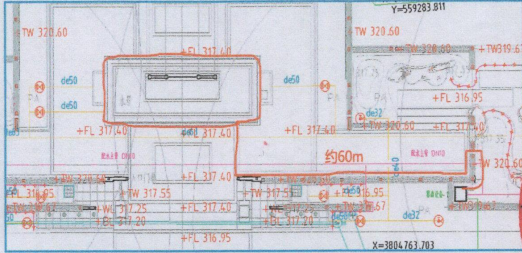

	签证价格核定 (附计算过程): 专业成本管理岗签字/日期: 部门经理签字/日期:
项目总/景观工程 技术部负责人	签字/日期:
成本管理部负责 人	签字/日期:
大运营中心总 额度 ≤ 2 万	签字/日期:
总裁 额度 < 10 万	签字/日期:
董事会/董事长 额度 ≥ 10 万	签字/日期:

中浩德山水文苑示范区项目景观工程一签证（更换雾森主机）

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价（元）		金额	备注
						其中： 主材		
1	仿芝麻灰PC砖	1. 面层：200*600*18厚浅灰色仿石PC砖 2. 粘接层：30厚1:3干硬性水泥砂浆（防碱处理） 3. 其他满足规范和图纸设计要求	m ²	0.36	245		88.2	合同价
2	雾森喷头	1、名称：雾森喷头（红宝石150微米精密撞针喷嘴） 2、型号：DN10 3、材质：不锈钢铸造	个	39	34		1326	合同价
3	高压不锈钢给水管	1、名称：高压不锈钢给水管（含管件） 2、规格：DN10 3、压力等级：PN5.0MPa 4、压力试验及吹、洗设计要求：满足规范及设计要求 5、其他：详见图纸设计、相关图集、规范等	m	62	36		2232	合同价
4	增加新主机箱	功率：7.5kw	台	1		22200	22200	市场价（含换设备运费及机械费）
5	拆除旧主机箱	功率：5.5KW	台	-1		18200	-18200	
6	合计						7646.2	

李林 2023.4.27

段笑宇

2023.4.27

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	综合单价 (元)		金额	备注
						其中: 主材		
		签证11: 雾森增加线路						
1	破除铺装面层	拆除18厚pc砖+30厚砂灰层	m2	0.36	20		7.2	拆除路面过管
2	恢复铺装面层	600*200*20厚仿芝麻黑pc砖, 材料乙供	m2	0.36	245		88.2	过管后恢复路面
3	喷头	红宝石高压喷头	个	43	34		1462	
4	管道	直径10不锈钢管	m	60	36		2160	
5	更换增加费用	功率: 由5.5改为7.5kw	台	1		15000	15000	
6	合计						18717.4	

赵林

签证完工验收确认单

- 1、现场增加 600*600*50*5mm (201 不锈钢框+镀锌底板) 的铺装井盖 6 套
- 2、现场增加 800*800*50*5mm (201 不锈钢框+镀锌底板) 的铺装井盖 1 套
- 3、雾森喷头 39 个，高压不锈钢给水管 DN10 经测量为 62 米
- 4、主机品牌是瑞艾思，现在安装为 7.5KW

段英子
2023.4.27

宋羽杰
2023.4.27

李豪
2023.4.27
