






## 工程进度、质量、安全确认单











编号：006

项目名称	中浩德栾川山水文苑 S1 地块项目	施工单位	河南瑞卿实业有限公司
合同名称	栾川山水文苑 S1 地块项目地下车库地坪漆及交通设施工程施工合同	合同编号	LCS1-JA-075
致： <u>栾川县浩德颐康文旅有限公司</u>			
<p>我方与贵单位签订《栾川山水文苑S1 地块项目地下车库地坪漆及交通设施工程施工合同》，根据合同第六条第三款约定：本区域地坪漆施工完成并经甲方、监理验收合格后，付至该项已完工程量价款的 80%；</p> <p>现已满足合同第六条第三款之约定，现场已经按要求施工完成，本区域固化剂地坪及环氧地坪施工完成，请予以确认。</p>			
工程进度	1、质量情况符合要求；		
质量安全	2、现场安全文明施工符合要求；		
描述	3、进度满足合同要求。		
		日期：	
监理单位审核意见：		建设单位审核意见：	
签字：   日期：		责任工程师签字：  日期：2024.9.20 工程总签字：  日期	













注：本表由监理单位填报，工程部和监理单位进行审核、确认，必要时须成本合约部到现场共同核实。本表做为支付工程款的附件。

















# 中浩德·栾川山水文苑S1地块地下车库（范围内）工程量清单明细表

序号	名称	简图	规格 (mm)	单位	第六期进度款工程量	含税_9_%综合单价	第六期进度款合价	备注
<b>一、标线部分</b>								
1	直行箭头		长3000mm	个	18.00	30.00	540.00	
2	直行左右转		长3000mm	个	9.00	30.00	270.00	
3	掉头箭头		长3000mm	个	9.00	30.00	270.00	
4	直行右转		长3000mm	个	4.00	30.00	120.00	
5	直行左转		长3000mm	个	6.00	30.00	180.00	
6	左转箭头		长3000mm	个	3.00	30.00	90.00	
7	右转箭头		长3000mm	个	4.00	30.00	120.00	
8	左右转箭头		长3000mm	个	7.00	30.00	210.00	
9	车位导向		450*1000mm	个	413.00	10.00	4130.00	
10	标准车位线		线宽100 (2400*5100mm)	个	5.00	30.00	150.00	









11	标准车位线		线宽100 (2400*5300mm)	个	324.00	30.00	9720.00	
12	微型车位线		线宽100 (1800*3500mm)	个	3.00	28.00	84.00	
13	微型车位线		线宽100 (2200*4300mm)	个	28.00	28.00	784.00	
14	加宽车位线		线宽100 (2800*5100mm)	个	3.00	34.88	104.64	
15	加宽车位线		线宽100 (2800*5300mm)	个	3.00	34.88	104.64	
16	加长车位线		线宽100 (2400*5900mm)	个	24.00	34.88	837.12	
17	侧方加长车位线		线宽100 (3400*6000mm)	个	3.00	34.88	104.64	
18	加长加宽车位线		线宽100 (3800*5900mm)	个	5.00	43.60	218.00	
19	超长车位线		线宽100 (2400*7000mm)	个	0.00	49.05	0.00	
20	超长车位线		线宽100 (2400*7500mm)	个	4.00	49.05	196.20	
21	超长加宽车位线		线宽100 (2800*7500mm)	个	0.00	54.50	0.00	
22	无障碍车位线		线宽 100(2400+1200)*5300mm)	个	2.00	49.05	98.10	









23	子母车位线		线宽100 (2400*940mm)	个	1.00	59.95	59.95	59.95	
24	子母车位线		线宽100 (2400*980mm)	个	1.00	59.95	59.95	59.95	
25	子母车位线		线宽100 (2400*1020mm)	个	2.00	59.95	119.90	119.90	
26	子母车位线		线宽100 (2400*1060mm)	个	1.00	65.40	65.40	65.40	
27	人行斑马线		宽2000mm	组	21.00	179.85	3776.85	3776.85	
28	车道边缘线		线宽150mm	m	1730.22	5.00	8651.10	8651.10	
29	车道中心线		线宽150mm	m	732.06	5.00	3660.30	3660.30	
<b>二、反光标牌部分 (均为单面)</b>									
1	导向标		1500*450mm	面	0.00	70.00	0.00	0.00	
2	车位吊牌		300*200*18mm	面	413.00	30.00	12390.00	12390.00	
3	楼栋楼栋指示灯箱		3000*300*70	面	6.00	1150.00	6900.00	6900.00	
4	单元楼栋指示灯箱		3000*300*70	面	15.00	1150.00	17250.00	17250.00	
5	龙门牌灯箱		6000*600*70	面	0.00	3815.00	0.00	0.00	
<b>三、金属构件部分</b>									
1	橡胶护角器			个	723.00	15.00	10845.00	10845.00	



2	广角镜		直径600mm	面	9.00	180.00	1620.00	
3	橡胶车轮定位器			个	826.00	35.00	28910.00	
4	橡胶减速带			m	65.90	59.95	3950.71	
5	道钉			个	0.00	8.72	0.00	
6	反光轮廓标			个	0.00	8.72	0.00	
7	反光防撞柱		1、磷化防腐，表面烤漆，工程级反光膜等 2、镀锌钢管规格：DN89*60*2.5mm 3、与地面法兰盘连接 4、其他	个	50.00	59.95	2997.50	
<b>四、地坪部分</b>								
1	无振动止滑坡道		1、基层表面打磨处理 2、界面剂2遍 3、批涂界面抗斥层，施工厚度不小于3mm 4、划线放样，贴美纹纸 5、防滑阻层，确工平均厚度不小于2mm 6、滚涂弹性环氧面漆两遍 7、清理，表面平整等	m <sup>2</sup>	744.56	76.30	56809.93	
2	固化剂地坪 (行车通道区域)		1、混凝土基层清理，抹平压实，打磨，清除灰尘等 2、研磨至300目过筛，第一道固化剂施工(含量≥0.15kg/m <sup>2</sup> )； 3、研磨至500目进行第二道固化剂施工(含量≥0.15kg/m <sup>2</sup> )； 4、最终需研磨抛光至少2000目； 5、施工后抛光、养护等综合考虑 6、其他	m <sup>2</sup>	3794.25	15.00	56913.75	
3	环氧地坪 (停车位区域) 绿色		1、混凝土基层清理，抹平压实，打磨，清除灰尘等 2、1.2mm厚环氧树脂地坪漆底漆滚涂一道、中涂批涂、面漆滚涂两道等(底漆不低于0.2kg/平米，中涂不低于0.46kg/平米，面漆0.3kg/平米) 3、颜色综合考虑	m <sup>2</sup>	8342.55	27.25	227334.49	



五、墙柱面喷涂部分										
1	柱面色带 (颜色可调换)		800mm高	m <sup>2</sup>	253.44	17.44	4419.99			
2	墙面色带 (颜色可调换)		800mm高	m <sup>2</sup>	1924.77	17.44	33567.95			
3	门厅色带 (颜色可调换)		1850mm高	m <sup>2</sup>	40.70	17.44	709.81			
4	坡道色带 (颜色可调换)		800mm高	m <sup>2</sup>	0.00	17.44	0.00			
5	地下室墙柱面标识			个	542.00	10.00	5420.00			墙、柱、门厅标识
6	踢脚线		150mm高	m	2722.76	3.82	10400.94			
合计(元)							515164.86			

注: 1. 综合单价中包含: 人工费、材料费、机械费、措施费、安全文明施工费、扬尘治理增加费、疫情增加费、管理费、利润、税金(增值税专用发票)、风险、材料检测检验费等一切与之相关全部费用。

2. 若对工程量清单存疑, 请在招标文件约定的期限内提出, 经招标人确认后补发此项清单。若无异议, 本次工程量清单无论是否存在缺项、漏项、工程量偏差, 均视为乙方已综合考虑在固定合同总价内。




第六期进度款无振动止滑坡道: 744.56m<sup>2</sup>

第六期进度款固化面积 (灰色区域): 4256.35-462.10=3794.25m<sup>2</sup>

第六期进度款环氧面积 (绿色区域): 12219.37-82.57-3794.25=8342.55m<sup>2</sup>



人防区 非人防区

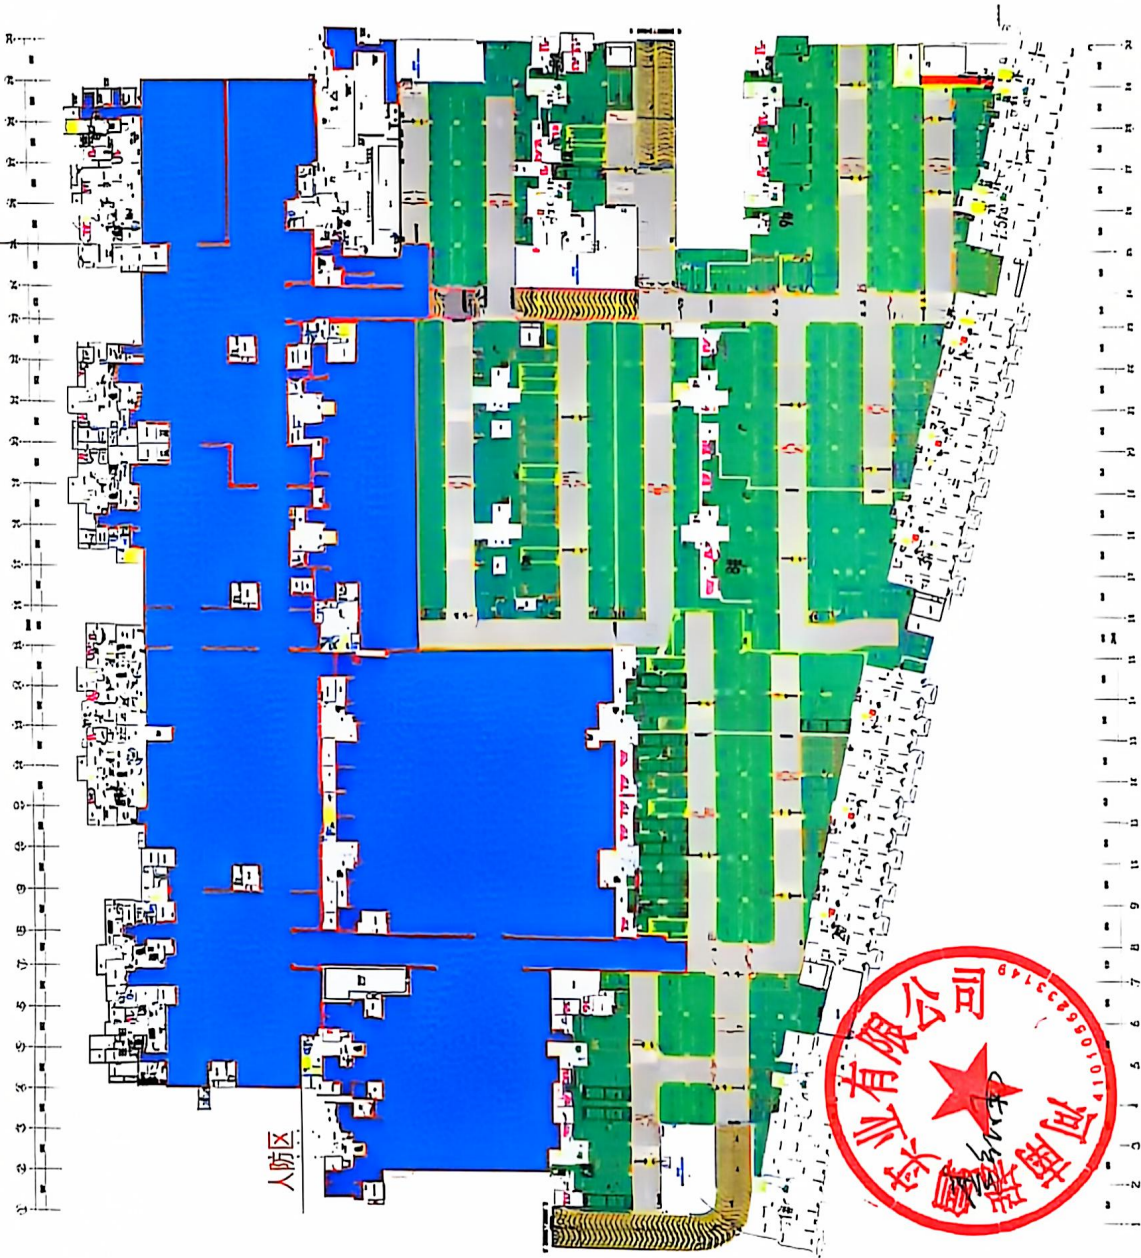

本项目车位: 825个

序号	名称	规格/尺寸	数量	单位	备注
1	车位	2.4m x 5.3m	825	个	
2	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
3	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
4	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
5	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
6	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
7	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
8	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
9	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
10	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
11	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
12	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
13	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
14	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
15	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
16	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
17	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
18	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
19	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
20	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
21	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
22	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
23	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
24	车位	2.4m x 5.3m	1	个	
25	车位	2.4m x 5.3m	1	个	

地下一层停车场车位类型平面图

河南绿城设计研究院

河南绿城置业有限公司

项目: 河南绿城置业有限公司

日期: 2023.11.15

图号: 01

比例: 1:100

设计: 张明

审核: 李强

日期: 2023.11.15

